



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
1		Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.	38 días	lun 5/10/20	mié 11/11/20				
2		INICIO	0 días	lun 5/10/20	lun 5/10/20				
3		PRELIMINARES	13 días	lun 5/10/20	sáb 17/10/20				
4		Desmante de puertas completas sencillas	1 día	lun 5/10/20	lun 5/10/20				
5		Desmante de puertas completas doble	1 día	lun 5/10/20	lun 5/10/20				
6		Desmante de Lámparas existentes	3 días	lun 5/10/20	mié 7/10/20				
7		Desmante de estrado y plataforma existentes	2 días	jue 8/10/20	vie 9/10/20				
8		Desmante de aparatos sanitarios existente	1 día	jue 8/10/20	jue 8/10/20				
9		Mantenimientos en puertas sencillas existentes	3 días	vie 9/10/20	dom 11/10/20				
10		Demolición de muros de sheetrock	1 día	jue 8/10/20	jue 8/10/20				
11		Demolición de muros de bloques	2 días	vie 9/10/20	sáb 10/10/20				
12		Retiro de cerámica de pared	2 días	dom 11/10/20	lun 12/10/20				
13		Demolición de pisos existentes en área de baño	2 días	dom 11/10/20	lun 12/10/20				
14		Retiro de zócalos existentes	2 días	mar 13/10/20	mié 14/10/20				
15		Traslado de material a lugar de acopio	3 días	jue 15/10/20	sáb 17/10/20				
16		Bote de material acopiado	3 días	jue 15/10/20	sáb 17/10/20				
17									
18		MUROS	6 días	sáb 17/10/20	jue 22/10/20				
19		Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4 días	sáb 17/10/20	mar 20/10/20				
20		Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	3 días	mar 20/10/20	jue 22/10/20				
21									
22		TERMINACIÓN DE TECHOS	10 días	vie 23/10/20	dom 1/11/20				
23		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8 días	dom 25/10/20	dom 1/11/20				



[Handwritten signature]



35

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
24	↓	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	4 días	vie 23/10/20	lun 26/10/20				
25	↓	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	10 días	lun 2/11/20	mié 11/11/20				
26	↓								
27	↓	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	5 días	lun 2/11/20	vie 6/11/20				
28	↓	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	5 días	sáb 7/11/20	mié 11/11/20				
29	↓	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo	1 día	mié 11/11/20	mié 11/11/20				
30	↓	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1 día	mié 11/11/20	mié 11/11/20				
31	↓	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2 días	mar 10/11/20	mié 11/11/20				
32	↓	INSTALACIONES ELECTRICAS	10 días	mar 27/10/20	jue 5/11/20				
33	↓								
34	↓	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	3 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20				
35	↓	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	3 días	vie 30/10/20	dom 1/11/20				
36	↓	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	1 día	vie 30/10/20	vie 30/10/20				
37	↓	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3 días	sáb 31/10/20	lun 2/11/20				



[Handwritten Signature]



26

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
38	↓	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día	sáb 31/10/20	sáb 31/10/20				
39	↓	Suministro e Instalación Salida de Data	3 días	mar 3/11/20	jue 5/11/20				
40	↓	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 1 " , registros de 6 " x 6 " x 6, abrazaderas emt 1 " , conectores rectos de 1 " coplin de 1 ")	3 días	mar 3/11/20	jue 5/11/20				
41	↓	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	2 días	mar 3/11/20	mié 4/11/20				
42	↓	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1 día	jue 5/11/20	jue 5/11/20				
43	↓	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4 " , 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	6 días	sáb 31/10/20	jue 5/11/20				
44	↓	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	6 días	sáb 31/10/20	jue 5/11/20				
45	↓								
46	↓	TERMINACIONES DE PISO	7 días	mar 13/10/20	lun 19/10/20				
47	↓	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	4 días	mar 13/10/20	vie 16/10/20				
48	↓	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	2 días	jue 15/10/20	vie 16/10/20				
49	↓	Resane en pisos en general	3 días	sáb 17/10/20	lun 19/10/20				
50	↓								
51	↓	PINTURA	5 días	dom 25/10/20	jue 29/10/20				
52	↓	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	2 días	dom 25/10/20	lun 26/10/20				
53	↓	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	3 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20				
54	↓								
55	↓	MISCELANEOS	13 días	vie 30/10/20	mié 11/11/20				
56	↓	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1 día	vie 30/10/20	vie 30/10/20				



[Handwritten signature]



37

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4 oct '20			
						X	V	D	N
57		Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	2 días	sáb 31/10/20	dom 1/11/20				
58		Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4 " x 2 " , HSS 3 " x 3 " , PL 3 " x 3 " x 1/4 " , con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2 " x 12 " de longitud. (Ver detalles en planos).	2 días	lun 2/11/20	mar 3/11/20				
59		Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	2 días	mié 4/11/20	jue 5/11/20				
60		Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1 día	vie 6/11/20	vie 6/11/20				
61		Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1 día	sáb 7/11/20	sáb 7/11/20				
62		Limpieza Continua y Final	5 días	sáb 7/11/20	mié 11/11/20				
63		FIN	0 días	mié 11/11/20	mié 11/11/20				




[Handwritten signature in blue ink]



38

Grupo Ingeniarq

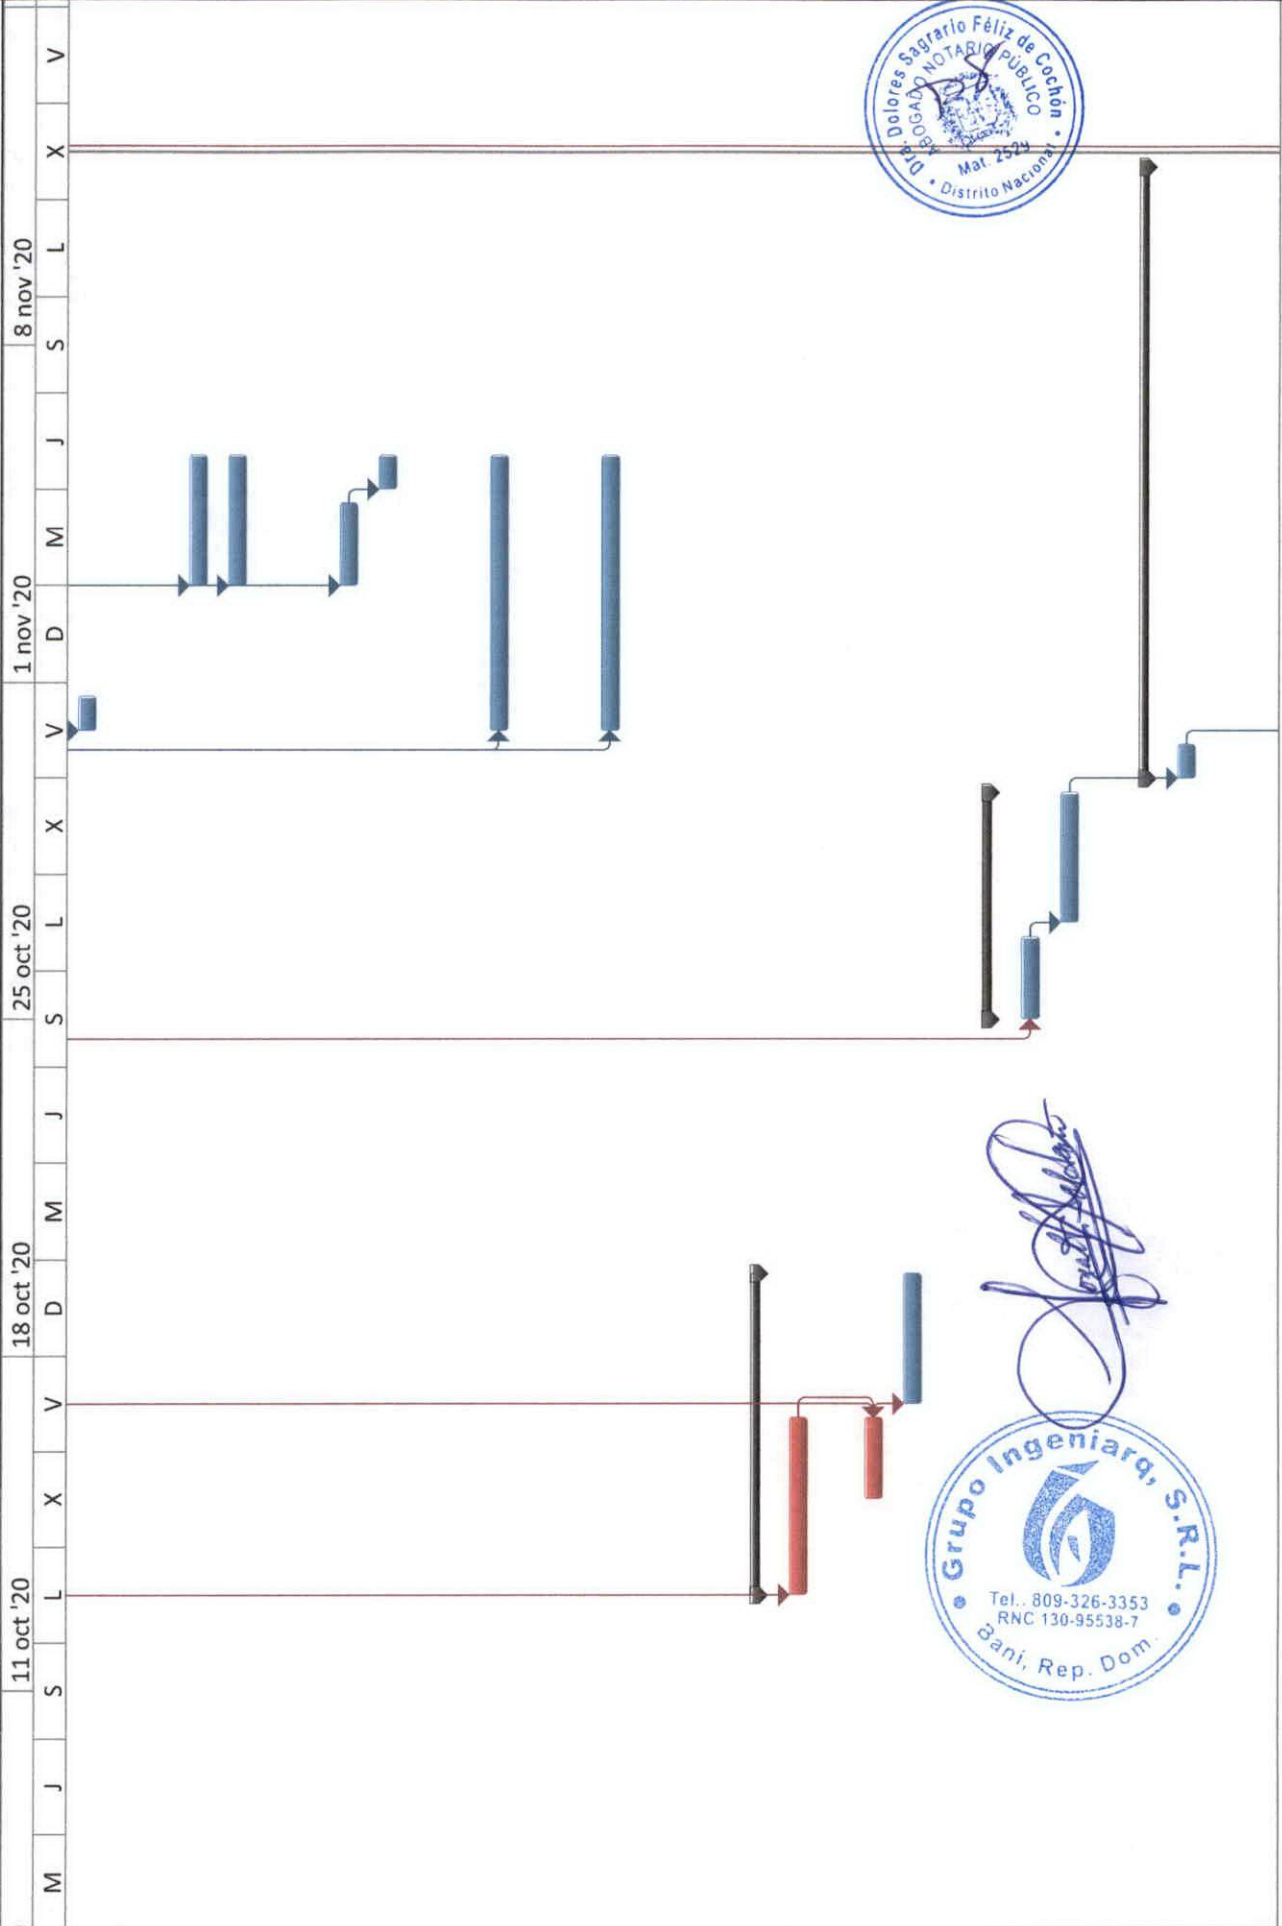

Grupo Ingeniarq



Proyecto: INAPA 06-12-18
Fecha: lun 10/8/20

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	



43



CARNET Y CERTIFICACIÓN DEL CODIA DEL INGENIERO A CARGO DEL PROYECTO



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

APELLIDOS: Saldana E. **NOMBRE:** José Altazgracia

PROFESION: **Ingeniero Civil**

EXEQUATUR 388 **DF:** 16/06/2011

CEDULA: 003-0081372-2

COLEGIATURA: 25721

Firma colegiado Firma Presidente

[Handwritten signature]





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a) **JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION ******* portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. **00300813722**, es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la Colegiatura No. **25721**, Exequatur No. **388**, de fecha **25/02/2009** de profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA





EXPERIENCIA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA

SNCC.D.049



No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-004-2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 20 de Agosto del 2020

Nombre del Oferente: **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos años.

Título del proyecto	Monto total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratante y lugar de ejecución del proyecto	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	Referencia y certificación expedida por el órgano contratante
A) Nacionales							
1. Protección con Muros de Gaviones, Línea de Aducción de 24 y 12 pulgada” por Daños Ocasionados por la Tormenta Isaac	RD\$5,740,720.18	1.5 Meses	Enero 2013	100	INAPA, La Gina-Bani.	Grupo Ingeniarq, SRL	No



410

2. Remozamiento de Parques y Construcción de Áreas para Eventos	RD\$895,045.00	2 Meses	Febrero 2013	100	MOPC, Gobernación Provincial-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
3. Construcción de Contenes y Badenes, Reposición de Tuberías y Acometidas	RD\$1,645,227.82	2 Meses	Marzo 2013	100	MOPC, Av. Fabio Herrera-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
4. Construcción de Muros de Gaviones	RD\$5,537,900.00	6 Meses	Abril 2013	100	MOPC, Puentes los Pilonos-Rio Ocoa	Alba Sánchez & Asoc.	No
5. Construcción de Canaletas Encachadas, Aceras, Contenes, Colocación de Alcantarilla y Puentes Peatonales	RD\$4,557,452.12	4 Meses	Junio 2013	100	MOPC, Monteria-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
6. Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	RD\$7,985,033.56	2 Meses	Septiembre 2013	100	MOPC, Villa Fundación-Bani.	Alba Sánchez & Asoc.	No
7. Construcción de la Escuela Básica Hnas. Bucarely. Tres Módulos de 2 Niveles, Aula Inicial, Parques, Área Cívica, Cancha, Aula Inicial, Comedor, Deposito y una Gran Zona de Paisajismo	RD\$98,186,081.96	18 Meses	Enero 2014	100	Ministerio de Educación (MINERD), Las Colinas-Bani	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí



8. Construcción de Muros de Gaviones para la Protección de Tuberías 1200 mm (HD)	RD\$889,115.71	2 Meses	Enero 2014	100	INAPA, Las Barias-Bani.	Consortio-Acciona-Amina	No
9. Construcción Vivienda de 2 Niveles, Familia Mejía	RD\$4,633,733.00	5 Meses	Septiembre 2014	100	Grupo Ingeniarq SRL, Av. Máximo Gómez-Bani	Grupo Ingeniarq SRL	No
10. Colocación de Redes de Distribución de Agua Potable y Piezas Especiales	RD\$4,927,841.84	8 Meses	Diciembre 2014	100	INAPA-BID, Los Bancos, Punta Caña-San Juan	Amina	No
11. Colocación de Tuberías, Línea Conducción 1000 mm, Alcantarillas, Piezas Especiales, Registros, Bloques de Anclaje	RD\$1,792,929.16	4 Meses	Diciembre 2014	100	INAPA, Paya-Bani.	Consortio-Acciona-Amina	No
12. Registros Prefabricados para Válvulas de Aire y Desagüe en Líneas de Aducción y Líneas de Conducción	RD\$24,053,050.78	9 Meses	Agosto 2015	100	Consortio-Acciona-Amina	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
13. Ampliación del Área de Supermercado y Almacén de la Asociación Nueva de Comerciantes	RD\$6,150,000.00	6 Meses	Septiembre 2015	100	Grupo Ingeniarq SRL, Calle Mercedes, Parte Norte-Bani	Grupo Ingeniarq, SRL	No



Detallistas de Baní, Inc.							
14. Colocación de Redes de Distribución y Línea de Impulsión de Agua Potable y Piezas Especiales	RD\$5,258,278.08	14 Meses	Enero 2016	100	AMINA, Manigua – La Sierra, Doña Ana, San Cristóbal	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún No
15. Ampliación y Remozamiento del Parqueo del Palacio de Justicia de Baní, Provincia Peravia	RD\$2,811,786.30	8 Meses	Mayo 2016	100	Consejo del Poder Judicial, Santo Domingo	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
16. Cruces y Registros en LC-BS-2	RD\$15,680,266.58	7 Meses	Mayo 2016	100	INAPA, Paya-Bani	Consortio-Acciona-Amina	Sí
17. Remodelación Cocina y Baños, Res. Sra. Lali, BHD, Baní, Provincia Peravia	RD\$1,514,950.00	4 Meses	Mayo 2018	100	Sra. Teresa	Grupo Ingeniarq, SRL	No
18. Construcción de Contenes en Urbanización, Sector El Fundo, Baní, Provincia Peravia	RD\$741,125.00	3 Meses	Junio 2018	100	Sr. German Báez	Grupo Ingeniarq, SRL	No
19. Remodelación 1er Nivel y Construcción 2do Nivel, Residencia Sra. Jenny Ruíz, Barrio Rafa, Baní, Provincia Peravia	RD\$2,560,000.00	6 Meses	Septiembre 2018	100	Sra. Jenny Elena Ruíz Mejía	Grupo Ingeniarq, SRL	No



20. Sustitución de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento Lotes 4 y 11 (619 Viviendas)	RD\$46,518,955.34	12 Meses	Diciembre 2018	100	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), Provincias San Juan de la Maguana y Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
21. Rehabilitación de los Centros Educativos Aquiles Cabral Billini, Villa Güera y Rafael Antonio Figuereo, Regional Número 3	RD\$29,362,305.92	2 Meses	Diciembre 2018	100	Ministerio de Educación (MINERD), Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
22. Construcción de la Dirección Regional Central, Provincia Peravia (BANI)	RD\$36,683,752.35	12 Meses	Noviembre 2019	40	Ministerio de Agricultura, Baní, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	No
23. Construcción Protección de Tubería Aducción Ø48" H.D. del Ac. Múltiple Peravia en la Zona Pescadería, Construcción de Parque en la Comunidad de Los Roches y Corrección de Averías, Provincia: Peravia	RD\$5,737,608.77	5 Meses	Mayo 2019	98	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún No
24. Terminación Construcción Planta de Mango	RD\$12,635,734.57	2 Meses	Abril 2019	100	Ministerio de Agricultura, Baní, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí



[Handwritten signature]




ABAPROMANGO, Baní							
25. Remodelación Vivienda Familiar	RD\$1,830,000.00	4 Meses	Junio 2019	100	Sra. Novelis Franco, Pueblo Nuevo, Baní, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	No
26. Construcción Nave Industrial donde se alojará la Planta de Procesamiento de Leche UHT	RD\$28,934,657.22	2 Meses	Noviembre 2019	85	Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur, INC (COOPESUR), Carretera Sabana Yegua, Los Negros, Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	No
27. Construcción de Bases para Soporte de Generador Eléctrico en la Subestación de Puerto Plata II, San Pedro y Loma Alta (Santo Cerro)	RD\$227,303.67	1 Mes	Enero 2020	100	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Vega	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no
28. Construcción de Oficina Administrativa CORAAVEGA El Riito, La Vega (Lote 1)	RD\$8.136,812.69	6 Meses	Enero 2020	35	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), La Vega	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no
29. Construcción de Verja Perimetral Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Municipal El	RD\$977,300.68	2 Meses	Febrero 2020	98	Presidencia de la República Dominicana a través de la Secretaría Administrativa de	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no



Carretón, Baní, Provincia Peravia					la Presidencia (Visita Sorpresa)		
30. Sustitución de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento Lote 31 (214 Viviendas)	RD\$13,350,481.36	6 Meses	Aún No Iniciado	0	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), Provincia Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes.


Firma 

Sello





CERTIFICACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRAS



Asociación Banileja de Productores de Mango (ABAPROMANGO)



Certificado de recepción de Obra


Tras unirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los trabajos planificados, se encuentran ejecutados y en buen estado. Los mismos se describen a continuación:
- Terminación de Nave interior y exterior (Violinado, Pañete y Pintura).
- Sistema de agua Potable (incluye Cisterna).
- Sistema de drenaje de agua pluvial (incluye registros filtrantes y destino final).
- Sistema de drenaje sanitario (incluye cámara séptica con sistema de tratamiento).
- Obras de Arte (aceras, contenes, bordillos, rampas y andenes).
- Verja Perimetral (muros de block Violinados y Malla ciclónica con alambre Trinchera).
- Paisajismo
- Trabajos de oficina en Sheetrock y Densglass.

La Asociación Banileja de Productores de Mango (**ABAPROMANGO**), recibe a plena conformidad, los trabajos realizados por la Empresa Grupo Ingeniarq S.R.L. con RNC: 1-30-95538-7, en la **construcción de la Planta de Empaque y Tratamiento Hidrotérmico**.

Ninguna de las partes expresa ningún reparo, ni existen puntos pendientes de corrección.

Para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en la ciudad de Bani, Provincia Peravia, a los diez (10) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecinueve (2019).



Atentamente.

Dr. German Báez Villar

Presidente Interino de ABAPROMANGO



Av. Francisco del Rosario Sánchez, S/Nº, Local de Inespre, Bani, Provincia Peravia, República Dominicana
Tel. : (809) 954 5536, E-mail: abapromango@gmail.com, RNC: 4-30-07555-8



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

Santo Domingo, 13 de diciembre de 2019

CERTIFICACIÓN

Señores
Grupo INGENIARQ, SRL.
Sus manos.

Por medio certificamos que el día 12 de diciembre de 2019 nuestro equipo técnico y de ingeniería recibió satisfactoriamente los trabajos que ustedes han realizado en calidad de contratista para el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dentro del proyecto Progresando Unidos, subcomponente mejora de viviendas, lotes 4 y 11, el cual incluyó intervenciones para la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y pintura de todas las paredes interiores y exteriores, según los detalles del contrato CI-OB-001-2018.

El alcance de los trabajos consistió en la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y la pintura de las paredes interiores y exteriores en seiscientos diecinueve (619) viviendas en comunidades rurales y urbanas de las provincias Azua y San Juan de la Maguana, donde se construyeron un total de veintitrés mil quinientos veinticuatro punto noventa y cinco (23,524.95) metros cuadrados de pisos de hormigón armado pulidos, y se pintaron sesenta y nueve mil trescientos quince punto veintidós (69,315.22) metros cuadrados de paredes interiores y exteriores, con una inversión total de cuarenta y seis millones quinientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos (RD\$46,518,955.34).

En vista de la conclusión de los trabajos, le instruimos a solicitar y entregar en nuestras oficinas la póliza contra vicios ocultos de dichos trabajos. La fecha de inicio de los trabajos fue el **06 de diciembre de 2018** y la recepción final se realizó el **12 de diciembre de 2019**.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (13) días del mes de diciembre del año 2019.


Ing. Héctor López Barranco, PMP®
Director

Dirección Interinstitucional de Infraestructura Social
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales





09 de Mayo del 2019
Bañi, Provincia Peravia



Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD
Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En Sus Manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa **GRUPO INGENIARQ S.R.L.** con Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

- Reparación:
 - Plomería
 - Electricidad
 - Remozamiento de Pintura
- Construcción:
 - Verja Perimetral en Muro de Bloques Violinados en ambas caras, Columna y Viga de Hormigón armado
 - Aceras
 - Plaza Cívica
 - Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Villa Güera localizado en la Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. los mismos se encuentran dentro del alcance del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019. Por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente,


LIC. WILLY DARÍO TEJEDA AMADOR
Director Centro Educativo Villa Güera



09 de Mayo del 2019
Bani, Prov. Peravia.

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD

Av. Máximo Gómez No. 02 Esq. Santiago

Santo Domingo, D. N.

En sus manos.-



Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido señor:

Por medio de la presente certificamos que la empresa **GRUPO INGENIARQ S.R.L.** con registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

Preparación:

- Plomería
- Electricidad
- Remozamiento de pintura

Construcción:

- Verja perimetral en muro de bloques violinados en ambas caras, columnas y viga de hormigón armado.
- Aceras
- Plaza cívica
- Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Prof. Rafael Ant. Figuerero localizado en la Regional 03 Distrito 05 de la Prov. Peravia. Los mismos se encuentran dentro del alcance del contrato No. 12273 d/f 02/11/2019, por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente,



Directora del Centro Educativo





Distrito Educativo 03-04 Bani
 "Dirección de evaluación y control de calidad a la educación"
Escuela Aquiles Cabral Billini
 "Año de la Innovación y la competitividad"



Bani, Provincia Peravia, RD.
25 de Mayo del 2019

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD.
 Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
 En sus Manos.

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN
 Encargando de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L. con Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7, ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

Construcción y Reparación:

- * Plomería: General
- * Cierres: (puertas y ventanas)
- * Electricidad: General
- * Remozamiento de pintura: General

Cambios Pisos parciales (salón Actos, Dirección, Aula Inicial, Espacio de Aprendizaje.

- * Brillados pisos General
- * Verja Perimetral: (Aula Inicial, parqueo y cancha)
- * Alambré Trinchera
- * Aceras
- * Plaza Cívica
- * Cancha: y grada (Intervención general e iluminación)
- * Impermeabilización general.
- * Parqueo H.A. (Profesores)

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Aquiles Cabral Billini localizado en la Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. Los mismos se encuentran dentro del alcance del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019, Por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa. * Parques H.A (profesores)

Atentamente,

Rosa Elizabeth Asunción Pimentel

Directora Centro Educativo





CONSORCIO
ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA,
INGENIEROS ARQUITECTOS



CONTRATO/RFP: OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS DE FECHA 14-08-2015, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO INGENIARQ S.R.L.

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se encuentran ejecutados y en buen estado.
- Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y DESAGÜES EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE CRUCE DE PIZARRETE-BANI, DERIVACIÓN A PIZARRETE, CRUCE DE PIZARRETE A NIZAO Y BANI-GÜERA" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato suscrito entre las partes, número OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015) y sus posteriores Órdenes de Cambio, correspondiente a RFP número 050-RFP-050-REGISTROS PREFABRICADOS FASE I.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete(2017).

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,


David Huertas Lozano
Gerente de Proyecto
RNC: 130 760 743
Paseo de Los Locutores #6,
Edificio Ginza Dominican Center, Local 203,
Ensanche Piantini,
Santo Domingo, D.N.
Tel/Fax 809 549 7410

Oficinas de Obra:
Carretera Sánchez, Kilómetro 6, Dirección Bani – Santo Domingo, Los Mercaditos, Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana.
Tel. +1 (809) 549.7410 Fax. +1 (809) 549.7410


Carmen Perera Martín
Superintendente de Construcción Adjunta

Oficinas en Santo Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6, Edificio Ginza, Dominican Center, Local 203, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N., República Dominicana.





CONSORCIO
ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA,
INGENIEROS ARQUITECTOS



CONTRATO/RFP: OT-2016-0193-INGENIARQ -CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2 DE FECHA 01-05-2016, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO INGENIARQ S.R.L.

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se encuentran ejecutados y en buen estado.
- Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CRUCES DE ACERO EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CON DIÁMETROS DESDE 500MM HASTA 150MM" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato suscrito entre las partes, número OT-2016-0193-INGENIARQ-CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) y sus posteriores Órdenes de Cambio, correspondiente a RFP número FP-012B- CRUCES DE ACERO DE 500 A 150 mm.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete(2017).

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,


David Huertas Lozano **Conсорcio Acciona Agua Amina**
Gerente de Proyecto
RNC: 130 760 748
Paseo de Los Locutores #6,
Edificio Ginza Dominican Center, Local 203,
Ensanche Piantini,
Santo Domingo, D.N.


Carmen Perera Martín
Superintendente de Construcción Adjunta

Oficinas de Obra:
Carretera Sánchez, Kilómetro 6, Santo Domingo, D.N.
Santo Domingo, Los Mercaditos, Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana.
Tel. +1 (809) 549.7410 Fax. +1 (809) 549.7410

Oficinas en Santo Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6, Edificio Ginza, Dominican Center, Local 203, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N, República Dominicana.





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha de Finalización: 06/ Enero /2017

Nombre del Proyecto: Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de Áreas Exteriores

Empresa Contratada: GRUPO INGENIARQ, S.R.L

Monto Contratado: RD\$ 2,811,786.30

Monto Ejecutado: RD\$ 2,810,438.95

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Construcción de parqueo en hormigón, construcción de parqueo en asfalto, señalización de los parqueos, construcción garita de seguridad, construcción de jardinería y aceras.

Localización: Baní, Provincia Peravia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos de Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de Áreas Exteriores, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: La obra fue ejecutada satisfactoriamente.

Hecho firmado en Baní, Provincia Peravia, hoy día 13 del mes de Enero del año dos mil quince (2017).


Contratista



Ing. Inspector


Ing. Supervisor del CPJ





Santo Domingo, República Dominicana, a 1 de Diciembre de 2016.

A quien pueda interesar:

ACCIONA AGUA S.A. certifica que la empresa **GRUPO INGENIARQ S.A.** ha participado como subcontratista en el proyecto de "**Construcción y Puesta en Marcha del Acueducto Múltiple de Peravia**", realizando de forma totalmente satisfactoria los trabajos de obra civil que se le han contratado.

D. L.L.L. 

David Huertas Lozano.

Gerente de Proyecto.





MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad Fiscalizadora del Programa Nacional de Edificaciones Escolares
 "Año de la Atención a la Primera Infancia"



Informe de Cubicacion de cierre				
Nombre de Proyecto	Basica Las Colinas	Fecha de la Visita	26/06/2015	
Ubicación del Proyecto	Prov. Peravia	No. Sorteo	3ER.	
Nombre del Contratista	Grupo Ingeniarq / Ing. Jose Saldaña.	Institucion Supervisora	MOPC	
Fiscalizadores	Ing. Henry De Leon	Canaris M. Silvestre	Ing. Julio Cesar Nero	
DATOS DE EDIFICACIONES				
Descripción	Observaciones	Terminación		
Módulos de Aulas Estándar		BUENA		
Modulo de Aulas Inicial		BUENA		
Comedor / Cocina		BUENA		
Área Deportiva		BUENA		
Área Exterior		BUENA		
Área Cívica		BUENA		
Asta Bandera (Base y Tope)		BUENA		
Tarja en Bronce		BUENA		
Cisterna / Caseta de Bomba		BUENA		
Finaco		BUENA		
Llaves de Jardín		BUENA		
Trampa de Grasa		BUENA		
Registros (C.I.)		BUENA		
Carpeta asfáltica 3 mm en techos		BUENA		
Cámara Séptica		BUENA		
Verja Perimetral		BUENA		
DATOS ESPECIFICOS				
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B1			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B2			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B3			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULA INICIAL			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Ciosels y Tramarías Internos	✓			
Pisos y Zócalos	✓			

RECIBIDO POR: Dolores Sagrario Féliz de Cochón
 FECHA: 5/ agosto 2016
 HORA: 2: 36 pm

Grupo Ingeniarq, S.R.L.
 Tel. 809-326-3353
 RNC 300-95538-7
 Ban. Rep. Dom.





DESCRIPCION	COMEDOR / COCINA			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento Meseta	✓			
Pisos y Zócalos	✓			


DESCRIPCION	BAÑOS			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en Cabinas	✓			
Ventanas	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Instalación de Lavamanos	✓			
Instalación de Inodoros	✓			
Instalación de Orinales	✓			
Desagüe	✓			
Veredero	✓			

DATOS DESCRIPTIVOS	
Modulo de Aulas	Tres Modulo de dos niveles. Modulo B1. Primer nivel: Area administrativa + Baño de Disc. + Salon de Profesores + Salon Multiuso + baño + escalera. Segundo nivel: 4 aulas + baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de escalera. Modulo B2. Primer Nivel: Tres aulas + Biblioteca + baño + escalera. Segundo Nivel: 4 aulas + baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de escalera. Bloque B3. Primer Nivel: 4 aula + Baño + escalera. Segundo Nivel: 4 aulas + Baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera.
Comedor	
Área Deportiva	Dos cancha.
Área Exterior	Terminada.
Instalaciones Sanitarias	Terminada.

INSTALACIONES ELECTRICAS			
Luminarias en Espacios	Terminada.	Postes / Lámparas	Terminada.
Terminales y Tomacorrientes	Terminada.	Bomba de Agua	Terminada.
Paneles Distribución	Terminada.	Transformador	Estaba Instalado

[Signature]
 Grupo Ingeniería/ Ing. José Saldaña
 Contratista


[Signature]
 Ing. Rafael Pichardo
 Enc. Fiscalización MINERD

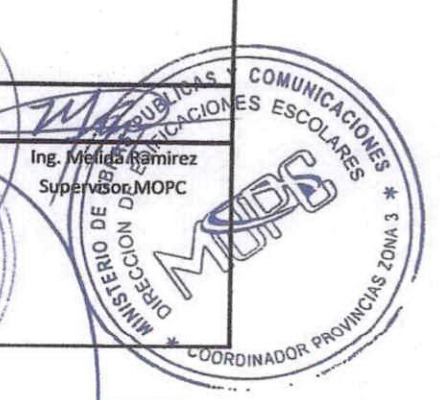
[Signature]
 Ing. Melida Ramirez
 Supervisor MOPC


[Signature]




INGENIERO RESIDENTE



CURRÍCULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES



20 de Agosto del 2020

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: Ingeniero Residente

2. Nombre de la firma: Grupo Ingeniarq, S.R.L.

3. Nombre del individuo: Erick Esteban Bernabel Báez

4. Fecha de nacimiento: 16 de Octubre del 1988 **Nacionalidad:** Dominicana

5. Educación:

Ing. Civil : Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Master en Alta Gerencia : Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA: 30321

7. Otras especialidades:

Diplomado en Ingeniería Estructural : Quality Global Business
Diplomado en Dirección y Ejecución de Proyectos : Quality Global Business
Técnico en Finanzas y Mercadeo : Politécnico Máximo Gómez

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: República Dominicana

9. Idiomas: Español Bueno Hablarlo-Leerlo y Escribirlo / Inglés Avanzado Hablarlo-Leerlo y Escribirlo


10. Historia Laboral:

Desde: Septiembre 2019, Hasta: Actual, Empresa: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Cargos desempeñados: Coordinador de Proyectos

Desde: Abril 2018, Hasta: Agosto 2019, Empresa: Oresund Ingenieros & Arquitectos, S.R.L.

Cargos desempeñados: Director de Proyectos



Desde: Octubre 2015, Hasta: Abril 2018, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Engineer Manager

Desde: Mayo 2015, Hasta: Octubre 2015, Empresa: Abi-Karram Morilla, Ingenieros & Arquitectos (AMINA)

Cargo desempeñados: Project Site Engineer

Desde: Marzo 2012, Hasta: Julio 2013, Empresa: Consorcio Acciona - Agua Amina

Cargo desempeñados: Ingeniero de Frente



11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
Ingeniero Residente: Adecuación Area de Recepción de Documentos de Palacio de Justicia de Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional en la que abarca lo siguiente: Trabajos Preliminares, Muros, Terminación de Techos, Puertas y Vidrios Fijos, Instalaciones Eléctricas, Terminaciones de Piso, Pintura y Misceláneos.	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Nave Industrial Ángel Darío Martínez</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: San José de Ocoa</p> <p>Contratante: Ángel Darío Martínez</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial en Hormigón y Estructura Metálica, Verja Perimetral, Instalaciones Sanitarias (Sistema de Agua Potable y Sistema de Agua Residual), Instalaciones Eléctricas y Obras de Artes.</p> <p>Actividades desempeñadas: Encargado de Obra</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 2</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: Santo Domingo Oeste</p> <p>Contratante: Parque Industrial Duarte</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial, Aprox. 1,000.00 m2.</p> <p>Actividades desempeñadas: Director de Proyecto</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 3</p> <p>Año: 2018</p>



Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial
Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 1

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Oficinas en
Estructura Ligera, 80.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Oficinas PNII-NAVE 2

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Oficinas en
Estructura Ligera, 250.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción y Remodelación Casa
Familiar de Dos Niveles (RALMA)

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Construcción y Remodelación
de Vivienda, Aprox. 250.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto





Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 4

Año: 2019

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte

Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial, Aprox. 1,000.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: La Nueva Barquita

Año: 2019

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: Abi-Karram Morilla Ingenieros y Arquitectos

Principales características del proyecto: Construcción de Aceras, Contenes, Calles en Hormigón Hidráulico, Muros Perimetrales.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación de Apartamento en Piantini

Año: 2019

Lugar: Distrito Nacional

Contratante: Persona Física

Principales características del proyecto: Instalación de Techos, Fascias y Muros en Sheetrock, Apto. de 150.00 m2.

Actividades desempeñadas: Director de Proyecto

Nombre de la tarea o proyecto: PNII-NAVE 4

Año: 2020

Lugar: Santo Domingo Oeste

Contratante: Parque Industrial Duarte



	<p>Principales características del proyecto: Construcción de Nave Industrial Aprox. 2,500.00 m2.</p> <p>Actividades desempeñadas: Director de Proyecto</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Tienda Mango Acrópolis</p> <p>Año: 2020</p> <p>Lugar: Distrito Nacional</p> <p>Contratante: Brownsville Business Corporation</p> <p>Principales características del proyecto: Instalación de Techos, Fascias y Muros en Sheetrock, Tienda en Acrópolis.</p> <p>Actividades desempeñadas: Director de Proyecto</p>
--	--



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Erick Bernabel Fecha: 20/08/2020

Nombre completo del representante autorizado:

José A. T. Salazar Enc.





CARNET DEL CODIA





CERTIFICACIÓN DEL CODIA



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ERICK ESTEBAN BERNABEL BAEZ ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00301095154 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 29265, Exequatur No. 311 , de fecha 25/02/2013
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 11 días
del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA





TÍTULO UNIVERSITARIO



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 25 de octubre de 1538

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Erick Esteban Bernabel Báez

ha cursado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Ingeniero Civil



Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día 25 de febrero de 2019

Mateo Aquino Febrillet
Rector



José Joaquín
Ing. José Joaquín Rojas Acevedo
Decano de la Facultad



Lucía Socorro Mercedes
Secretaria General de la Universidad

Registrado bajo el nº 1998-24
Folio 3751 del libro de grados y títulos



TÍTULO DE MAESTRÍA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes, en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas, otorga a:

Erick Esteban Bernabel Báez

EL DIPLOMA DE:

Magister en Alta Gerencia

En reconocimiento a los méritos alcanzados durante el transcurso de los estudios realizados en esta institución y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Reglamentos institucionales.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

hoy día 27 de septiembre de 2018


DIRECTORA DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 31.863
LIBRO No. 9 FOLIO No. 230




RECTOR

