




DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X		V	
1		Presupuesto Área de Recepción de Documentos - Palacio de Justicia de la Romana	34 días	lun 2/11/20	dom 6/12/20				
2		INICIO	0 días	lun 2/11/20	lun 2/11/20				
3		PRIMER NIVEL	34 días	lun 2/11/20	dom 6/12/20				
4		PRELIMINARES	7 días	lun 2/11/20	dom 8/11/20				
5		Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1 día	lun 2/11/20	lun 2/11/20				
6		Desmonte de puerta doble	1 día	lun 2/11/20	lun 2/11/20				
7		Desmonte de puerta sencilla	1 día	lun 2/11/20	lun 2/11/20				
8		Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	2 días	vie 6/11/20	sáb 7/11/20				
9		Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	1 día	dom 8/11/20	dom 8/11/20				
10		Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1 día	dom 8/11/20	dom 8/11/20				
11		Desmonte de Plafones existentes	2 días	mié 4/11/20	jue 5/11/20				
12		Desmonte de Lámparas existentes	2 días	lun 2/11/20	mar 3/11/20				
13									
14		MUROS	10 días	vie 6/11/20	lun 16/11/20				
15		Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	7 días	mar 10/11/20	lun 16/11/20				
16		Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	3 días	vie 6/11/20	dom 8/11/20				
17									
18		TERMINACIÓN DE TECHOS	6 días	mar 17/11/20	dom 22/11/20				
19		Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	3 días	mar 17/11/20	jue 19/11/20				
20		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3 días	vie 20/11/20	dom 22/11/20				
21									
22		PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	5 días	mié 2/12/20	dom 6/12/20				
23		Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	4 días	mié 2/12/20	sáb 5/12/20				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Grupo Ingeniarq



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X		V	
						X	V		
24		Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y	4 días	mié 2/12/20	sáb 5/12/20				
25		Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1 día	dom 6/12/20	dom 6/12/20				
26		Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	1 día	dom 6/12/20	dom 6/12/20				
27									
28		EQUIPOS MECÁNICOS	5 días	mié 2/12/20	dom 6/12/20				
29		Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por	2 días	mié 2/12/20	jue 3/12/20				
30		Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por	2 días	vie 4/12/20	sáb 5/12/20				
31		Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1 día	dom 6/12/20	dom 6/12/20				
32									
33		INSTALACIONES ELECTRICAS	10 días	dom 15/11/20	mar 24/11/20				
34		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24 ", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL..	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20				
35		Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4 ", 4500K, 18W	4 días	vie 20/11/20	lun 23/11/20				
36		Suministro e Instalación de Salidas cenitales	2 días	lun 16/11/20	mar 17/11/20				
37		Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1 día	dom 15/11/20	dom 15/11/20				
38		Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día	mié 18/11/20	mié 18/11/20				
39		Suministro e Instalación Salida de Data	1 día	lun 16/11/20	lun 16/11/20				
40		Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	1 día	vie 20/11/20	vie 20/11/20				

36

Grupo Ingeniarq



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X		V	
41	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e instalacion de acometida de data(Tuberia de EMT 2 " , registros de 10 " x 10 " x 6, abrazaderas emt 2 " , conectores rectos de 2 " y doble tuberia en bx de 1 ")	2 días	dom 15/11/20	lun 16/11/20				
42	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 1 dfa 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1 dfa	jue 19/11/20	jue 19/11/20				
43	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberias en EMT 3/4 " , 220V, (Incluye alambres 3 lineas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1 día	jue 19/11/20	jue 19/11/20				
44	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tuebria de EMT De Ø1 " (Incluye 2 lineas AWG # 6 THWN , 1 linea AWG # 8 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN	10 días	dom 15/11/20	mar 24/11/20				
45	<input checked="" type="checkbox"/>								
46	<input checked="" type="checkbox"/>	TERMINACIONES DE PISO	10 días	vie 27/11/20	dom 6/12/20				
47	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puer2 días	2 días	vie 27/11/20	sáb 28/11/20				
48	<input checked="" type="checkbox"/>	Pulido y Brillado de Piso existente	2 días	sáb 5/12/20	dom 6/12/20				
49	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	1 día	sáb 28/11/20	sáb 28/11/20				
50	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1 día	dom 29/11/20	dom 29/11/20				
51	<input checked="" type="checkbox"/>								
52	<input checked="" type="checkbox"/>	PINTURA	10 días	mié 25/11/20	vie 4/12/20				
53	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo	2 días	mié 25/11/20	jue 26/11/20				
54	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro y aplicación de satinada en muros	5 días	vie 27/11/20	mar 1/12/20				
55	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro y pintura de muros area de archivos	3 días	mié 2/12/20	vie 4/12/20				
56	<input checked="" type="checkbox"/>								
57	<input checked="" type="checkbox"/>	MISCELANEOS	5 días	mié 2/12/20	dom 6/12/20				
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1 día	mié 2/12/20	mié 2/12/20				
59	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	1 día	mié 2/12/20	mié 2/12/20				
60	<input checked="" type="checkbox"/>	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1 día	jue 3/12/20	jue 3/12/20				

Grupo Ingeniarq



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X		V	
61	☑	Suministro y aplicación de cinta vinílica adhesiva de circulación no freofractaria color amarillo de acceso a recepción de documentos	1 día	jue 3/12/20	jue 3/12/20				
62	☑	Suministro e instalación de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	1 día	vie 4/12/20	vie 4/12/20				
63	☑	Traslado y Botes de Escombros	2 días	sáb 5/12/20	dom 6/12/20				
64	☑	Limpieza Continua y Final	3 días	vie 4/12/20	dom 6/12/20				
65	☑								
66	☑	SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)	34 días	lun 2/11/20	dom 6/12/20				
67	☑	PRELIMINARES	3 días	lun 2/11/20	mié 4/11/20				
68	☑	Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)	1 día	lun 2/11/20	lun 2/11/20				
69	☑	Desmonte de Lámparas existentes	1 día	mié 4/11/20	mié 4/11/20				
70	☑								
71	☑	MUROS	2 días	mar 17/11/20	mié 18/11/20				
72	☑	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2 días	mar 17/11/20	mié 18/11/20				
73	☑								
74	☑	TERMINACIÓN DE TECHOS	2 días	mié 18/11/20	vie 20/11/20				
75	☑	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2 días	mié 18/11/20	vie 20/11/20				
76	☑								
77	☑	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	1 día	lun 30/11/20	lun 30/11/20				
78	☑	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1 día	lun 30/11/20	lun 30/11/20				
79	☑								
80	☑	EQUIPOS MECÁNICOS	1 día	dom 29/11/20	dom 29/11/20				
81	☑	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por	1 día	dom 29/11/20	dom 29/11/20				
82	☑								
83	☑	INSTALACIONES ELECTRICAS	5 días	jue 19/11/20	lun 23/11/20				

Grupo Ingeniarq

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X			V			
84	☒	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24 ", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20							
85	☒	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	1 día	dom 22/11/20	dom 22/11/20							
86	☒	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1 día	sáb 21/11/20	sáb 21/11/20							
87	☒	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día	vie 20/11/20	vie 20/11/20							
88	☒	Suministro e Instalación Salida de Data	1 día	jue 19/11/20	jue 19/11/20							
89	☒											
90	☒	TERMINACIONES DE PISO	8 días	mar 24/11/20	mar 1/12/20							
91	☒	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puer	3 días	mar 24/11/20	jue 26/11/20							
92	☒	Pulido y Brillado de Piso existente	1 día	mar 1/12/20	mar 1/12/20							
93	☒	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente	1 día	jue 26/11/20	jue 26/11/20							
94	☒											
95	☒	PINTURA	2 días	vie 27/11/20	sáb 28/11/20							
96	☒	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	2 días	vie 27/11/20	sáb 28/11/20							
97	☒											
98	☒	MISCELANEOS	3 días	vie 4/12/20	dom 6/12/20							
99	☒	Traslado y Botes de Escombros	2 días	sáb 5/12/20	dom 6/12/20							
100	☒	Limpieza Continua y Final	3 días	vie 4/12/20	dom 6/12/20							



J.S.
[Handwritten Signature]



Grupo Ingeniarq


1 nov '20	8 nov '20	15 nov '20	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20
D	S	D	S	D	S
M	J	M	J	M	J
X	X	M	X	V	S
L	L	D	L	V	L

2/11



J.S.
[Handwritten Signature]


Grupo Ingeniarq

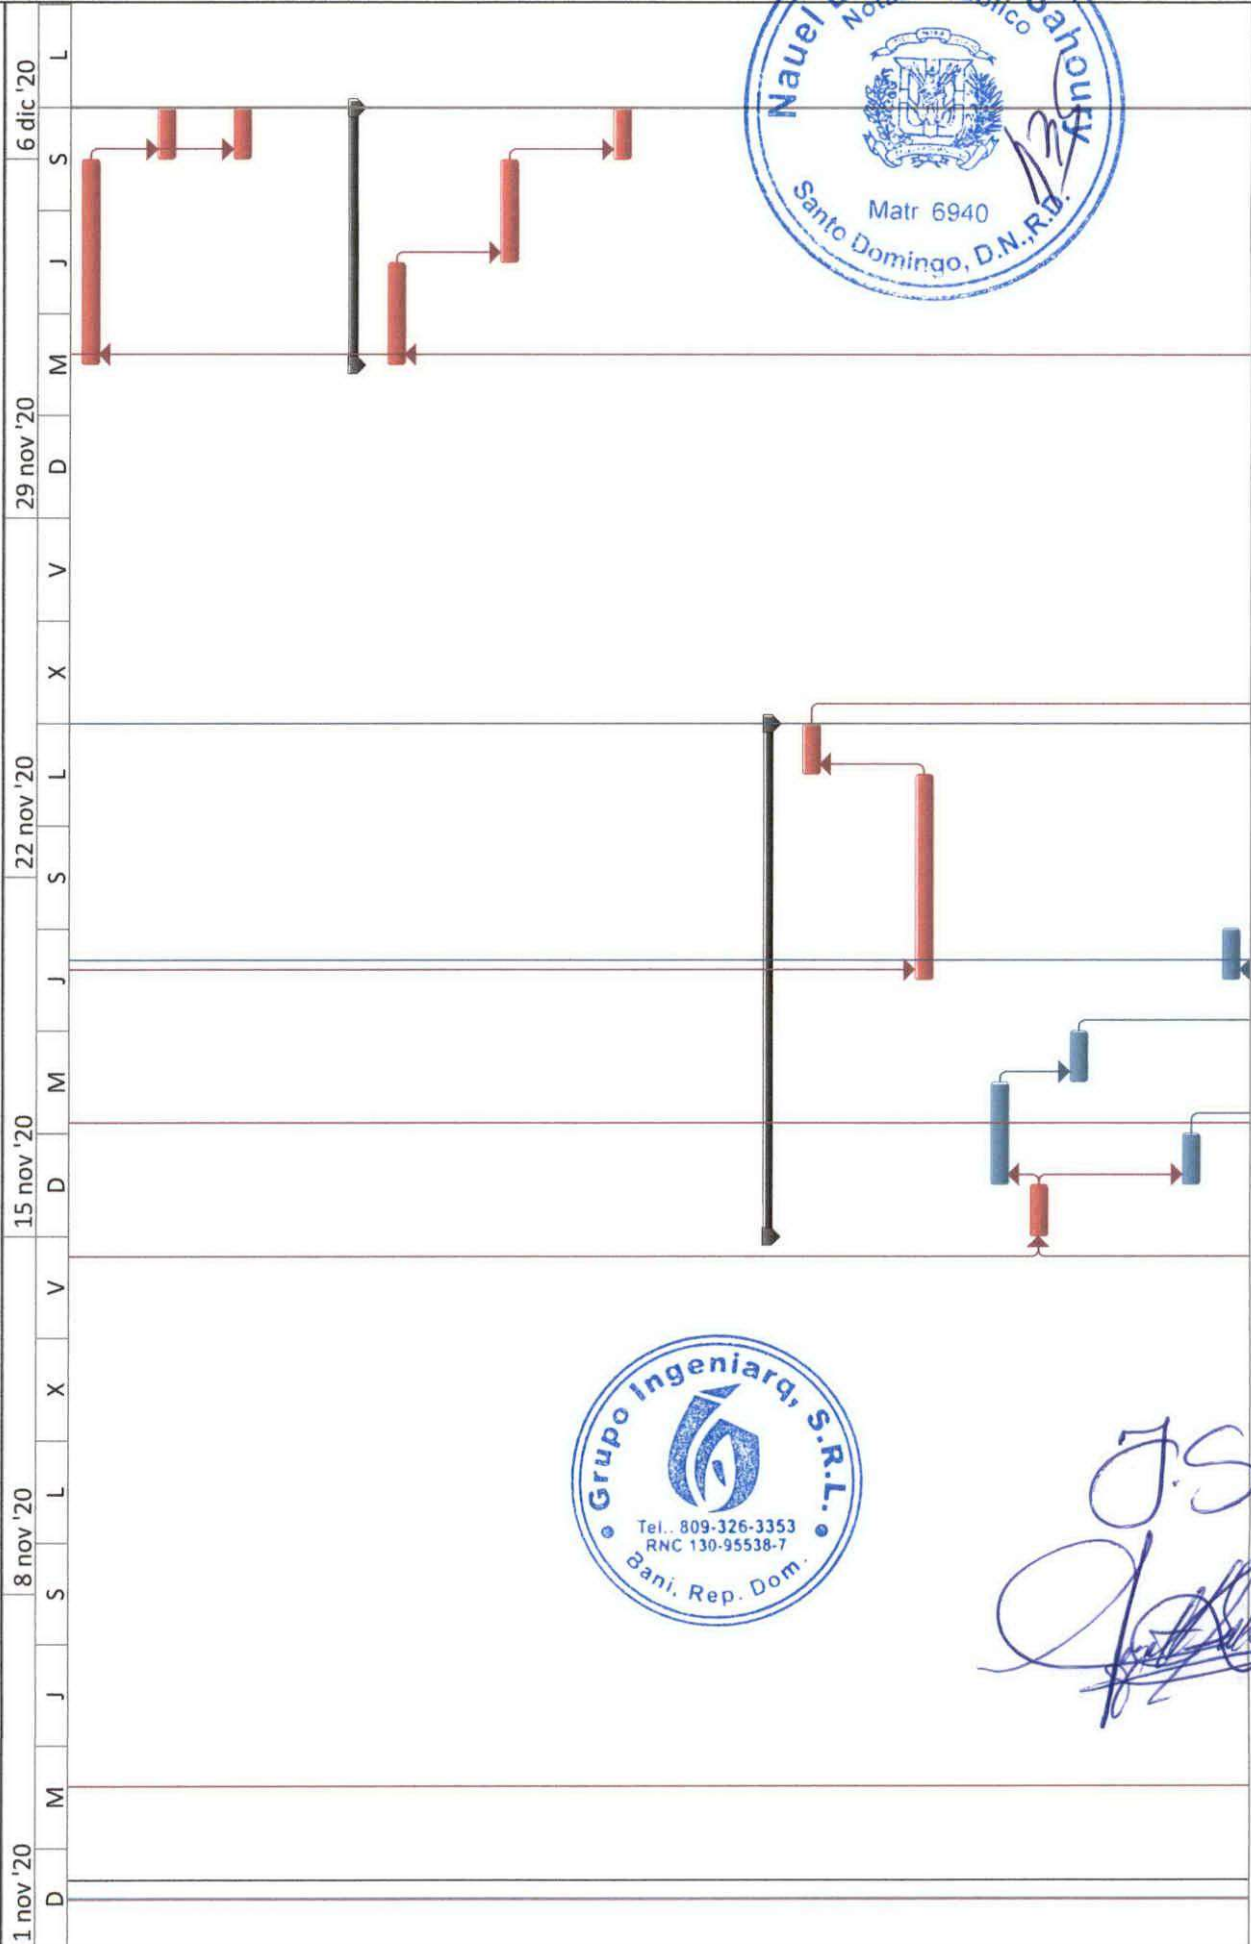

J.S.
[Handwritten signature]




Grupo Ingeniarq

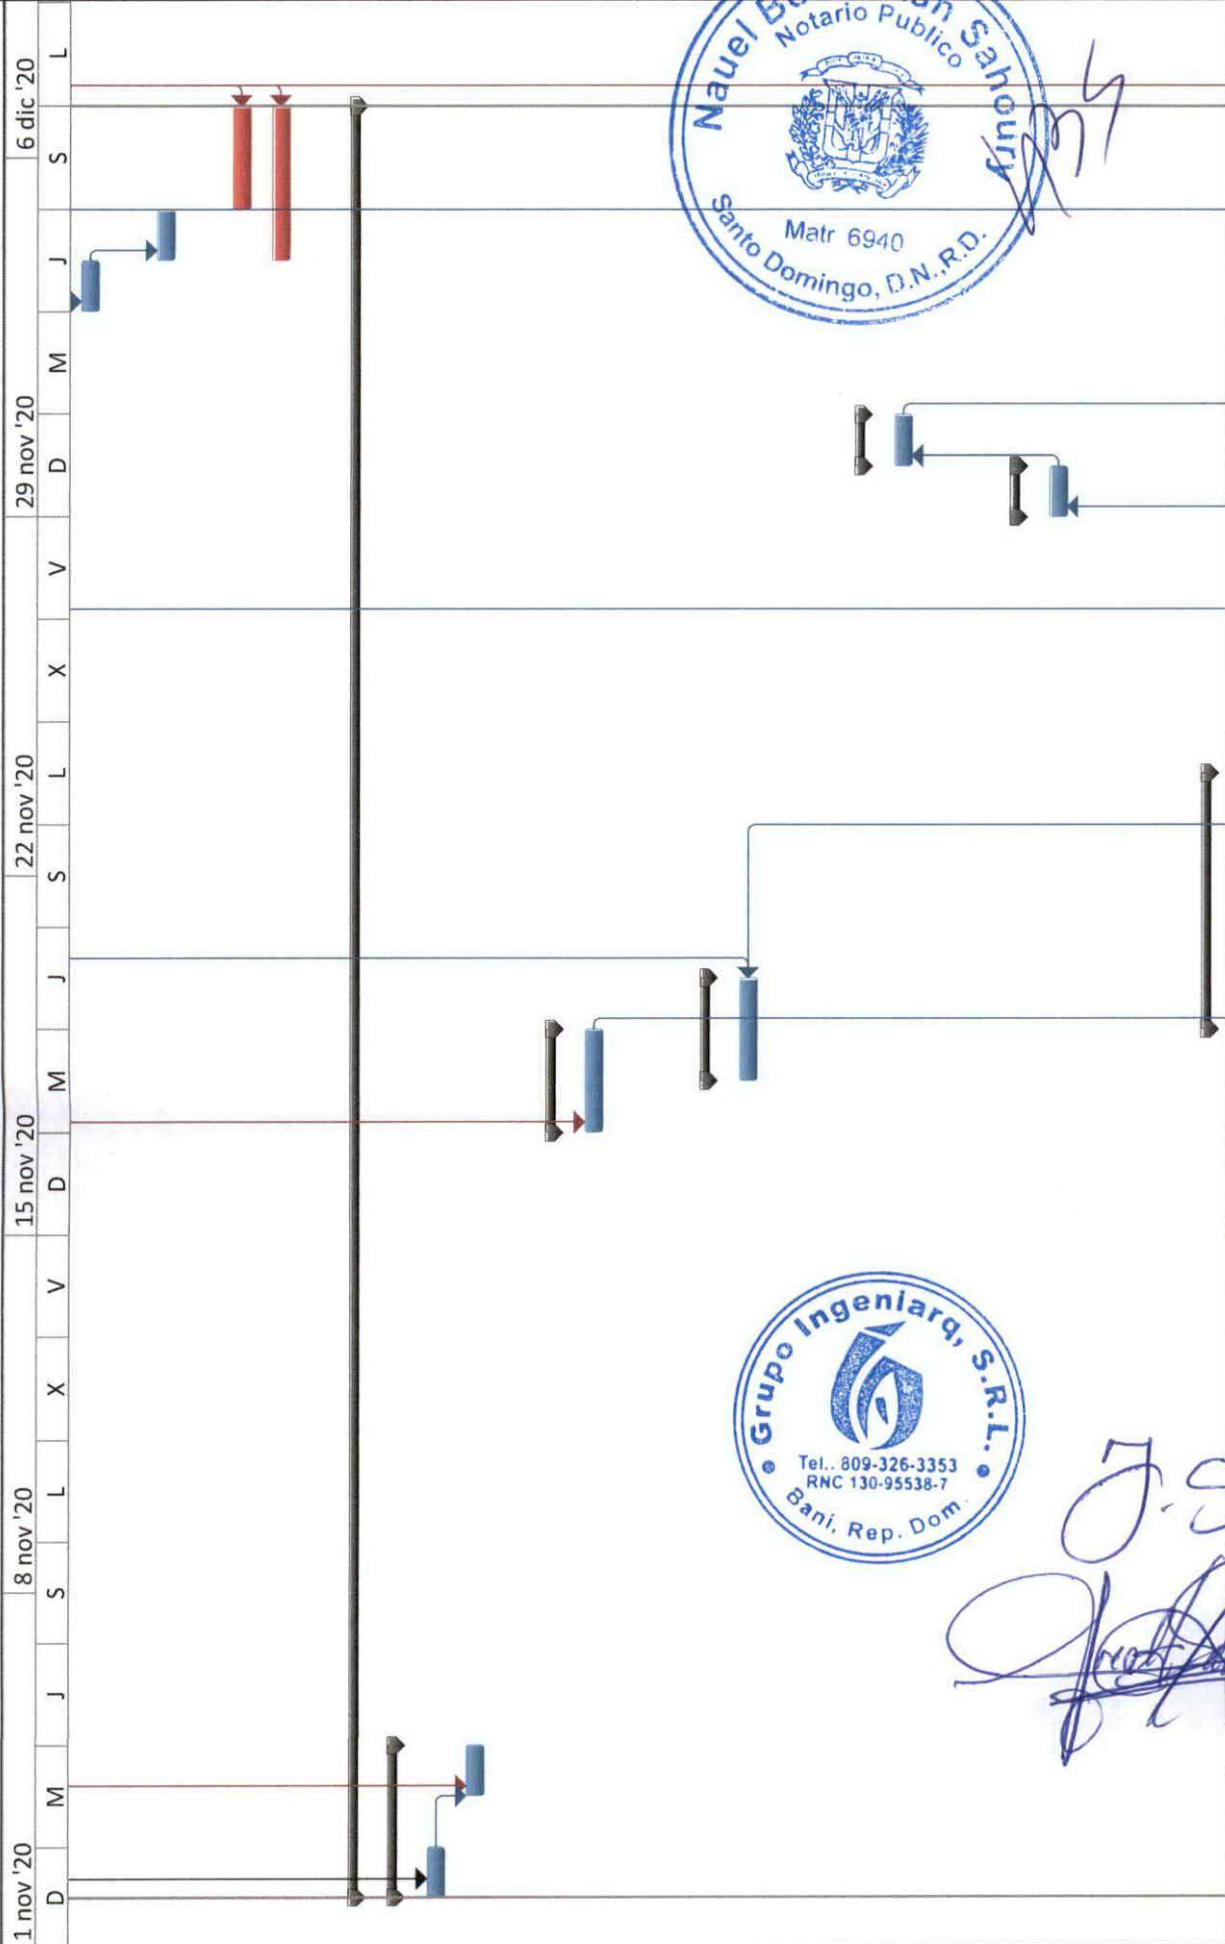

J.S.
[Handwritten Signature]

Grupo Ingeniarq

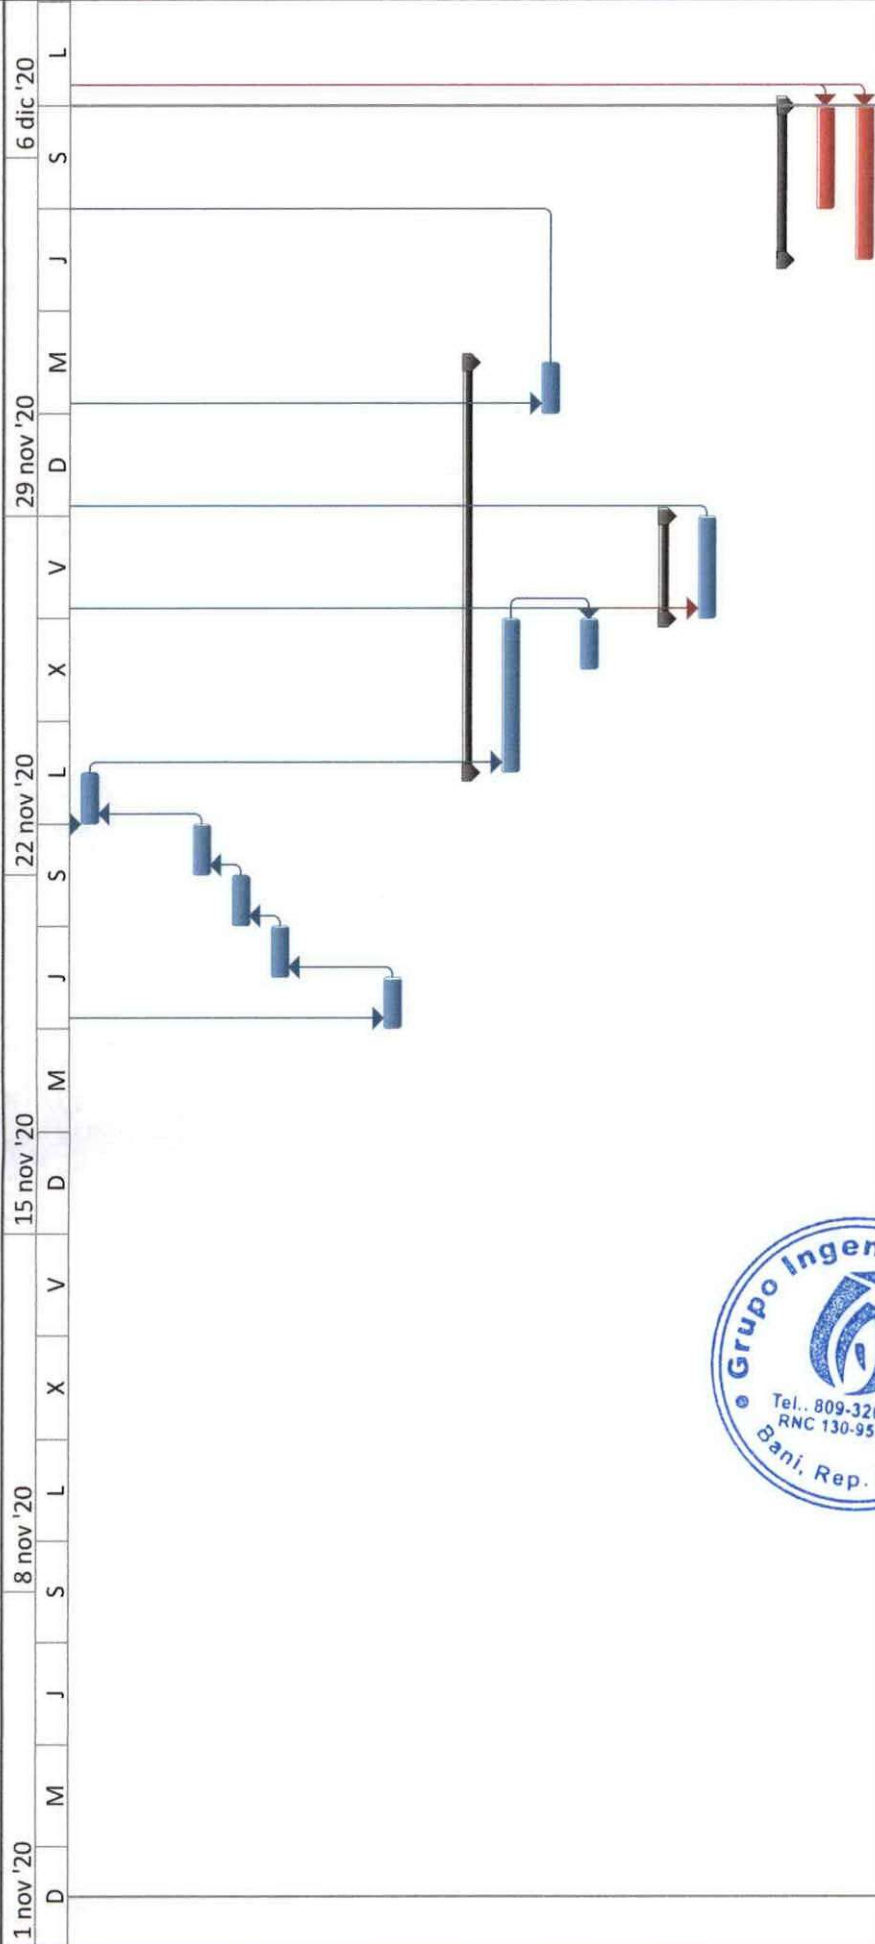

Handwritten signature and initials, including 'JS.'

Grupo Ingeniarq



Proyecto: INAPA 06-12-18
 Fecha: vie 11/9/20

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	



CARNET Y CERTIFICACIÓN DEL CODIA DEL INGENIERO A CARGO DEL PROYECTO



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCDIA)

APELLIDOS: Saldana E. **NOMBRE:** José Altigracia

PROFESION: Ingeniero Civil

EXEQUATUR 388 D/F: 16/06/2011

CEDULA: 003-0081372-2

COLEGIATURA: 25721

Firma colegiado Firma Presidente



JS



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.don
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION ***** portador(a)
de la Cédula de Identidad Electoral No. 00300813722 , es miembro del
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
registrado(a) con la Colegiatura No. 25721, Exequatur No. 388 , de
fecha 25/02/2009 de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 14 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





EXPERIENCIA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 17 de Septiembre del 2020


Nombre del Oferente: **GRUPO INGENIARQ, S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos años.

Título del proyecto	Monto total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratante y lugar de ejecución del proyecto	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	Referencia y certificación expedida por el órgano contratante
A) Nacionales 1. Protección con Muros de Gaviones, Línea de Aducción de 24 y 12 pulgada" por Daños Ocasionados por la Tormenta Isaac	RD\$5,740,720.18	1.5 Meses	Enero 2013	100	INAPA, La Gina-Bani.	Grupo Ingeniarq, SRL	No




2. Remozamiento de Parques y Construcción de Areas para Eventos	RD\$895,045.00	2 Meses	Febrero 2013	100	MOPC, Gobernación Provincial-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
3. Construcción de Contenes y Badenes, Reposición de Tuberías y Acometidas	RD\$1,645,227.82	2 Meses	Marzo 2013	100	MOPC, Av. Fabio Herrera-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
4. Construcción de Muros de Gaviones	RD\$5,537,900.00	6 Meses	Abril 2013	100	MOPC, Puentes los Pilones-Rio Ocoa	Alba Sánchez & Asoc.	No
5. Construcción de Canaletas Encachadas, Aceras, Contenes, Colocación de Alcantarilla y Puentes Peatonales	RD\$4,557,452.12	4 Meses	Junio 2013	100	MOPC, Monteria-Bani	Alba Sánchez & Asoc.	No
6. Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	RD\$7,985,033.56	2 Meses	Septiembre 2013	100	MOPC, Villa Fundación-Bani.	Alba Sánchez & Asoc.	No
7. Construcción de la Escuela Básica Hnas. Bucarely. Tres Módulos de 2 Niveles, Aula Inicial, Parques, Área Cívica, Cancha, Aula Inicial, Comedor, Deposito y una Gran Zona de Paisajismo	RD\$98,186,081.96	18 Meses	Enero 2014	100	Ministerio de Educación (MINERD), Las Colinas-Bani	Grupo Ingeniarq, SRL	Si




[Handwritten signature]

8. Construcción de Muros de Gaviones para la Protección de Tuberías 1200 mm (HD)	RD\$889,115.71	2 Meses	Enero 2014	100	INAPA, Las Barias-Bani.	Consortio-Acciona-Amina	No
9. Construcción Vivienda de 2 Niveles, Familia Mejía	RD\$4,633,733.00	5 Meses	Septiembre 2014	100	Grupo Ingeniarq SRL, Av. Máximo Gómez-Bani	Grupo Ingeniarq SRL	No
10. Colocación de Redes de Distribución de Agua Potable y Piezas Especiales	RD\$4,927,841.84	8 Meses	Diciembre 2014	100	INAPA-BID, Los Bancos, Punta Caña-San Juan	Amina	No
11. Colocación de Tuberías, Línea Conducción 1000 mm, Alcantarillas, Piezas Especiales, Registros, Bloques de Anclaje	RD\$1,792,929.16	4 Meses	Diciembre 2014	100	INAPA, Paya-Bani.	Consortio-Acciona-Amina	No
12. Registros Prefabricados para Válvulas de Aire y Desagüe en Líneas de Aducción y Líneas de Conducción	RD\$24,053,050.78	9 Meses	Agosto 2015	100	Consortio-Acciona-Amina	Grupo Ingeniarq, SRL	Si
13. Ampliación del Área de Supermercado y Almacén de la Asociación Nueva de Comerciantes	RD\$6,150,000.00	6 Meses	Septiembre 2015	100	Grupo Ingeniarq SRL, Calle Mercedes, Parte Norte-Bani	Grupo Ingeniarq, SRL	No



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J.S.' and another signature below it.

20. Sustitución de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento Lotes 4 y 11 (619 Viviendas)	RD\$46,518,955.34	12 Meses	Diciembre 2018	100	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), Provincias San Juan de la Maguana y Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
21. Rehabilitación de los Centros Educativos Aquiles Cabral Billini, Villa Güera y Rafael Antonio Figuerero, Regional Número 3	RD\$29,362,305.92	2 Meses	Diciembre 2018	100	Ministerio de Educación (MINERD), Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí
22. Construcción de la Dirección Regional Central, Provincia Peravia (BANI)	RD\$36,683,752.35	12 Meses	Noviembre 2019	55	Ministerio de Agricultura, Bani, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	No
23. Construcción Protección de Tubería Aducción Ø48" H.D. del Ac. Múltiple Peravia en la Zona Pescadería, Construcción de Parque en la Comunidad de Los Roches y Corrección de Averías, Provincia: Peravia	RD\$5,737,608.77	5 Meses	Mayo 2019	98	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún No
24. Terminación Construcción Planta de Mango	RD\$12,635,734.57	2 Meses	Abril 2019	100	Ministerio de Agricultura, Bani, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	Sí



ABAPROMANGO, Bani												
25. Remodelación Vivienda Familiar	RD\$1,830,000.00	4 Meses	Junio 2019	100	Sra. Novelis Franco, Pueblo Nuevo, Bani, Provincia Peravia	Grupo Ingeniarq, SRL	No					
26. Construcción Nave Industrial donde se alojará la Planta de Procesamiento de Leche UHT	RD\$28,934,657.22	2 Meses	Noviembre 2019	90	Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur, INC (COOPESUR), Carretera Sabana Yegua, Los Negros, Azua	Grupo Ingeniarq, SRL	No					
27. Construcción de Bases para Soporte de Generador Eléctrico en la Subestación de Puerto Plata II, San Pedro y Loma Alta (Santo Cerro)	RD\$227,303.67	1 Mes	Enero 2020	100	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Vega	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no					
28. Construcción de Oficina Administrativa CORAAVEGA El Riito, La Vega (Lote 1)	RD\$8,136,812.69	6 Meses	Enero 2020	10	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), La Vega	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no					
29. Construcción de Verja Perimetral Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Municipal El	RD\$977,300.68	2 Meses	Febrero 2020	100	Presidencia de la República Dominicana a través de la Secretaría Administrativa de	Grupo Ingeniarq, SRL	Aún no					



[Handwritten signature]

Carretón, Bani, Provincia Peravia						la Presidencia (Visita Sorpresa)		
30. Adecuación Área de Recepción de Documentos del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana	RD\$1,810,550.73	6 Semanas	Agosto 2020	30	Consejo del Poder Judicial, Santo Domingo	Grupo Ingeniariq, SRL	Aún no	
31. Adecuación Área de Recepción de Documentos del Palacio de Justicia de Puerto Plata	RD\$1,868,713.52	5 Semanas	Aún No Iniciado	0	Consejo del Poder Judicial, Santo Domingo	Grupo Ingeniariq, SRL	No	
32. Sustitución de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento Lote 31 (214 Viviendas)	RD\$13,350,481.36	6 Meses	Aún No Iniciado	0	Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), Provincia Azua	Grupo Ingeniariq, SRL	No	

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes.


Firma

Sello





CERTIFICACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRAS



Asociación Banileja de Productores de Mango (ABAPROMANGO)

ABAPR_CO-17

Certificado de recepción de Obra



Tras unirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los trabajos planificados, se encuentran ejecutados y en buen estado. Los mismos se describen a continuación:
- Terminación de Nave interior y exterior (Violinado, Pañete y Pintura).
- Sistema de agua Potable (incluye Cisterna).
- Sistema de drenaje de agua pluvial (incluye registros filtrantes y destino final).
- Sistema de drenaje sanitario (incluye cámara séptica con sistema de tratamiento).
- Obras de Arte (aceras, contenes, bordillos, rampas y andenes).
- Verja Perimetral (muros de block Violinados y Malla ciclónica con alambre Trinchera).
- Paisajismo
- Trabajos de oficina en Sheetrock y Densglass.



La Asociación Banileja de Productores de Mango (**ABAPROMANGO**), recibe a plena conformidad, los trabajos realizados por la Empresa Grupo Ingeniarq S.R.L. con RNC: 1-30-95538-7, en la **construcción de la Planta de Empaque y Tratamiento Hidrotérmico**.

Ninguna de las partes expresa ningún reparo, ni existen puntos pendientes de corrección.

Para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en la ciudad de Bani, Provincia Peravia, a los diez (10) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente.


Dr. German Báez Villar

Presidente Interino de ABAPROMANGO



Av. Francisco del Rosario Sánchez, S/Nº, Local de Inespre, Bani, Provincia Peravia, República Dominicana
Tel. : (809) 954 5536, E-mail: abapromango@gmail.com, RNC: 4-30-07555-8



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

Santo Domingo, 13 de diciembre de 2019

CERTIFICACIÓN

Señores
Grupo INGENIARQ, SRL.
Sus manos.

Por medio certificamos que el día 12 de diciembre de 2019 nuestro equipo técnico y de ingeniería recibió satisfactoriamente los trabajos que ustedes han realizado en calidad de contratista para el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dentro del proyecto Progresando Unidos, subcomponente mejora de viviendas, lotes 4 y 11, el cual incluyó intervenciones para la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y pintura de todas las paredes interiores y exteriores, según los detalles del contrato CI-OB-001-2018.


El alcance de los trabajos consistió en la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento y la pintura de las paredes interiores y exteriores en seiscientos diecinueve (619) viviendas en comunidades rurales y urbanas de las provincias Azua y San Juan de la Maguana, donde se construyeron un total de veintitrés mil quinientos veinticuatro punto noventa y cinco (23,524.95) metros cuadrados de pisos de hormigón armado pulidos, y se pintaron sesenta y nueve mil trescientos quince punto veintidós (69,315.22) metros cuadrados de paredes interiores y exteriores, con una inversión total de cuarenta y seis millones quinientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos (RD\$46,518,955.34).


En vista de la conclusión de los trabajos, le instruimos a solicitar y entregar en nuestras oficinas la póliza contra vicios ocultos de dichos trabajos. La fecha de inicio de los trabajos fue el **06 de diciembre de 2018** y la recepción final se realizó el **12 de diciembre de 2019**.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (13) días del mes de diciembre del año 2019.


Ing. Héctor López Barranco, PMP®
Director

Dirección Interinstitucional de Infraestructura Social
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales





09 de Mayo del 2019
Baní, Provincia Peravia

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD
Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.
En Sus Manos.-

Vía: ING. DOMINGO GUZMAN

Encargado de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa **GRUPO INGENIARQ S.R.L.** con Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

- Reparación:
 - Plomería
 - Electricidad
 - Remozamiento de Pintura
- Construcción:
 - Verja Perimetral en Muro de Bloques Violinados en ambas caras, Columna y Viga de Hormigón armado
 - Aceras
 - Plaza Cívica
 - Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Villa Güera localizado en la Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. los mismos se encuentran dentro del alcance del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019. Por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente,


LIC. WILLY DARÍO TEJEDA AMADOR
Director Centro Educativo Villa Güera




09 de Mayo del 2019
Bani, Prov. Peravia.

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD
Av. Máximo Gómez No. 02 Esq. Santiago
Santo Domingo, D. N.
En sus manos.-



Vía: ING. DOMINGO GUZMAN
Encargado de Supervisión

Distinguido señor:

Por medio de la presente certificamos que la empresa **GRUPO INGENIARQ S.R.L.** con registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7 ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

Preparación:

- Plomería
- Electricidad
- Remozamiento de pintura

Construcción:

- Verja perimetral en muro de bloques violinados en ambas caras, columnas y viga de hormigón armado.
- Aceras
- Plaza cívica
- Paisajismo

Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Prof. Rafael Ant. Figuerero localizado en la Regional 03 Distrito 05 de la Prov. Peravia. Los mismos se encuentran dentro del alcance del contrato No. 12273 d/f 02/11/2019, por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa.

Atentamente,





Distrito Educativo 03-04 Bani

“Dirección de evaluación y control de calidad a la educación

Escuela Aquiles Cabral Billini

“Año de la Innovación y la competitividad”



Bani, Provincia Peravia, RD.
25 de Mayo del 2019

Señor:

ING. ADOLFO CEDEÑO DE LA ROSA

Director General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar MINERD.

Av. Máximo Gómez No. 02 esq. Santiago, Santo Domingo, D.N.

En sus Manos.

Vía: **ING. DOMINGO GUZMAN**

Encargando de Supervisión

Distinguido Señor:

Por medio de la presente, Certificamos que la Empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L. con Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-30-95538-7, ha concluido de manera satisfactoria los siguientes trabajos:

Construcción y Reparación:

- * Plomería: General
- * Cierres: (puertas y ventanas)
- * Electricidad: General
- * Remozamiento de pintura: General

Cambios Pisos parciales (salón Actos, Dirección, Aula Inicial, Espacio de Aprendizaje.

- * Brillados pisos General
- * Verja Perimetral: (Aula Inicial, parqueo y cancha)
- * Alambre Trinchera
- * Aceras
- * Plaza Cívica
- * Cancha: y grada (Intervención general e iluminación)
- * Impermeabilización general.
- * Parqueo H.A. (Profesores)



Dichos trabajos fueron realizados en el Centro Educativo Aquiles Cabral Billini localizado en la Regional 03 Distrito 04 de la Provincia Peravia. Los mismos se encuentran dentro del alcance del Contrato No. 12273 d/f 02/11/2019, Por lo que descargamos de toda responsabilidad a dicha empresa. * Parques H.A (profesores)

Atentamente,

Rosa Elizabeth Asunción Pimentel

Directora Centro Educativo





CONSORCIO
ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA,
INGENIEROS ARQUITECTOS



CONTRATO/RFP: OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS DE FECHA 14-08-2015, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO INGENIARQ S.R.L.

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se encuentran ejecutados y en buen estado.
- Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y DESAGÜES EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE CRUCE DE PIZARRETE-BANI, DERIVACIÓN A PIZARRETE, CRUCE DE PIZARRETE A NIZAO Y BANI-GÜERA" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato suscrito entre las partes, número OT-0149.2015-INGENIAQ-050-RFP-050-REGISTROS, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015) y sus posteriores Órdenes de Cambio, correspondiente a RFP número 050-RFP-050-REGISTROS PREFABRICADOS FASE I.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete(2017).

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,


David Huertas Lozano
Gerente de Proyecto

Oficinas de Obra:
Carretera Sánchez, Kilómetro 6, Dirección Bani – Santo Domingo, Los Mercaditos, Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana.
Tel. +1 (809) 549.7410 Fax. +1 (809) 549.7410


Carmen Perera Martín
Superintendente de Construcción Adjunta

Oficinas en Santo Domingo:
Calle Paseo De Los Locutores 6, Edificio Ginza, Dominican Center, Local 203, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.







CONSORCIO
ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA
INGENIEROS ARQUITECTOS



CONTRATO/RFP: OT-2016-0193-INGENIARQ -CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2 DE FECHA 01-05-2016, FIRMADO ENTRE EL CONSORCIO ACCIONA AGUA – ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, Y LA EMPRESA GRUPO INGENIARQ S.R.L.

Certificado de recepción de obra

Tras reunirse las dos partes en el emplazamiento de las obras, y después del reconocimiento de las mismas, se ha comprobado que:

- Los Trabajos que forman parte del alcance del Contrato suscrito entre las Partes se encuentran ejecutados y en buen estado.
- Ningunas de las Partes expresa ningún reparo ni existen puntos pendientes de corrección.

El Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, recibe a plena conformidad los Trabajos de "OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CRUCES DE ACERO EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CON DIÁMETROS DESDE 500MM HASTA 150MM" ejecutados por la empresa GRUPO INGENIARQ S.R.L, según alcance del contrato suscrito entre las partes, número OT-2016-0193-INGENIARQ-CRUCES Y REGISTROS EN LC-BS-2, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) y sus posteriores Órdenes de Cambio, correspondiente a RFP número FP-012B- CRUCES DE ACERO DE 500 A 150 mm.

Y para que conste a los efectos oportunos, expide el presente en Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete(2017).

Por el Consorcio Acciona Agua - Abi-Karram Morilla,

David Huertas Lozano

Gerente de Proyecto
Consorcio Acciona Agua Amina

RNC: 130 760 748

Paseo de Los Locutores #6,

Edificio Ginza Dominican Center, Local 203,

Ensanche Piantini,

Santo Domingo, D.N.

Tel. 809-549-7410

Oficinas de Obra:

Carretera Sánchez, Kilómetro 6, Dirección Benito Santo Domingo, Los Mercaditos, Paya, Provincia de Peravia, República Dominicana.

Tel. +1 (809) 549.7410 Fax. +1 (809) 549.7410

INGENIEROS ARQUITECTOS

Carmen Perera Martín

Superintendente de Construcción Adjunta



Oficinas en Santo Domingo:

Calle Paseo De Los Locutores 6, Edificio Ginza, Dominican Center, Local 203, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N, República Dominicana.



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Ingeniería



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha de Finalización: 06/ Enero /2017

Nombre del Proyecto: Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de Áreas Exteriores

Empresa Contratada: GRUPO INGENIARQ, S.R.L

Monto Contratado: RD\$ 2,811,786.30

Monto Ejecutado: RD\$ 2,810,438.95

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Construcción de parqueo en hormigón, construcción de parqueo en asfalto, señalización de los parqueos, construcción garita de seguridad, construcción de ja: dinería y aceras.

Localización: Baní, Provincia Peravia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos de Construcción y Remodelación de Parqueo y Adecuación de Áreas Exteriores, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: La obra fue ejecutada satisfactoriamente.

Hecho firmado en Baní, Provincia Peravia, hoy día 13 del mes de Enero del año dos mil quince (2017).


Contratista



Ing. Inspector


Ing. Supervisor del CPJ







Santo Domingo, República Dominicana, a 1 de Diciembre de 2016.

A quien pueda interesar:

ACCIONA AGUA S.A. certifica que la empresa **GRUPO INGENIARQ S.A.** ha participado como subcontratista en el proyecto de "**Construcción y Puesta en Marcha del Acueducto Múltiple de Peravia**", realizando de forma totalmente satisfactoria los trabajos de obra civil que se le han contratado.

D. L.L.H. 


David Huertas Lozano.

Gerente de Proyecto.






MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad Fiscalizadora del Programa Nacional de Edificaciones Escolares
 "Año de la Atención a la Primera Infancia"



Informe de Cubicación de cierre				
Nombre de Proyecto	Basica Las Colinas	Fecha de la Visita	26/06/2015	
Ubicación del Proyecto	Prov. Peravia	No. Sorteo	3ER.	
Nombre del Contratista	Grupo Ingeniarq / Ing. Jose Saldaña.	Institucion Supervisora	MOPC	
Fiscalizadores	Ing. Henry De Leon	Canaris M. Silvestre	Ing. Julio Cesar Nero	
DATOS DE EDIFICACIONES				
Descripción	Observaciones	Terminación		
Módulos de Aulas Estándar		BUENA		
Modulo de Aulas Inicial		BUENA		
Comedor / Cocina		BUENA		
Área Deportiva		BUENA		
Área Exterior		BUENA		
Área Cívica		BUENA		
Asia Bandera (Base y Tope)		BUENA		
Tarja en Bronce		BUENA		
Cisterna / Caseta de Bomba		BUENA		
Tinaco		BUENA		
Uaves de Jardín		BUENA		
Trampa de Grasa		BUENA		
Registros (C.I.)		BUENA		
Carpea asfáltica 3 mm en techos		BUENA		
Cámara Séplica		BUENA		
Verja Perimetral		BUENA		
DATOS ESPECIFICOS				
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B1			OBSERVACIONES
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B2			OBSERVACIONES
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULAS B3			OBSERVACIONES
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Plafón en Baños	✓			
Pisos y Zócalos	✓			
DESCRIPCION	MODULO DE AULA INICIAL			OBSERVACIONES
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	
Puertas en General	✓			
Puertas en Cab. De Baños	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Closets y Tramarías Internos	✓			
Pisos y Zócalos	✓			

MINISTERIO DE EDUCACION
 Departamento de Fiscalización de la U.F.-PNEE
 RECIBIDO POR: *Dr. Omar Rodriguez*
 FECHA: *30 de agosto 2016*
 HORA: *01:46pm*





DESCRIPCION	COMEDOR / COCINA			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en General	✓			
Ventanas en General	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento Meseta	✓			
Pisos y Zócalos	✓			

DESCRIPCION	BAÑOS			
	ACEPTADO	REPARAR O CAMBIAR	RECHAZADO	OBSERVACIONES
Puertas en Cabinas	✓			
Ventanas	✓			
Protectores	✓			
Calidad del Pañete	✓			
Calidad de la Pintura	✓			
Revestimiento de Cerámica	✓			
Instalación de Lavamanos	✓			
Instalación de Inodoros	✓			
Instalación de Orinales	✓			
Desagüe	✓			
Vertedero	✓			

DATOS DESCRIPTIVOS	
Modulo de Aulas	Tres Modulo de dos niveles. Modulo B1. Primer nivel: Area administrativa + Baño de Disc. + Salon de Profesores + Salon Multiuso + baño + escalera. Segundo nivel: 4 aulas + baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de escalera, Modulo B2. Primer Nivel: Tres aulas + Biblioteca + baño + escalera. Segundo Nivel: 4 aulas + baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de escalera. Bloque B3. Primer Nivel: 4 aula + Baño + escalera. Segundo Nivel: 4 aulas + Baño + escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera.
Comedor	
Área Deportiva	Dos cancha.
Área Exterior	Terminada.
Instalaciones Sanitarias	Terminada.

INSTALACIONES ELECTRICAS			
Luminarias en Espacios	Terminada.	Postes / Lámparas	Terminada.
Terminales y Tomacorrientes	Terminada.	Bomba de Agua	Terminada.
Paneles Distribución	Terminada.	Transformador	Estaba Instalado

[Signature]
 Grupo Ingeniarq/Ing. Jose Saldaña
 Contratista



[Signature]
 Ing. Rafael Pichardo
 Enc. Fiscalización MINERD



[Signature]
 Ing. Melida Ramirez
 Supervisor MOPC





INGENIERO RESIDENTE



CURRÍCULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 COMITÉ DE COMPRA Y LICITACIONES

17 de Septiembre del 2020

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** Ingeniero Residente
2. **Nombre de la Firma:** Grupo Ingeniarq, S.R.L.
3. **Nombre del Individuo:** Jenni Lucelina Arias Santo
4. **Fecha de Nacimiento:** 04 de Junio del 1974 **Nacionalidad:** Dominicana

5. Educación:

Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos : FUNIBER (Actual)
 Ing. Civil : Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA (19830)

7. Otras especialidades:

Diplomado en Análisis y Diseño Estructural : Morrison y Asociados
 Curso de Fontanería : CODIA
 Curso de Capacitación en la Operación y Mantenimiento
 Operacional y Calidad del Agua : Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
 Curso de AutoCAD : CODIA
 Técnico en Computadora : Instituto De Formación Técnico Profesional "INFOTEP"

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: República Dominicana

9. Idiomas: Español Bueno Hablarlo-Leerlo y Escribirlo. Inglés Regular Hablarlo-Leerlo y Escribirlo


10. Historia Laboral

Desde: 2019 Hasta: Actual Empresa: Inmoberlisa, S.R.L.

Cargos desempeñados: Ingeniera Contratista y Ejecutora

Desde: 2019 Hasta: 2020 Empresa: Ayuntamiento Municipal de Baní

Cargos desempeñados: Ingeniera Contratista y Ejecutora para la Remodelación Parcial del Mercado Municipal



Desde: 2003 Hasta: Actual Empresa: Trabajos Independientes de Análisis de Costos, Presupuestos y Construcción de Edificaciones, Aceras y Contenes en el Ayuntamiento Municipal de Bani, Provincia Peravia

Cargos desempeñados: Ingeniera

Desde: 2013 Hasta: 2018 Empresa: Ministerio de Educación

Cargos desempeñados: Ingeniera Contratista y Ejecutora para la Construcción de una Escuela de Dos Niveles en Los Roches, Pizarrete, Provincia Peravia

Desde: 2006 Hasta: 2018 Empresa: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. (IDDI)

Cargos desempeñados: Ingeniera Supervisora y Encargada de Presupuestos de Obras Civiles

Desde: 2003 Hasta: Actual Empresa: Trabajos Independientes

Cargos desempeñados: Trabajos Independientes de Análisis de Costos, Presupuestos y construcción de Edificaciones, Aceras y Contenes en General

Desde: 2009 Hasta: 2010 Empresa: Junta Municipal de Paya, Bani, Prov. Peravia

Cargos desempeñados: Encargada del Proyecto de Saneamiento para la Construcción de Alcantarilla y Encache de Piedra en la comunidad de Paya con Fondo del Ayuntamiento de Zaragoza, España

Desde: 2004 Hasta: 2006 Empresa: Ayuntamiento Municipal de Bani


Cargos desempeñados: Encargada Técnica del Plan Estratégico con apoyo de PARME, Supervisora de Obra en el Planeamiento Urbano

Desde: 2004 Hasta: 2004 Empresa: M & M Constructora

Cargos desempeñados: Ingeniera Residente

Desde: 2002 Hasta: 2004 Empresa: Constructora Ney González

Cargos desempeñados: Ingeniera Residente de Obras Civiles y Encargada de Presupuestos y Cálculos Estructurales



11. Detalle de las actividades asignadas:

Ingeniero Residente: Adecuación Área de Recepción de Documentos de Palacio de Justicia de La Romana en la que abarca lo siguiente: En el Primer Nivel: Preliminares, Muros, Terminación de Techos, Puertas y Vidrios Fijos, Equipos Mecánicos, Instalaciones Eléctricas, Terminaciones de Piso, Pintura y Misceláneos. En el Segundo Nivel: Preliminares, Muros, Terminación de Techos, Puertas y Vidrios Fijos, Equipos Mecánicos, Instalaciones Eléctricas, Terminaciones de Piso, Pintura y Misceláneos.



12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Escuela Primaria en Los Roches

Año: 2013-2018

Lugar: Pizarrete, Provincia Peravia

Contratante: Ministerio de Educación

Principales características del proyecto: Construcción de 6 Aulas, Construcción de Comedor, Biblioteca, Área Administrativa, Módulo Sanitario, Patio Interior y Verja Perimetral

Actividades desempeñadas: Ingeniera Contratista y Ejecutora

Nombre de la tarea o proyecto: Rehabilitación del Liceo Don Pepe Álvarez

Año: Dic. 2006 – Sept. 2008

Lugar: La Vega

Contratante: BID, Gobierno Dominicano

Principales características del proyecto: Rehabilitación de: 28 Aulas, Salón Multiuso, Cafetería, Módulo de Servicios, Área Deportiva, Áreas Exteriores.

Actividades desempeñadas: Ingeniera Encargada de Cubicación

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Escuela Don Felipe Vicini Perdomo

Año: Ene. 2007 – Dic. 2009

Lugar: Santo Domingo

Contratante: Grupo Vicini

Principales características del proyecto: Construcción de: una Escuela 12 Aulas, Módulo de Educación Inicial, Cocina, Biblioteca, Centro de Informática, Área Administrativa, Enfermería, Cafetería, una Cancha, un Play, Paisajismo, Rampa para Minusválido.

Actividades desempeñadas: Ingeniera Encargada de Cubicación

Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Comunitario Cigar Family





Año: Jun. 2007 - Dic. 2009

Lugar: Baní, Provincia Peravia

Contratante: IDDI (2da Fase)

Principales características del proyecto: Construcción de: una Escuela Básica, Escuela Secundaria, Salón Multiuso, Parque Infantil, Cancha de Dos Graderías Cocina, Comedor, Play de Dos Graderías, 3 Kms. De Redes Eléctricas, Drenaje Pluvial en Alcantarilla de 30" en HS y Subterránea en Tubo de 4 PVC Perforados, Estanques de Peces, Estanques de Camarones, Acueducto Múltiple para las comunidades Jengibre, Caribe, Agricultura, Verja Perimetral, Casa de Huésped.

Actividades desempeñadas: Ingeniera Residente

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Nuevo Cayacoa

Año: Mar. 2008 – Jul. 2010

Lugar: Santo Domingo

Contratante: Grupo Vicini

Principales características del proyecto: Construcción de: una Escuela 12 Aulas, Aula Pre-Escolar, Laboratorio de Informática, Area Administrativa, Módulo Sanitario, Patio Interior, Pasarela, Interconexiones, Centro de Salud, 2 Centros Comerciales, Iglesia, Centro Comunal.

Actividades desempeñadas: Ingeniera Encargada de Cubicación

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Escuelas

Año: Ene. 2006 – Dic. 2006

Lugar: Barahona


Contratante: Fundación CODESPA/AECID

Principales características del proyecto: Construcción de Escuelas en los Bateyes del Ingenio Barahona que comprende: Aulas, Cocina, Biblioteca, Área Administrativa, Enfermería, Cafetería, Cancha, Paisajismo.

Actividades desempeñadas: Ingeniera Residente

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Parcial del Mercado Municipal





<p>Año: 2019 - 2020</p> <p>Lugar: Bani, Provincia Peravia</p> <p>Contratante: Ayuntamiento Municipal de Bani</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción de Techo en Estructura Metálica, Reacondicionamiento de Áreas de Circulación, Parque Central, Baños, Techado y Paisajismo.</p> <p>Actividades desempeñadas: Ingeniera Contratista y Ejecutora</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Escuelas</p> <p>Año: 2019 - 2020</p> <p>Lugar: Bani, Provincia Peravia</p> <p>Contratante: Inmoberlisa, S.R.L.</p> <p>Principales características del proyecto: Construcción de Edificio de Apartamentos Aporticado de 5 Niveles, compuesto de 15 Apartamentos.</p> <p>Actividades desempeñadas: Ingeniera Contratista y Ejecutora</p>

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Jenni Anís Fecha: 17/09/2020

Nombre Completo del Representante Autorizado: José Alt. Saldomá Enc.





CARNET DEL CODIA



**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGDIMENSORES (CCIA)**



APELLIDOS: *Arias Santo* NOMBRE: *Jenni Lucelina*

CARRERA:
Ing. Civil

EXEQUATUR: *681* D/F: *21/06/2004*

CEDULA: *003-0060395-8*

COLEGIATURA: *19830*

Jenni Arias
Firma del Colegiado

Firma Presidente





CERTIFICACIÓN DEL CODIA



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTO ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. **00300603958** , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. **19830**, Exequatur No. **681** , de fecha **25/02/2003**
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 14 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





TÍTULO UNIVERSITARIO



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Jenni Lucelina Arias Santo

*ha cursado en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado
en los exámenes correspondientes.*


Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Ingeniero Civil

*Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, hoy día 25 de febrero de 2003*


Ing. Manuel Exaltado Llerena
Decano de la Facultad


Dr. Porfirio García Fernández
Rector




Lic. Mateo Aquino Pedriel
Secretario General de la Universidad

Registrado bajo el N° 121506
Folio 3378 del libro de grados y títulos

