


ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
1		Remodelacion Palacio de Justicia	34 days	Mon 14/9/20	Thu 29/10/20	
2		Primer nivel	34 days	Mon 14/9/20	Thu 29/10/20	
3		Preliminares	3 days	Mon 14/9/20	Wed 16/9/20	
4		Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)	2 days	Tue 15/9/20	Wed 16/9/20	11
5		Desmonte de puerta doble	1 day	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	
6		Desmonte de puerta sencilla	1 day	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	555
7		Cierre de Huevo puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	1 day	Tue 15/9/20	Tue 15/9/20	11
8		Cierre de huevo en sheetrock en pasillo	1 day	Tue 15/9/20	Tue 15/9/20	11
9		Reduccion de huevo para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1 day	Tue 15/9/20	Tue 15/9/20	11
10		Desmonte de Plafones existentes	1 day	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	555
11		Desmonte de Lámparas existentes	1 day	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	555
12		Muros	6 days	Thu 17/9/20	Thu 24/9/20	3
13		Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	3 days	Thu 17/9/20	Mon 21/9/20	4
14		Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	3 days	Tue 22/9/20	Thu 24/9/20	13
15		Terminacion de techos	4 days	Fri 25/9/20	Wed 30/9/20	12
16		Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	2 days	Tue 29/9/20	Wed 30/9/20	17



Task

- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Manual Progress

Project: Remodelacion Palacio de Justicia
Date: Tue 15/9/20


ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
17	1	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2 days	Fri 25/9/20	Mon 28/9/20	er 2 6
18	1	Puertas y vidrios fijos	8 days	Thu 1/10/20	Mon 12/10/20 15	
19	1	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	2 days	Thu 1/10/20	Fri 2/10/20	
20	1	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	2 days	Mon 5/10/20	Tue 6/10/20 19	
21	1	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2 days	Wed 7/10/20	Thu 8/10/20 20	
22	1	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2 days	Fri 9/10/20	Mon 12/10/20 21	
23	1	Equipos mecanicos	7 days	Thu 1/10/20	Fri 9/10/20 15	
24	1	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	5 days	Thu 1/10/20	Wed 7/10/20	



- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Manual Progress

Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
25		Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	5 days	Thu 1/10/20	Wed 7/10/20	24SS
26		Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, 2 days capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	2 days	Thu 8/10/20	Fri 9/10/20	25
27		Instalaciones Electricas	25 days	Fri 25/9/20	Thu 29/10/20	15SS
28		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL..	2 days	Tue 29/9/20	Wed 30/9/20	16SS
29		Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	28
30		Suministro e Instalación de Salidas cenitales	3 days	Tue 27/10/20	Thu 29/10/20	29;33
31		Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3 days	Fri 25/9/20	Tue 29/9/20	14
32		Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3 days	Wed 30/9/20	Fri 2/10/20	31



Legend for task types:

- Task: Solid blue bar
- Split: Dotted blue bar
- Milestone: Blue diamond
- Summary: Blue bar with brackets
- Project Summary: Light blue bar with brackets
- Inactive Task: Light blue bar
- Inactive Milestone: Light blue bar with brackets
- External Tasks: Light blue bar
- External Milestone: Light blue bar with brackets
- Deadline: Blue bar with diagonal line
- Critical: Blue bar with double brackets
- Critical Split: Blue bar with double brackets and a split
- Progress: Blue bar with a gradient
- Manual Progress: Blue bar with a gradient and a bracket

Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
33	☑	Suministro e Instalación Salida de Data	4 days	Wed 21/10/20	Mon 26/10/20	34
34	☑	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	2 days	Mon 19/10/20	Tue 20/10/20	35
35	☑	Suministro e instalacion de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1")	4 days	Tue 13/10/20	Fri 16/10/20	36
36	☑	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	4 days	Wed 7/10/20	Mon 12/10/20	37
37	☑	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, 4 tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	4 days	Thu 1/10/20	Tue 6/10/20	38
38	☑	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tuberia de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	4 days	Fri 25/9/20	Wed 30/9/20	35SS
39	☑	Terminacion de Pisos	10.25 days	Wed 30/9/20	Wed 14/10/20	
40	☑	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	3 days	Wed 30/9/20	Fri 2/10/20	31
41	☑	Pulido y Brillado de Piso existente	1 day	Tue 13/10/20	Wed 14/10/20	47
42	☑	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	1 day	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	40



Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Critical
Project Summary	Manual Summary	Critical Split
Inactive Task	Start-only	Progress
Inactive Milestone	Finish-only	Manual Progress

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
43		Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	2 days	Tue 6/10/20	Thu 8/10/20	53
44		Pintura	3 days	Thu 8/10/20	Tue 13/10/20	
45		Suministro y aplicación de Pintura acrílica en techo	1 day	Thu 8/10/20	Fri 9/10/20	43
46		Suministro y aplicación de satinada en muros	1 day	Fri 9/10/20	Mon 12/10/20	45
47		Suministro y pintura de muros area de archivos	1 day	Mon 12/10/20	Tue 13/10/20	46
48		Miscelaneos	9.75 days	Tue 6/10/20	Mon 19/10/20	
49		Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1 day	Wed 14/10/20	Thu 15/10/20	
50		Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.5 days	Thu 15/10/20	Fri 16/10/20	50
51		Recepción de Documentos	1 day	Fri 16/10/20	Mon 19/10/20	50
52		Suministro y aplicación de cinta vinílica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1 day	Wed 14/10/20	Thu 15/10/20	49SS
53		Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	0.25 days	Tue 6/10/20	Tue 6/10/20	42
54		Traslado y Botes de Escombros	2 days	Tue 13/10/20	Thu 15/10/20	47
55		Limpieza Continua y Final	1 day	Thu 15/10/20	Fri 16/10/20	54
56		Segundo Nivel	23 days	Mon 14/9/20	Wed 14/10/20	



Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Manual Progress

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
57		Preliminares	3 days	Mon 14/9/20	Wed 16/9/20	3SS
58		Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)	2 days	Tue 15/9/20	Wed 16/9/20	4SS
59		Desmonte de Lámparas existentes	1 day	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	11SS
60		Muros	2 days	Thu 17/9/20	Fri 18/9/20	12SS
61		Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2 days	Thu 17/9/20	Fri 18/9/20	13SS
62		Terminacion en techos	3 days	Mon 28/9/20	Wed 30/9/20	15SS
63		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3 days	Mon 28/9/20	Wed 30/9/20	64, 73
64		Puertas y vidrios fijos	2 days	Thu 1/10/20	Fri 2/10/20	67
65		Suministro e Instalación de Puerta de Caoba (0.90x2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidraulico	2 days	Thu 1/10/20	Fri 2/10/20	68
66		Equipos mecanicos	5 days	Thu 8/10/20	Wed 14/10/20	23SS
67		Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energia, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fabrica, garantia de 5 años, certificado por AHRI y ETL	5 days	Thu 8/10/20	Wed 14/10/20	24
68		Instalaciones Electricas	9 days	Fri 25/9/20	Wed 7/10/20	27SS



- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Manual Progress

- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone

Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
69		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL..	2 days	Thu 1/10/20	Fri 2/10/20	63
70		Suministro e Instalación de Salidas cenitales	1 day	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	69
71		Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1 day	Tue 6/10/20	Tue 6/10/20	69
72		Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 day	Wed 7/10/20	Wed 7/10/20	75;76
73		Suministro e Instalación Salida de Data	1 day	Fri 25/9/20	Fri 25/9/20	75
74		Terminacion de pisos	11.5 days	Mon 14/9/20	Tue 29/9/20	
75		Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	2 days	Mon 14/9/20	Tue 15/9/20	
76		Pulido y Brillado de Piso existente	1 day	Mon 28/9/20	Tue 29/9/20	81
77		Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente	1 day	Wed 16/9/20	Wed 16/9/20	75
78		Pintura	0.5 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	
79		Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	0.5 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	76
80		Miscelaneos	3 days	Mon 28/9/20	Wed 30/9/20	
81		Traslado y Botes de Escombros	0.5 days	Mon 28/9/20	Mon 28/9/20	73
82		Limpieza Continua y Final	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	79





Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Manual Progress

October 2020


November 2020

December 2020

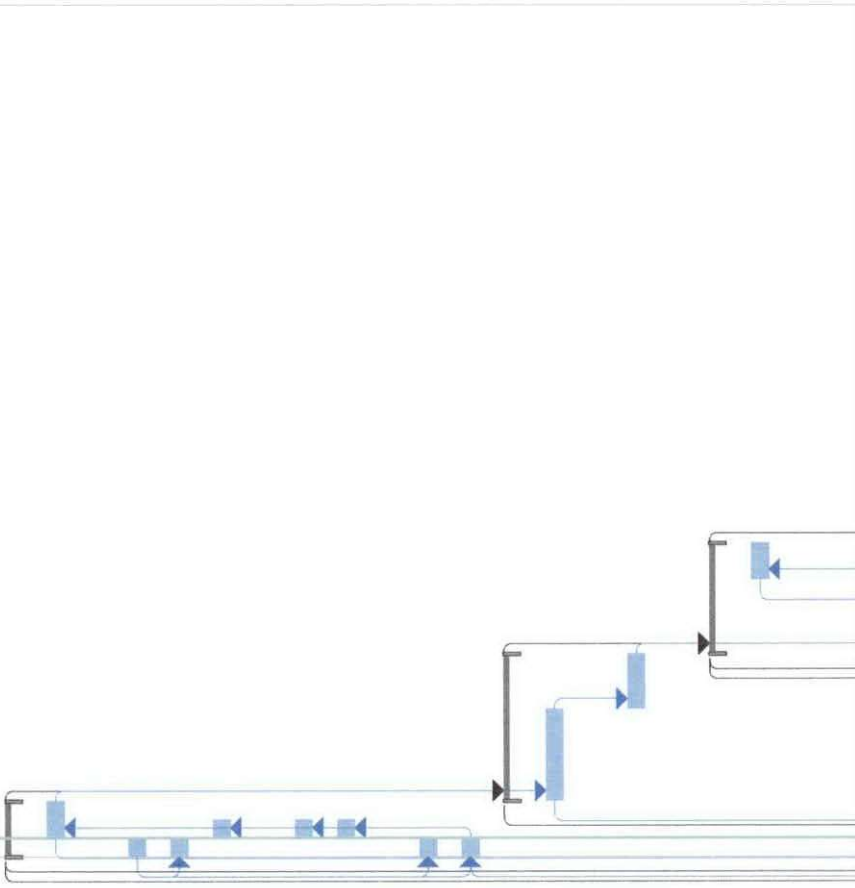


Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Critical
Project Summary	Manual Summary	Critical Split
Inactive Task	Start-only	Progress
Inactive Milestone	Finish-only	Manual Progress

Project: Remodelacion Palacio d
 Date: Tue 15/9/20

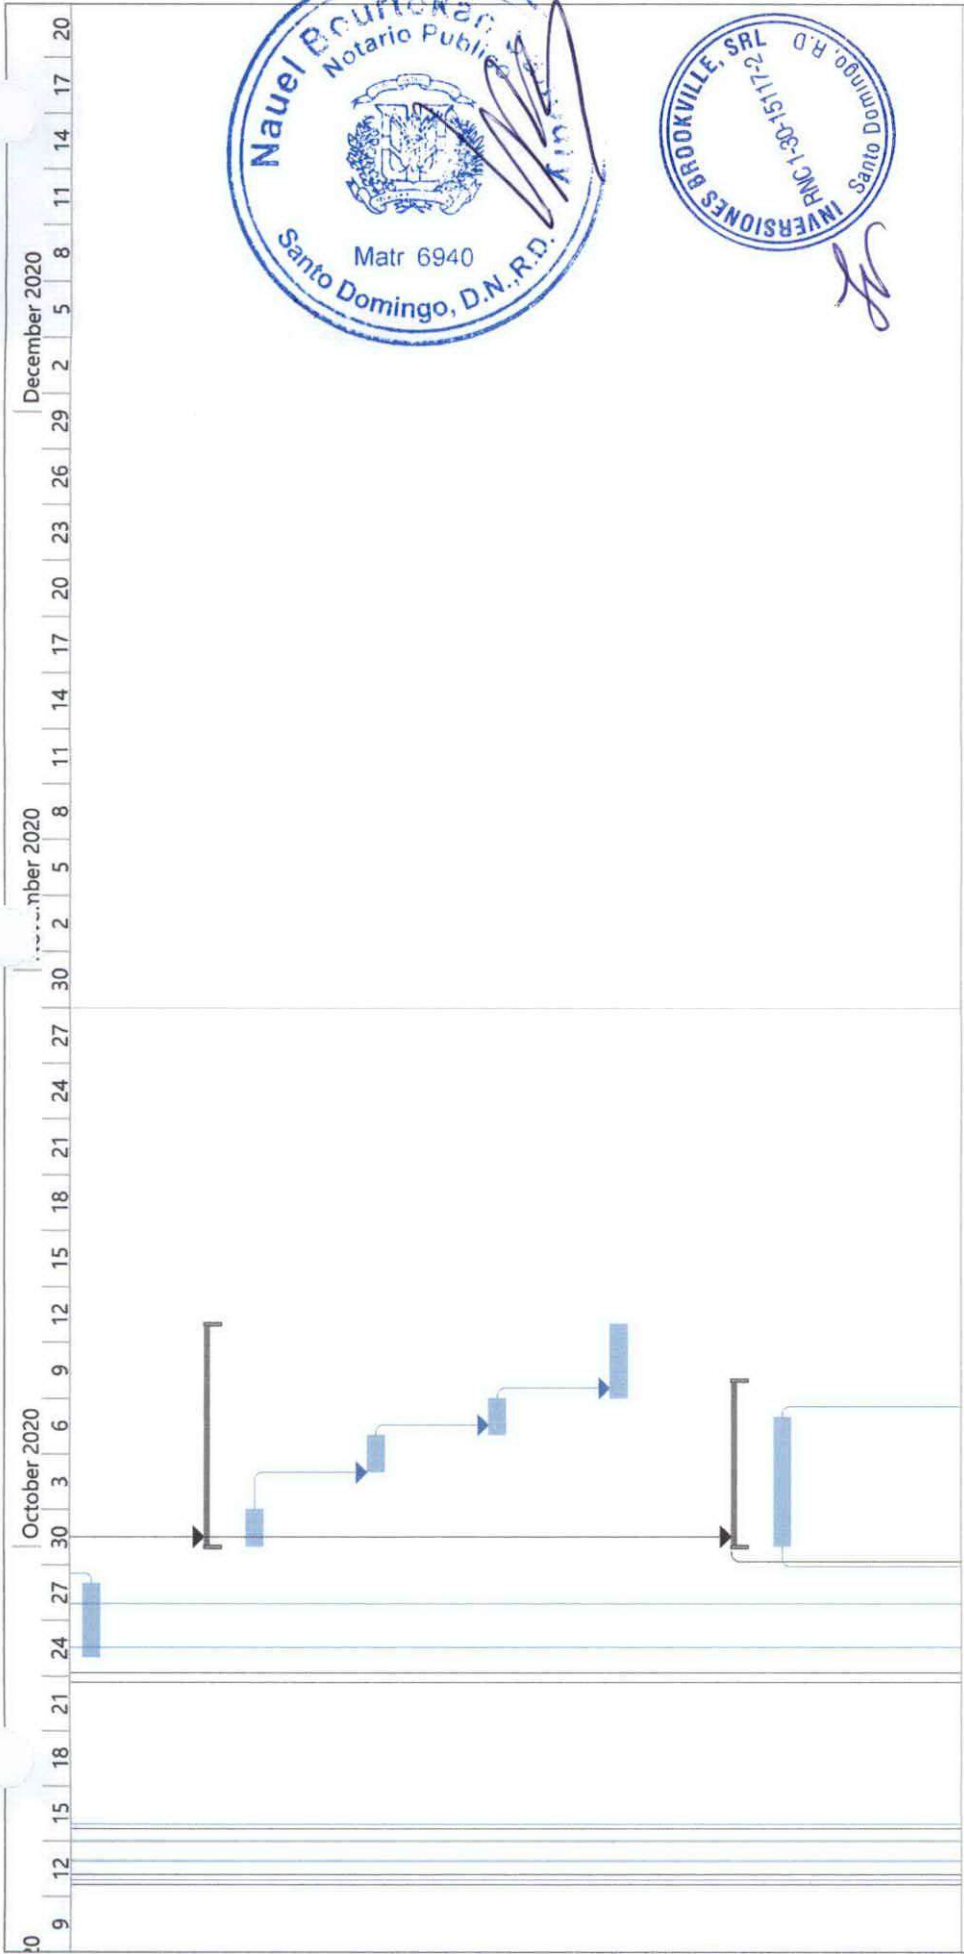

Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20

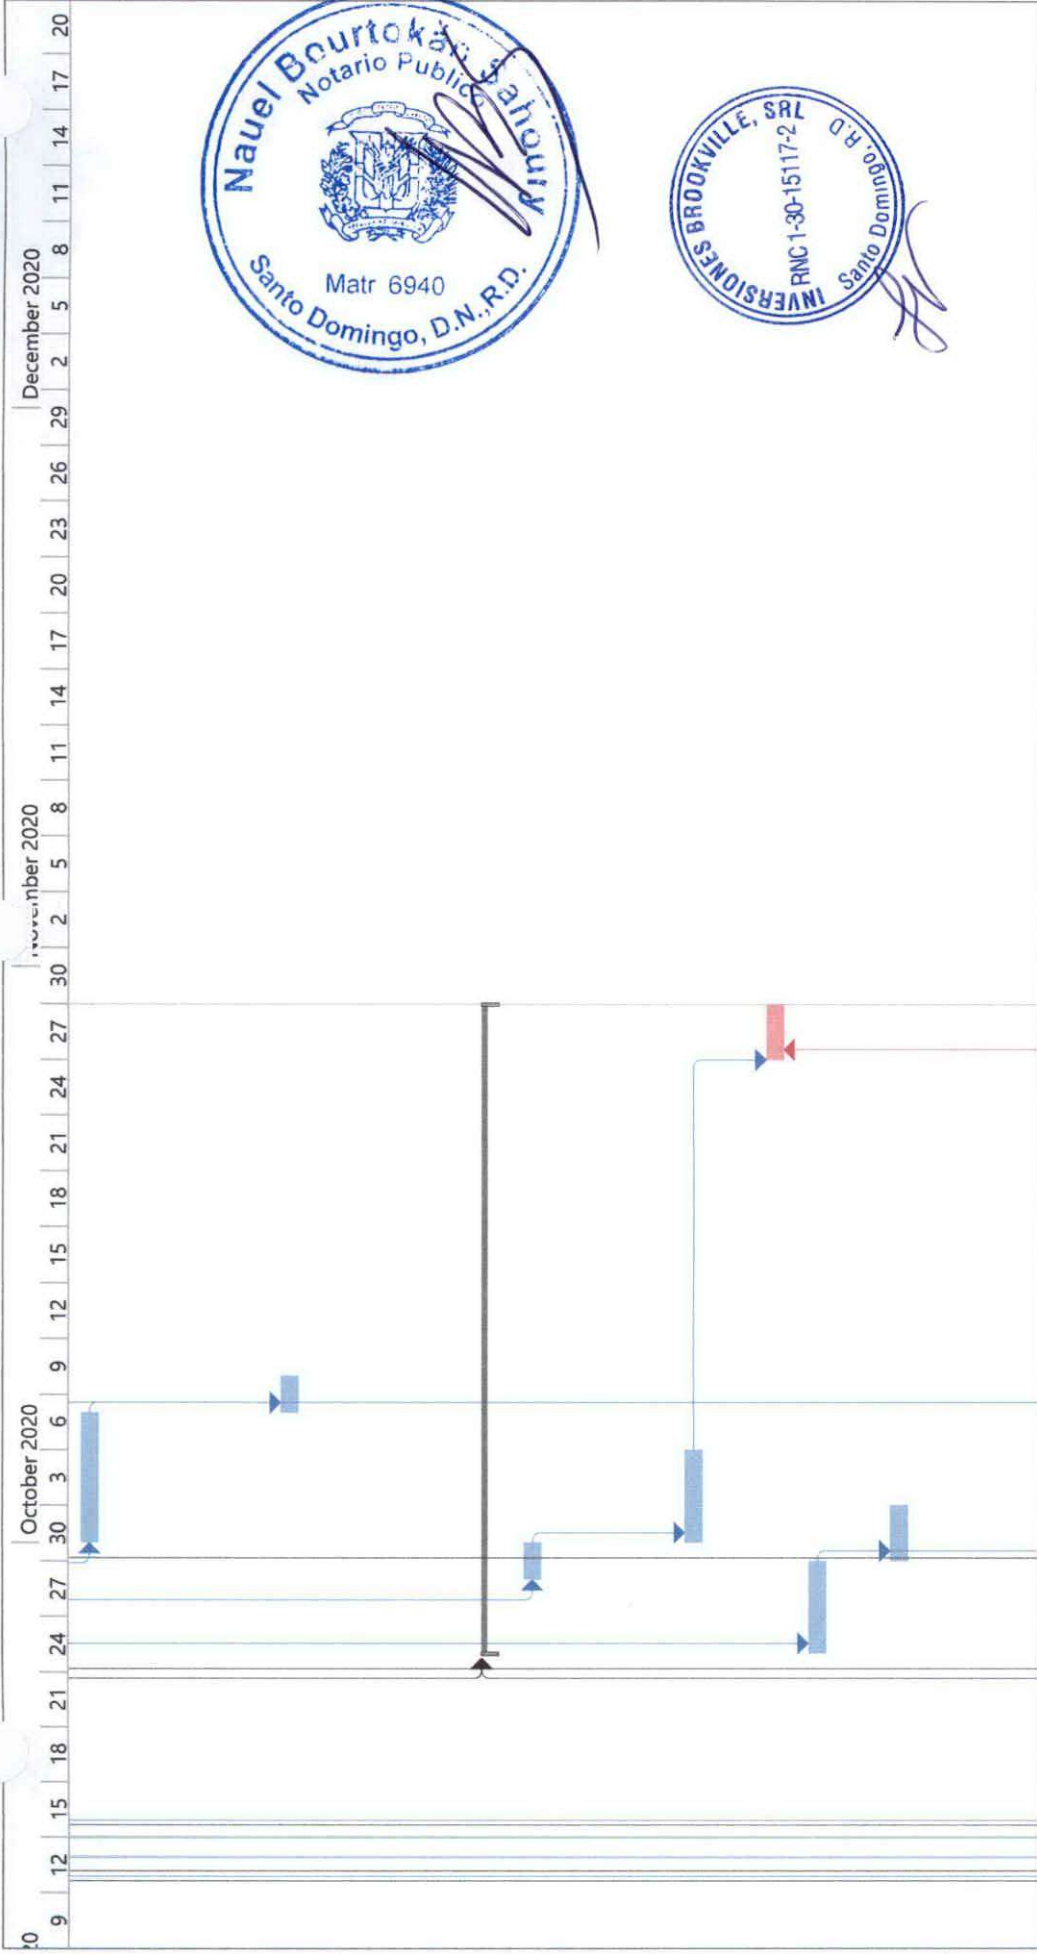

- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Manual Progress

- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only

- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone

Project: Remodelacion Palacio d
 Date: Tue 15/9/20






[Handwritten signature]

Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20


October 2020
 9 12 15 18 21 24 27 30
 November 2020
 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
 December 2020
 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

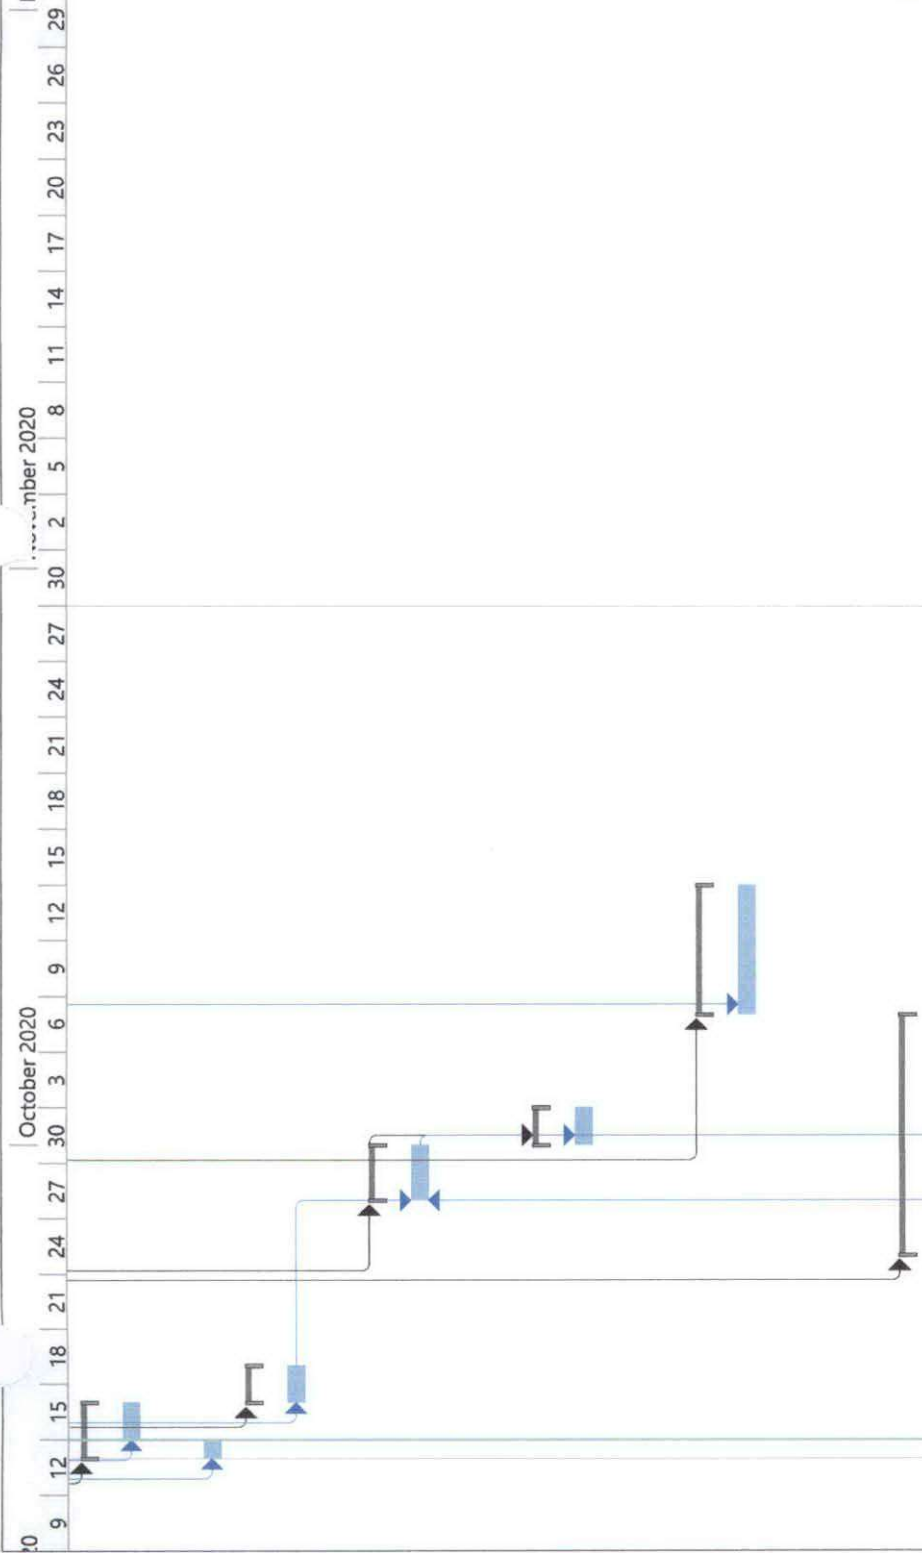

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Critical
Project Summary	Manual Summary	Critical Split
Inactive Task	Start-only	Progress
Inactive Milestone	Finish-only	Manual Progress

Project: Remodelacion Palacio d
 Date: Tue 15/9/20

October 2020 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | November 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | December 2020 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20

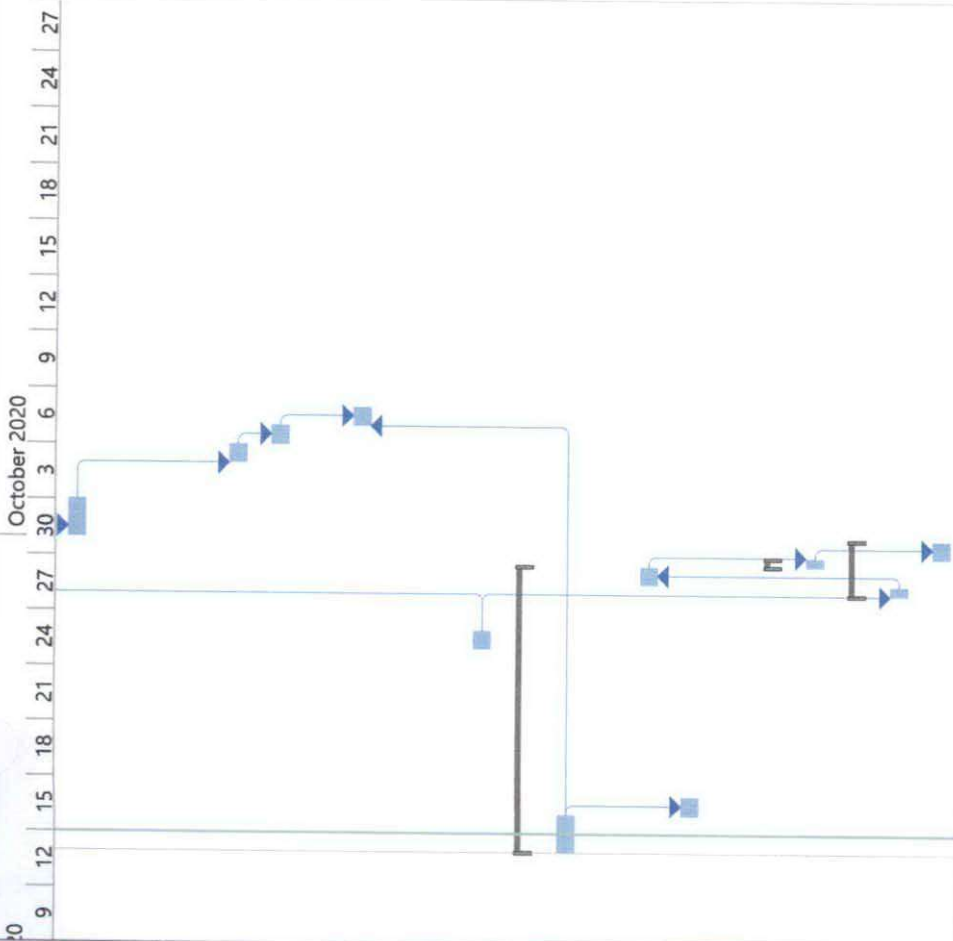

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Critical
Project Summary	Manual Summary	Critical Split
Inactive Task	Start-only	Progress
Inactive Milestone	Finish-only	Manual Progress

Project: Remodelacion Palacio d
Date: Tue 15/9/20



COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)



APELLIDOS:

RAMOS LLENAS

NOMBRES:

EDUARDO JESUS

PROFESION:

INGENIERO CIVIL

EXEQUATUR: 60

DIF: 29/11/2020

CEDULA: 223-0154845-3

COLEGIATURA: 40935

Firma Colegiado

Firma Presidente



PAGINA

No. 03



Ministerio de Educación
de la República Dominicana
OFICINA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL



CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, le informamos que el **Consorcio Forta Alianco**, con RNC 1-31-98826-1, confirmado por las empresas **Inversiones Brookville, S.R.L.** y **Sistemas & Tecnología, SRL** con RNC 1-30-15117-2 y 1-02-32429-8 respectivamente, han realizado y entregado de manera satisfactoria las reparaciones contenidas en el presupuesto del **Proyecto Mantenimiento Correctivo 75 Centros Educativos en toda la Geografía Nacional OCI-MAE-PEUR-2019-0001**, correspondiente al Lote 28, centros educativos Jose Gabriel García en Manzanillo, Montecristi, y Pedro de los Santos (La Carbonera) en Montecristi. Las reparaciones fueron realizadas con todos los requerimientos técnicos por Inversiones Brookville, S.R.L y en el tiempo adecuado

El monto adjudicado fue de doce millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos treinta y un pesos con 28/100 (RD\$12,686,231,28).

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada, a los seis (6) días del mes de agosto del dos mil veinte (2020), en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

Agradeciendo su colaboración, Atentamente,


Lic. Jose Cid Moronta
Coordinador Administrativo Financiero







TERMINACIONES Y COLORES S.R.L.

Av. Juan Pablo Duarte No. 133. Santiago República Dominicana * Tel : (809) 241-9000 *
RNC 102-32279-1

www.terminacionesycolores.com

Julio 1ro, 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa **INVERSIONES BROOKVILLE, SRL**, con **RNC No. 1-30-151117-2** fue contratada para remodelar nuestras oficinas en el año 2015, concluyendo en el tiempo previsto y acorde lo presupuestado.
a entera satisfacción por nuestra empresa.

Los trabajos de remodelación incluían instalación puertas y ventanas, remoción e instalación de plafones, demolición, suministro y colocación de pisos, instalación de divisiones en sheetrock, remodelación de baños, instalaciones eléctricas y de aire acondicionados.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,



PAGINA
No. 65

A QUIEN PUEDA INTERESAR


Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa **INVERSIONES BROOKVILLE, SRL, RNC NO. 1-30-151117-2** fue la empresa contratista encargada de remodelar el área de cafetería en el Centro de Oftalmolaser, Santiago.

Entre los trabajos realizados incluye: demolición, suministro y colocación de pisos, divisiones en sheetrock, habilitación de área de cocina, baño adicional, instalación puertas y plafones, instalaciones eléctricas, aire acondicionados, suministro e instalación de equipos de cocina.

El área intervenida, consta de 19 mt2 y el costo total del proyecto, incluyendo equipamiento fue de RD\$ 1,250,000.00


Los trabajos fueron ejecutados desde octubre 2016 hasta diciembre 2016 y recibidos a entera satisfacción por nuestra empresa.

Atentamente,


Carolina Peña
Gerente Administrativa



Curriculum Vitae
Lorenzo Vicens Bello
Oficina:(809) 412-1211 Móvil:(809) 910-6024
lvicens@intelecta.com.do



EDUCACIÓN

- **Doctor en Administración de Negocios.** University of South Carolina, Columbia, SC, USA 1992. Tesis: Tactics: A Knowledge Based Tactical Production Planning System.
- **Estudios de Postgrado en Administración de Empresa.** Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, República Dominicana, 1983-1985. Nunca completada porque fui seleccionado para realizar el doctorado en el penúltimo cuatrimestre.
- **Ingeniero Electromecánico.** Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, República Dominicana. Concentración en Ingeniería Eléctrica. Magna Cum Laude, 1974-1979.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **Gerente General.** INVERSIONES BROOKVILLE, S.R.L. Santo Domingo, RD. 2005-actual.
- **Gerente General.** Intelecta, S.R.L. Santo Domingo, RD. Junio 2002- actual.
- **Vicepresidente de Negocios.** TRICOM, S.A. Santo Domingo, RD. Julio 2000- mayo 2001
- **Vicepresidente de Mercadeo.** Banco Popular Dominicano, Santo Domingo, RD. Febrero 1997- junio 2000.
- **Director. Centro de Estudios Estratégicos.** Fundación dedicada al estudio y fomento de las mejores prácticas en administración de empresa.
- **Director de Asesorías.** Programa de Reestructuración Industrial de la República Dominicana, desarrollado conjuntamente con las Naciones Unidas y la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. 1993-1994.
- **Director del Centro de Investigaciones Aplicadas e Investigador Principal.** Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo. Septiembre 1989 hasta diciembre 1992.
- **Gerente de Proyectos.** Corporación Dominicana de Electricidad. Gerente de equipo de supervisión proyecto de instalación de Subestaciones 138 KV y 69KV, Santo Domingo, RD. 1982-1985.
- **Ingeniero Supervisor.** Corporación Dominicana de Electricidad. Supervisión área eléctrica del proyecto de construcción de la Unidad 5 de la Central Río Haina. Santo Domingo, RD. 1980-1982.

DATOS PERSONALES

- Fecha de nacimiento: 25 de octubre, 1957
- Idiomas: Español e Inglés.





16 de septiembre

Página 4 de 3

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL
Curriculum Vitae

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: VICENS BELLO
2. Nombre: LORENZO VICENS
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 25 DE OCTUBRE, 1957, SANTO DOMINGO
4. Nacionalidad: DOMINICANO
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO, DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA.
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Gracita Alvarez No 7, Torreo Londres, Piso 6, Naco, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional.
8. Educación:

Instituciones	Fecha	Titulación
UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL SUR	1992	DOCTOR
PUCMM	1979	INGENIERO ELECTRICO

9. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		5	5



INGLES			5	5



10. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

11. Función actual: Gerente de Ingeniería y Proyecto

12. Otras competencias. (informática, etc): Microsoft Office, Microsoft Project, programación

13. Años de experiencia profesional: 40 años

14. Cualificaciones Principales: Diseño, planificación y supervisores de proyectos de ingeniería. Gestion de proyectos y control financiero.

15. Experiencia específica en países no industrializados:

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

16. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
Agosto 2019- Enero 2020	Montecristi	CONSORCIO FORTA ALIANCO/INVERSIONES BROOKVILLE	Ingeniero a cargo del proyecto	Remodelación escuelas Jose Gabriel Garcia y Pedro de los Santos
Julio 2018 a mayo 2019	San Pedro de Macorís	INVERSIONES BROOKVILLE, SRL e INTELECTA, SRL	Gerente	Construcción de áreas exteriores, pintura, impermeabilización 12 edificios

JUR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



PAGINA
No. 69

Octubre a Diciembre 2016	Santiago	INVERSIONES BROOKVILLE	Gerente	Construcción y equipamiento área de cafetería.
Junio a Septiembre 2015	Santiago	INVERSIONES BROOKVILLE	Gerente	Remodelación de local comercial: Puertas, ventanas, plafones, pisos, baños, aire acondicionado, electricidad y otros.
Agosto 2013 a Dic. 2013	Puerto Plata	INVERSIONES BROOKVILLE, SRL	Gerente	Suministro y Colocación de Alucobond, impermeabilización.
Enero a Nov. 2010	El Limón las Terrenas, Samaná	INVERSIONES BROOKVILLE, SRL	Gerente	Reparaciones electricidad, piso, pintura, e impermeabilización. Instalación planta y transfer y sistema de agua potable.

17. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

- Ing. Juan Victor Arambales Garcia, tel. 809-563-7676

- Ing. Jose Khouri, tel. 809-570-7222.



/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



PAGINA
No. 70

University of South Carolina



Know all men by these presents

That the Board of Trustees by virtue of authority vested in it by the State of South Carolina upon recommendation of the Faculty of the

Graduate School

has conferred upon
Lorenzo Jose Vicens

the degree of

Doctor of Philosophy



together with all the rights, honors, privileges, and responsibilities to that degree appertaining.

Given at Columbia, South Carolina this 8th day of May in the year of Our Lord one thousand nine hundred and ninety-two and in the one hundred and ninety-first year of the University's founding.

John M. Palms
President




Donald D. [Signature]
Presiding Officer, Board of Trustees

Or H. Anderson
Acting Dean

Thomas L. [Signature]
Secretary of the University



UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA



Lorenzo José Vicens Bello

ha cumplido todos los requisitos exigidos para el Grado de

INGENIERO ELECTROMECHANICO

ORIENTACION ELECTRICA
MAGNA CUM LAUDE

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el día veintiséis de enero de mil novecientos ochenta.





El Rector

PAGINA
No. 72




EDUARDO JESÚS RAMOS LLENAS

Av. República de Colombia,
Jardines del Fresno, edf.12 apto.102
Santo Domingo Oeste, Rep. Dominicana

  809-886-6244

 ing.eduardo.llenas@gmail.com

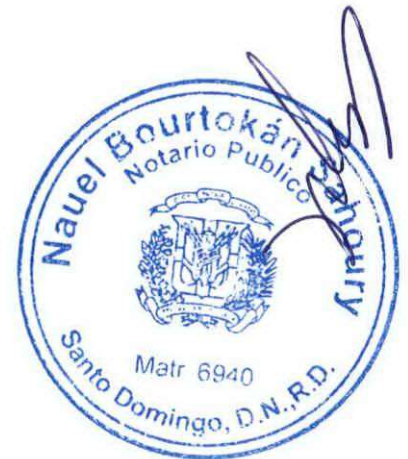

OBJETIVOS

Encontrar una empresa en la cual pueda aplicar mis experiencias y conocimientos, que me otorgue estabilidad laboral y desarrollo profesional.

DATOS PERSONALES

▪ Cédula de Identidad y Electoral	223-0154845-3
▪ Fecha de Nacimiento	30 Julio 1993
▪ Nacionalidad	Dominicana
▪ Lugar de Nacimiento	Santo Domingo
▪ Estado Civil	Casado

FORMACIÓN ACADÉMICA

-Estudios Secundarios	Giovanni Cotta- Verona Italia
-UNIVERSITARIOS	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Título: Ingeniero Civil

SOFTWARES


- AutoCad
- Paquete Office
- Etabs




PAGINA
No. 73

IDIOMAS

- Español
- Italiano
- Inglés (Avanzado)



EXPERIENCIA LABORAL

- **GRUPO THERRESTRA- JAMAICA** (Ing. residente) Encargado de supervisión, construcción de obra gris y terminación de edificio de 5 niveles con sistema aporcado para proyecto hotelero de +900 habitaciones en la cadena hotelera H10 Jamaica. (Coral Spring H10).
- **MM Ingeniería: (Ing. residente)** Remodelación y ampliación de edificación existente, para construcción de una tienda "Bonjour" Total, en la estación de combustible SS la Sureña en Bani.
- **MOPC:** 1 año de Pasantía en los siguientes departamentos:
 - Laboratorio de Mecánica de Suelos
 - Supervisión y Fiscalización de Obras del Estado
 - Diseño y Calculo Estructural

REFERENCIAS LABORALES

- Arq. Manuel Matos. 829-761-9560
- Ing. Arq Domingo Cabrera 1-(876)-279-9589 / (829-898-2608)

REFERENCIAS PERSONALES

- Lic. Beatriz Romero 829-281-9181
- Dr. Carlos Rosario 809-543-3382
- Ing. Ángel Volquez 829-633-1443

CUALIDADES

- Responsabilidad
- Liderazgo
- Trabajo en Equipo
- Innovador
- Proactivo





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Eduardo Jesús Ramos Llenas

EL DIPLOMA DE:

Ingeniero Civil

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana

hoy día 11 de abril del 2016

[Signature]
RECTOR (A)

[Signature]
DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 27,960
LIBRO No. 9 FOLIO No. 35





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
LORENZO JOSE VICENS BELLO ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 00100689371 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 3625, Exequatur No. 3209 , de fecha 26/01/1980
de profesión INGENIERO ELECTROMECHANICO .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 7 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidencia.codia.central@gmail.com • www.codia.org.do

Tel. 829-378-0038

RNC: 401-00941-2

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
EDUARDO JESUS RAMOS LLENAS ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. **22301548453**, es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. **40935**, Exequatur No. **60**, de fecha **11/04/2016**
de profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 16 días
del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA



PAGINA

No. 707
