ID		Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Resource Names	Predeces
0			0	**REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA**	**132 days**		
1			1	**READECUACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA**	**132 days**		
2			1.1	Planificación preliminar (CONTRATISTA)	3 days		
3			1.2	Suministro de materales	40 days		2
4			1.3	**Ejecución de Obra**	**127 days**		**2**
5			1.3.1	Baños publicos para damas, caballeros y para personas con discapacidad	45 days		
6			1.3.2	Baño juez camara civil	20 days		5SS
7			1.3.3	Accesibilidad (Rampas, señalización etc	30 days		5
8			1.3.4	Parte frontal (explanada) accesibilidad minusvalidos	20 days		7
9			1.3.5	Departamento administrativo (area de mensajeria)	20 days		7SS
10			1.3.6	Acera parte frontal	15 days		8
11			1.3.7	Pintura	7 days		8,9,10
12			1.3.8	Miscelaneos	10 days		8,11
13			1.4	**Recepción final de obra**	**2 days**		**12**
14			1.5	**Finalización de obra**	**0 days**		**13**

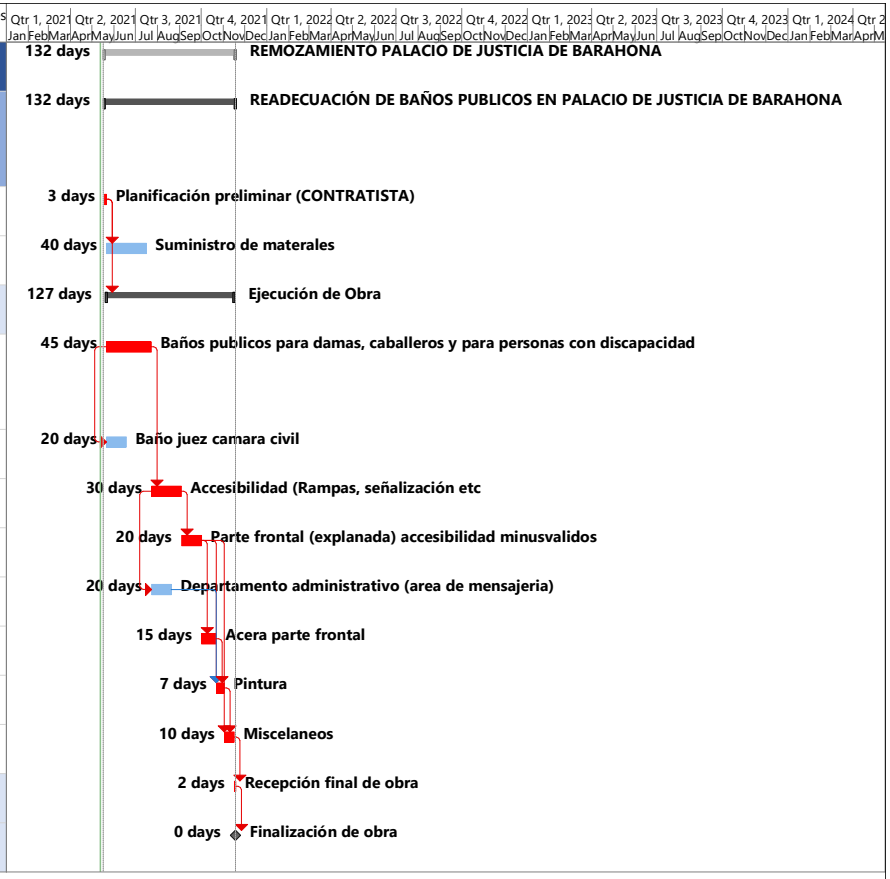

Proyecto: REMOZAMIENTO PA
Fecha: Thu 5/13/21

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	
