



III) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (LOTE 1):



H.O.




a) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



T.O.

L.O



b) TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA





24.5 DIAS



F.O.

**EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA PROPUESTO ES DE
24.5 DIAS SIENDO LA CANTIDAD DE DIAS INFERIOR A
LAS 5 SEMANAS ESTABLECIDAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS**



c) Garantia de los bienes y/o servicios cotizados

F.O.



N/A

p.o.



**d) CARNET DE CODIA DEL INGENIERO RESIDENTE
DE LA OBRA**



T.O.



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
Delegación Provincial Monseñor Nouel, Calle Azua esq. Dominicana # 102, Bonao, Rep. Dom.
codiabonao@hotmail.com / codianouel@gmail.com
TEL: 809-525-6946. FAX. 809-525-6946




"AÑO DE LA CONSOLIDACION INSTITUCIONAL CODIANA"

CERTIFICACION


Por medio de la presente hacemos constar que la persona cuyos datos que aparecen más abajo es miembro de nuestro colegio con todos los derechos y deberes que la ley y nuestro reglamento prescriben, el mismo está al día en el pago de sus obligaciones.

Nombre y apellidos : **Francisco Antonio Sang Vargas**
Profesión : **Ing. Civil.**
Cédula No. : **048-0091338-8**
Colegiatura No. : **31889**
Exequátur No. : **76**
De Fecha : **06/03/2015**

Esta certificación se hace a requerimiento de la parte interesada, en Bonao Provincia Monseñor Nouel, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), para los fines que considere de lugar (Valido por 30 días).


Ing. Elect./Inosencio Mola Guzmán
Colegiatura. 20491
Presidente.




Ing. Agrón. Ana Damaris Avilés
Colegiatura. 37022
Sec. General

"ASESOR DEL ESTADO POR LEY 6160 DEL 11 DE ENERO DE 1963"





e) CERTIFICACIONES DE RECEPCIÓN CONFORME



F.O.



Santo Domingo, 01 de Julio 2019

CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Por medio de la presente el **CONSORCIO NORTE SUR** (el "Consortio") certifica que la empresa **Constructora Vargsang SRL**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-92199-7 suscribió con el Consocio el Subcontrato No. OSC-CNS-1100-15, de fecha septiembre 2015 (el "Subcontrato"), en virtud del cual realizó los siguientes trabajos:

Excavaciones
Demoliciones
Construcción de puente peatonal
Colocación de alcantarilla de hormigón armado
Construcción de contenes y aceras
Encaches de cunetas
construcción de vertederos
Limpiezas de registros
Alquiler de Equipos
Colocación de Asfalto



Así mismo, hacemos constar que el Consorcio ha cumplido cabalmente con su obligación de pago establecida en el Subcontrato y que no adeuda a **Constructora Vargsang SRL** ninguna suma de dinero derivada directa o indirectamente de éste ni por ninguna otra causa.

La presente certificación se expide a requerimiento de parte interesada, sin que signifique una aceptación implícita o tácita de los trabajos y sin perjuicio o renuncia a las garantías legales y contractuales que **Constructora Vargsang SRL** debe al Consorcio por los trabajos realizados.

En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, República Dominicana, a (01) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019).

Manuel Reategui
Gerente de Contrato





CARRETERA MICHES

Santo Domingo, 01 de Julio 2019



CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Por medio de la presente el **PROYECTO CARRETERA MICHES** (el "proyecto") certifica que la empresa **Constructora Vargsang SRL**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-92199-7 suscribió con el Consorcio el Subcontrato No. CM-171-2014, de fecha mayo 2014 (el "Subcontrato"), en virtud del cual realizó los siguientes trabajos:

- Movimiento de tierra
- Suministro de Agregados
- Mantenimientos de camino
- Colocación de tuberías de hormigón y metálicas
- Confección de cunetas
- Construcción de muros de gaviones
- Dren de pavimento
- Sub-dren
- Colocación de Asfalto




Así mismo, hacemos constar que el Consorcio ha cumplido cabalmente con su obligación de pago establecida en el Subcontrato y que no adeuda a **Constructora Vargsang SRL** ninguna suma de dinero derivada directa o indirectamente de éste ni por ninguna otra causa.

La presente certificación se expide a requerimiento de parte interesada, sin que signifique una aceptación implícita o tácita de los trabajos y sin perjuicio o renuncia a las garantías legales y contractuales que **Constructora Vargsang SRL** debe al Consorcio por los trabajos realizados.

En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, República Dominicana, a (01) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019).

Manuel Reategui
Gerente de Contrato





CARRETERA PIEDRA BLANCA - CRUCE DE OCOA



Santo Domingo, 01 de Julio 2019

CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Por medio de la presente el **CONSORCIO CIBAO SUR** (el "Consortio") certifica que la empresa **Constructora Vargsang SRL**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-92199-7 suscribió con el Consorcio el Subcontrato No. CCS-C-022/2015, de fecha marzo 2015 (el "Subcontrato"), en virtud del cual realizó los siguientes trabajos:

Movimientos de tierra
Colocación de tuberías de hormigón y metálicas
Confección de cunetas
Muros de suelo reforzado
Construcción de muros de gaviones
Dren de pavimento
Alquiler de Equipos
Sub-dren
Colocación de Asfalto



Así mismo, hacemos constar que el Consorcio ha cumplido cabalmente con su obligación de pago establecida en el Subcontrato y que no adeuda a **Constructora Vargsang SRL** ninguna suma de dinero derivada directa o indirectamente de éste ni por ninguna otra causa.

La presente certificación se expide a requerimiento de parte interesada, sin que signifique una aceptación implícita o tácita de los trabajos y sin perjuicio o renuncia a las garantías legales y contractuales que **Constructora Vargsang SRL** debe al Consorcio por los trabajos realizados.

En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, República Dominicana, a (01) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019).

Manuel Beategui
Gerente de Contrato



Santo Domingo, 01 de Julio 2019

CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Por medio de la presente el **CONSORCIO CORREDOR DUARTE** (el "Consortio ") certifica que la empresa **Constructora Vargsang SRL**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-92199-7 suscribió con el Consorcio el Subcontrato No. ECO-033-13, de fecha enero 2014 (el "Subcontrato"), en virtud del cual realizó el siguiente trabajo :


Movimientos de tierras, alquiler de equipos, fabricación de muros de suelos reforzado, colocacion de asfalto, mantenimientos de caminos, excavaciones, Demoliciones , Construcción de puente peatonal , Colocación de alcantarilla de hormigón armado, Construcción de contenes y aceras, Encaches de cunetas.

Así mismo, hacemos constar que el Consorcio ha cumplido cabalmente con su obligación de pago establecida en el Subcontrato y que no adeuda a **Constructora Vargsang SRL** ninguna suma de dinero derivada directa o indirectamente de éste ni por ninguna otra causa.

La presente certificación se expide a requerimiento de parte interesada, sin que signifique una aceptación implícita o tácita de los trabajos y sin perjuicio o renuncia a las garantías legales y contractuales que **Constructora Vargsang SRL** debe al Consorcio por los trabajos realizados.

En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, República Dominicana, a (01) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019).

Manuel Reategu
Gerente de Contrato





f) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (SNCC.D.049)

H.O.



SNCC.D.049



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

CP-CPJ-002-2020

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 09-07-2020

Nombre del Oferente: **LEVITEX SRL**



Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
RECONSTRUCCIÓN DE BALNARIO LAS MARIAS NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO	RD\$4,830,524.66	6 Meses	07/12/2020	10%	CEIZTUR	PRINCIPAL	Aún No
CONSTRUCCION DE CAMARA CUARTO FRIO EN EL ALMACEN UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	RD\$1,785,793.53	2 Meses	15/11/2019	95%	CONANI	PRINCIPAL	Aún No
READECUACIÓN PARQUE SANTO	RD\$ 1,200,000.00	12 MESES	25/10/2017	100%	ASDN	PRINCIPAL	SI



F. O.

DOMINGO NORTE									
CENTRO COMUNAL	RD\$ 1,000,909.58	12 MESES	25/10/2017	100%		ASDN	PRINCIPAL	SI	
REMODELACION OFICINA	RD\$2,500,000.00	12 MESES	01/03/2016	100%		IDEICE	PRINCIPAL	SI	
B) Internacionales									

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Fanelly Ortiz

Firma
Sello





g) EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO, CERT. DEL CODIA Y TITULOS DE GRADO Y POSTGRADO

T.O.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL
Currículum Vitae

1. **Apellidos:** Sang Vargas
2. **Nombre:** Francisco Antonio
3. **Fecha y Lugar de Nacimiento:** 8 de Marzo 1985
4. **Nacionalidad:** Dominicana
5. **Estado Civil:** Casado
6. **Formación:** Barna Management School 2018-2019, 15 módulos Meca-Trónica ITLA 2004-2016 y Entrenamiento en Tecnología TENSAR Colombia 2014.
7. **C/ Los Claveles N. 5 Res. Doña Amalia, Bonao, Monseñor Nouel, R.D.**



Email: Fsang@vargsangcons.com

Instituciones	Fecha	Titulación
Barna Management School	2019-actual	MBA Executive Intensive Program
Instituto Tecnológico de Santo Domingo	2015-2017	Administración de la Construcción
Instituto Tecnológico de Santo Domingo	2003/2008	Ingeniero Civil
Centro Educacional de Bonao	1999/2003	Bachillerato

F. A.



8. Conocimientos lingüísticos:

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	5	5	5
Inglés	2do idioma	5	5	5

9. Afiliación a organismos profesionales:

- Miembro del Consejo Nacional Fundación Liderazgo Emergente (2014)
- Director de Gestión y Logística de Proyecto Formación y Acción (PIFA) (2014)
- Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores.
- Tesorero de la Cámara de Comercio de Monseñor Nouel - Actual.

10. Función actual: Presidente

11. Otras competencias.

- AutoCAD, Presto 10, MS Office ESL

12. Años de experiencia profesional: 12 años

13. Cualificaciones Principales: Integridad, Honestidad, Compromiso, Solidario, Responsable, Etc.



14. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2019-Actual	Boca Chica	Consortio GE/Contratista	Gerente General	Gerenciar obra de movimientos de tierras en Gaseoducto del Este, para instalación de tuberías de gas, acondicionamiento de caminos y soporte para obras civiles.
2015-Actual	Cotuí	Barrick/Contratista	Gerente General	Actuar como el representante legal de la empresa, fijando políticas operativas y administrativas con la más alta calidad que nos caracteriza, de ser la empresa líder de movimientos de tierra con la mejor gestión de seguridad de nuestro país. Supervisa y controla todo el proyecto, y en especial los recursos: humanos, sociales y tecnológicos. Resolver las incidencias y gestionar los



				riesgos y reorientar el proyecto en caso necesario. A veces elaborar planes B previamente a la detección del problema. Ser proactivo en avanzarse a las posibles crisis que puedan surgir.
2014	Bani	Punta Catalina / Contratista	Gerente General	Tiene la responsabilidad de dar soporte a todos los procesos y departamentos la Constructora, así como también hacer cumplir con todos los procedimientos y políticas que se han planteado para servir los mejores servicios a nuestros clientes con eficiencia y eficacia en el menor tiempo posible. Servicio de equipos de movimiento de tierra, construcción e verja perimetral y otras obras civiles.
2014-2015	Herminas Mirabal	Construcción Acueducto Múltiples 2da Etapa / Contratista	Gerente General	Dirigir el proceso de planeación estratégica del proyecto, determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas así cumpliendo en el tiempo establecido de entrega con la calidad que siempre nos identifica. Instalación de líneas primarias del acueducto múltiple y los accesorios de las piezas especiales. Asfaltado y condicionamiento de caminos.
2014	Punta Cana	Construcción de Rampa Aeropuerto/ Contratista	Gerente General	Supervisar indicadores de desarrollo (costos, ingresos, proyecciones). Evaluar los modelos de mejoras de proyecto presentados por los demás encargados. Construcción muros de suelo reforzado que sirvieron de rampa en las pistas de aterrizaje.
2014	San Juan	Proyecto IAD Mantenimiento Vía 18 Kms / Contratista	Gerente General	Tomar decisiones financieras y de proyectos para el crecimiento de la Constructora. Tener la responsabilidad de dar soporte a todos los procesos en la empresa, así como también cumplir con los procedimientos y políticas de VARGSANG. Mantenimiento de vías, condicionamiento de caminos y movimientos de tierra.

15. Varios.

Publicaciones y Seminarios:

Referencias:

Firma:

Sello





COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
Delegación Provincial Monseñor Nouel, Calle Azua esq. Dominicana # 102, Bonaó, Rep. Dom.
codiabonao@hotmail.com / codianouel@gmail.com
TEL: 809-525-6946. FAX. 809-525-6946




"AÑO DE LA CONSOLIDACION INSTITUCIONAL CODIANA"

CERTIFICACION


Por medio de la presente hacemos constar que la persona cuyos datos que aparecen más abajo es miembro de nuestro colegio con todos los derechos y deberes que la ley y nuestro reglamento prescriben, el mismo está al día en el pago de sus obligaciones.

Nombre y apellidos : **Francisco Antonio Sang Vargas**
Profesión : **Ing. Civil.**
Cédula No. : **048-0091338-8**
Colegiatura No. : **31889**
Exequátur No. : **76**
De Fecha : **06/03/2015**

Esta certificación se hace a requerimiento de la parte interesada, en Bonaó Provincia Monseñor Nouel, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), para los fines que considere de lugar (Valido por 30 días).


Ing. Elect. Anosencio Mola Guzmán
Colegiatura. 20491
Presidente.




Ing. Agrón. Ana Damaris Avilés
Colegiatura. 37022
Sec. General

"ASESOR DEL ESTADO POR LEY 6160 DEL 11 DE ENERO DE 1963"





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Francisco Antonio Sang Vargas

EL DIPLOMA DE:

Ingeniero Civil

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 02 de octubre del 2009



[Signature]
RECTOR (A)

DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

RODRÍGUEZ SUAREZ, M. *[Signature]*
1860 No. _____ FUNDADA



H.O.

IBUCIÓN
al 1 - Expediente de Compras





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Francisco Antonio Sang Vargas

EL DIPLOMA DE:

Magíster en Ciencias de la Administración de la Construcción

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 2 de octubre del 2017


DIRECTOR (N) EJECUTIVO (N) DE REGISTRO
REGISTRADO BAJO EL N.º 30.377
LIBRO N.º 9 FOLIO N.º 156


REGISTRAR (A)



Certificate of Completion


This is to certify that

Francisco Sang


has successfully attended and completed

International Tensar Training Seminar

Held in Bogota, Colombia August 18-23, 2014



Dean Ditmar
VP and GM Americas



Eduardo Parajon
GM – Latin America,
Caribbean



Mark Wayne
Director of Application
Technology



F.O.





IV) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (LOTE 3):



T.O.




a) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES




F.O.

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Aug 2, '20	Aug 9, '20	Aug 16, '20	Aug 23, '20
1	Adecuación área de recepción de documentos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macoris, LOTE. 03	23.95 days	Tue 7/28/20	Fri 8/28/20	S	M	T	W
2	INICIO	0 days	Tue 7/28/20	Tue 7/28/20	S	M	T	W
3	PRELIMINARES	6.2 days	Tue 7/28/20	Wed 8/5/20	S	M	T	W
4	Diseño de estrado existente sobre plataforma	3.5 days	Tue 7/28/20	Mon 8/3/20	S	M	T	W
5	Diseño de puertas de madera lóbex existentes	0.2 days	Tue 7/28/20	Tue 7/28/20	S	M	T	W
6	Diseño de puertas de madera sencillas existentes	0.5 days	Tue 7/28/20	Tue 7/28/20	S	M	T	W
7	Agente de hierro en Shetrook	1 day	Tue 8/4/20	Wed 8/5/20	S	M	T	W
8	Diseño de lamparas existentes	1 day	Mon 8/3/20	Tue 8/4/20	S	M	T	W
9	MUROS	1.5 days	Wed 8/5/20	Thu 8/6/20	S	M	T	W
10	Suministro e instalación de Muros en Shetrook (incluye estructura cablea 22)	1 day	Wed 8/5/20	Thu 8/6/20	S	M	T	W
11	Corte de buco en muros de Shetrook (incluye estructura cablea 22)	0.5 days	Thu 8/6/20	Thu 8/6/20	S	M	T	W
12	TERMINACIÓN DE TECHOS	6 days	Wed 8/12/20	Thu 8/20/20	S	M	T	W
13	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" + Tronc vid yeso (incluye estructura en metal fabric Taw y Circa 1" x 1")	5 days	Wed 8/12/20	Wed 8/19/20	S	M	T	W
14	Suministro e instalación de fascia en shetrook (incluye estructura)	1 day	Wed 8/19/20	Thu 8/20/20	S	M	T	W
15	VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS	1.7 days	Mon 8/10/20	Wed 8/12/20	S	M	T	W
16	Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver mas detalles en planos)	0.8 days	Mon 8/10/20	Tue 8/11/20	S	M	T	W
17	Suministro e instalación de Vidrios Fijos y travesaños en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	0.4 days	Tue 8/11/20	Tue 8/11/20	S	M	T	W
18	Suministro e instalación de Puerta abatible de aluminio (incluye estructura y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	0.25 days	Tue 8/11/20	Tue 8/11/20	S	M	T	W
19	Suministro e instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	0.25 days	Tue 8/11/20	Wed 8/12/20	S	M	T	W
20	EQUIPOS MECÁNICOS	2 days	Fri 8/21/20	Tue 8/25/20	S	M	T	W
21	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 18 BEER, 36 KBTU/ hora, filtro de carbón, compresor silencioso, cubierta de acero, filtro de Blanca, LED, 9 WATTS	0.5 days	Fri 8/21/20	Fri 8/21/20	S	M	T	W
22	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 18 BEER, 36 KBTU/ hora, filtro de carbón, compresor silencioso, cubierta de acero, filtro de Blanca, LED, 9 WATTS	0.5 days	Fri 8/21/20	Mon 8/24/20	S	M	T	W
23	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 18 BEER, 36 KBTU/ hora, filtro de carbón, compresor silencioso, cubierta de acero, filtro de Blanca, LED, 9 WATTS	0.5 days	Mon 8/24/20	Mon 8/24/20	S	M	T	W
24	Suministro e instalación de Estrado en Laminado, espesura para mover 1200 cfm, conectora UL 726, con control de humedad, control de temperatura, panel de data	10.7 days	Mon 8/24/20	Tue 8/25/20	S	M	T	W
25	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.7 days	Thu 8/6/20	Fri 8/21/20	S	M	T	W
26	Suministro e instalación de Lámparas para iluminación Led 2 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 4000L, 9000L, 15000L, 277 VAC, 4000L, 9000L, 15000L	2 days	Mon 8/17/20	Wed 8/19/20	S	M	T	W
27	Suministro e instalación de Lámparas recortadas de 4" LED, 9 WATTS	0.5 days	Wed 8/19/20	Wed 8/19/20	S	M	T	W
28	Suministro e instalación de Sillas contable	2.5 days	Wed 8/12/20	Mon 8/17/20	S	M	T	W
29	Suministro e instalación Tomacorrientes 110v Polifaseo Color Blanco	2 days	Mon 8/10/20	Wed 8/12/20	S	M	T	W
30	Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polifaseo Color Blanco (Pura White) con botonera color blanco control sual y placa de botones de soporte	0.4 days	Wed 8/12/20	Wed 8/12/20	S	M	T	W
31	Suministro e instalación tabla de Data	1.5 days	Wed 8/19/20	Fri 8/21/20	S	M	T	W



Handwritten signature or initials.

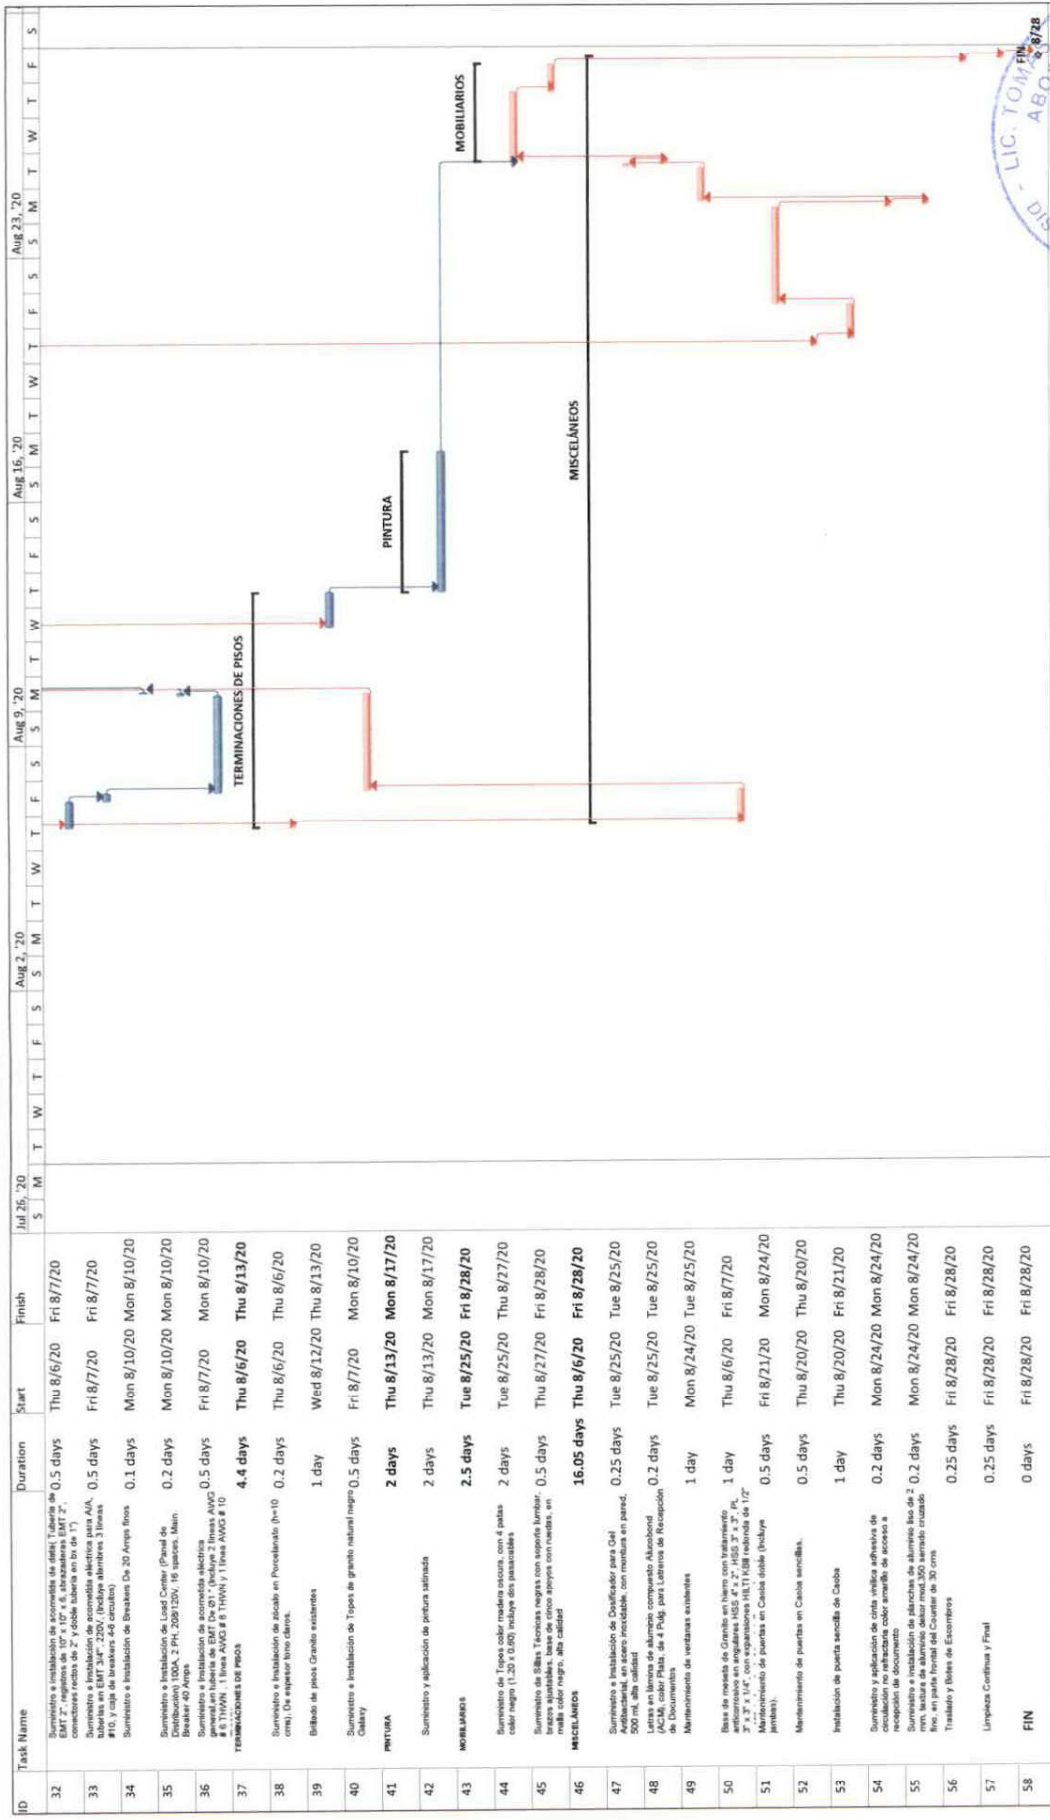

T-0.

Task Name	Start	Finish	Duration	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
32	Thu 8/6/20	Fri 8/7/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
33	Fri 8/7/20	Fri 8/7/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
34	Mon 8/10/20	Mon 8/10/20	0.1 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
35	Mon 8/10/20	Mon 8/10/20	0.2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
36	Fri 8/7/20	Mon 8/10/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
37	Thu 8/6/20	Thu 8/13/20	4.4 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
38	Thu 8/6/20	Thu 8/6/20	0.2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
39	Wed 8/12/20	Thu 8/13/20	1 day	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
40	Fri 8/7/20	Mon 8/10/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
41	Thu 8/13/20	Mon 8/17/20	2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
42	Thu 8/13/20	Mon 8/17/20	2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
43	Tue 8/25/20	Fri 8/28/20	2.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
44	Tue 8/25/20	Thu 8/27/20	2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
45	Thu 8/27/20	Fri 8/28/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
46	Thu 8/6/20	Fri 8/28/20	16.05 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
47	Tue 8/25/20	Tue 8/25/20	0.25 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
48	Tue 8/25/20	Tue 8/25/20	0.2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
49	Mon 8/24/20	Tue 8/25/20	1 day	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
50	Thu 8/6/20	Fri 8/7/20	1 day	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
51	Fri 8/21/20	Mon 8/24/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
52	Thu 8/20/20	Thu 8/20/20	0.5 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
53	Thu 8/20/20	Fri 8/21/20	1 day	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
54	Mon 8/24/20	Mon 8/24/20	0.2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
55	Mon 8/24/20	Mon 8/24/20	0.2 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
56	Fri 8/28/20	Fri 8/28/20	0.25 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
57	Fri 8/28/20	Fri 8/28/20	0.25 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone
58	Fri 8/28/20	Fri 8/28/20	0 days	Summary	Project Summary	External Tasks	Division critica	Task	Split	Milestone



b) TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



T.O



23.95 DIAS

F.O.

**EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA PROPUESTO ES DE
23.95 DIAS SIENDO LA CANTIDAD DE DIAS INFERIOR A
LAS 7 SEMANAS ESTABLECIDAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS**





c) Garantia de los bienes y/o servicios cotizados



h.o.



N/A



M.A.



**d) CARNET DE CODIA DEL INGENIERO RESIDENTE
DE LA OBRA**



T.O.



**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



APELLIDOS: Ortiz Aquino **NOMBRES:** Fanelly Jose
PROFESION:
Ingeniero Civil

EXEQUATUR: **D/F:** 13/01/2016
CEDULA: 402-2075995-1
COLEGIATURA: 33769

Fanelly
Firma colegiado

[Signature]
Firma Presidente



T.O.



e) CERTIFICACIONES DE RECEPCIÓN CONFORME




T.O.



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**

Cerca de la Genie
RNC 425000339



**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE OBRAS**
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo Norte
22 de febrero 2019

**CERTIFICACIÓN
TERMINACIÓN DE PROYECTO**

la Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en su calidad de instancia normativa, certifica que el proyecto correspondiente. **PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL, EN LA CALLE GREGORIO LUPERÓN, SECTOR BENITO MONCIÓN, GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE. 1ERA ETAPA** Con el presupuesto No.1756 D/F 03/04/2017, por un monto de RDS 1,000,909.58 (Un millón novecientos nueve mil con 58/100).

A nombre de **LEVITEX, SRL. RNC. 131358365**, Fue recibido por esta Dirección el 16 de Noviembre 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo Norte ASDN. En consecuencia, certificamos y aceptamos como terminado el proyecto descrito.

Muy atentamente,


ING. VICTOR REYNOSO
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras



V.R.



Presidencia de la República Dominicana
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
"Año de la Innovación y la Competitividad"

13 de Agosto del 2019
Santo Domingo D. N.

A: QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar que el la empresa **Levitex SRL, RNC: 131358365** se desempeñó como contratista en el proyecto bajo el título: **Reconstrucción Play de Beisbol Los Ríos, Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco**. El monto total de dicho proyecto ascendió a los **RDS 14,572,172.00** millones de pesos. Hacemos constancia de que el mismo fue recibido conforme.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada.


Atentamente,

Ing. Domingo López
Eng. Ingeniería y Proyectos



H.d.





Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa -IDEICE-
"Año de la Innovación y la Competitividad"

DR-N0.02-2019
29 de enero, 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio, hacemos constar que la empresa Levitex, SRL realizó la remodelación del edificio que aloja las oficinas de nuestro Instituto en fecha del 22 de abril al 18 de agosto del año 2018, por un monto de RD\$2,784,248.41, el cual fue recibido conforme a la solicitud requerida y términos especificados en el contrato suscrito entre ambas partes para tales fines.

Dado en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintinueve días (29) del mes de enero del año 2019.

Atentamente,


Dr. Julio Leonardo Valeirón
Director Ejecutivo




T. O.



ideice



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE OBRAS**
"Año del Fomento a las Exportaciones"

06 de Julio del 2018
Santo Domingo Norte

CERTIFICACIÓN
TERMINACIÓN DE PROYECTO

la dirección general de supervisión y fiscalización de obras en su calidad de instancia normativa, certifica que el proyecto correspondiente, **PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN LA CALLE CONCEPCION BONA EL SECTOR COLINAS DEL MARAÑON, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.** con el presupuesto No.1755 D/F 03/04/2017 por un monto de RDS 1,000,909.58 (un millón novecientos nueve con 58/100).

A nombre del **LEVITEX, SRL. RNC. 131358365.** Fue recibido por esta Dirección en 06 de Julio 2018 como terminada, está ejecutado en todas sus partes cumpliendo con las normas de diseño, construcción y calidad requerida por el Ayuntamiento De Santo Domingo Norte ASDN. En consecuencia, certificamos y aceptamos como terminado el proyecto descrito.

Muy atentamente

ING. VICTOR REYNOSO
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras



T. O.



f) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (SNCC.D.049)

P.O.



SNCC.D.049



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana


CP-CPJ-002-2020

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 09-07-2020

Nombre del Oferente: **LEVITEX SRL**

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales RECONSTRUCCIÓN DE BALNARIO LAS MARIAS NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO	RD\$4,830,524.66	6 Meses	07/12/2020	10%	CEIZTUR	PRINCIPAL	Aún No
CONSTRUCCION DE CAMARA CUARTO FRIO EN EL ALMACEN UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	RD\$1,785,793.53	2 Meses	15/11/2019	95%	CONANI	PRINCIPAL	Aún No
READECUACIÓN PARQUE SANTO	RD\$ 1,200,000.00	12 MESES	25/10/2017	100%	ASDN	PRINCIPAL	SI



T.O.

DOMINGO NORTE												
CENTRO COMUNAL	RD\$ 1,000,909.58	12 MESES	25/10/2017	100%		ASDN	PRINCIPAL		SI			
REMODELACION OFICINA	RD\$2,500,000.00	12 MESES	01/03/2016	100%		IDEICE	PRINCIPAL		SI			
B) Internacionales												

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma *F. Melly Ortiz*
 Sello





g) EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO, CERT. DEL CODIA Y TITULOS DE GRADO Y POSTGRADO



SNCC.D.045



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



Página 1 de 1

CP-CPJ-002-2020

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

01 de Julio del 2020

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

LEVITEX SRL

3. Nombre del individuo:

Fannelly José Ortiz Aquino

4. Fecha de nacimiento: 31/03/1992 Nacionalidad: Dominicana

5. Educación:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) ,Maestría en Ingeniería de Estructuras

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),Ingeniería Civil (Cum Laude) 2013

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO, Bachiller en Ciencias y Letras

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

CODIA

7. Otras especialidades

Presto Básico, Instituto CONIN

/JR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Autocad Avanzado

Microsoft Project

Diplomado en Fidecomiso en el sector Inmobiliario en la Rep. Dom., ACOPROVI

Etabs Avanzado

Sap2000

Civil 3D



8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

1-República Dominicana



9. Idiomas

Español, Inglés (Avanzado) y Portugués (básico)

H.O.

10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (2016) a (Actual)	Santo Domingo	Levitex SRL	Director	Constructor, encargado de ejecución y de costos
De (2019) a (Actual)	Santo Domingo	Consortio T2RK	Ing. Encargado De Dirección Técnica	Encargado de ejecución de obra, Control de Obra y Calidad
De (2015) a (2017)	Santo Domingo	Crisfer inmobiliaria	Ing. De ejecución	Construcción de obras con

DISTRIBUCIÓN Original 1 – Expediente de Compras



			Control Presupuestario	formaleta de aluminio. Control de Presupuesto.
De (2015) a (2015)	Santo Domingo	Maritza Aquino	Ing. Residente	Residente en construcción de Escuela
De (2013) a (2015)	Santo Domingo	Francisco Aquino y Asoc.	Ing. Pasante	Asistente de Ing. Enc.de supervisión



T.O.

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p><i>Dirigir proyecto, Control de obras (Cronograma, Pagos) Supervisión de los Trabajos a realizar. Realización y pago de Nóminas Control de Calidad</i></p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: <u>___Crisfer XIV___</u> Año: <u>___2015___</u> Lugar: <u>___Santo Domingo Este___</u> Contratante: <u>___Crisfer Inmobiliaria___</u> Principales características del proyecto: Proyecto de Formaleta de 10 Niveles Actividades desempeñadas: <u>___Ing de Obras , Enc de Control de presupuesto y realización de Cubicaciones y Nómina</u></p>
---	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo



que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fannelly José Ortiz Aquino

Fecha: 09/07/2020
09/07/2020

Nombre completo del representante autorizado: CONSORCIO LEVITEX
SRL _____





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciaodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
FANNELLY JOSE ORTIZ AQUINO ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 40220759951 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 33769, Exequatur No. 4 , de fecha 08/04/2013
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 26 días
del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.


ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Famelly José Ortíz Aquino

EL DIPLOMA DE:


Ingeniero Civil

Cum Laude

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 8 de abril del 2013 F.O.


DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO


RECTOR (A)

REGISTRADO BAJO EL No. 23.921
LIBRO No. 8 FOLIO No. 75





V) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (LOTE 4):




F.O.



a) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

h.o.

H.O.

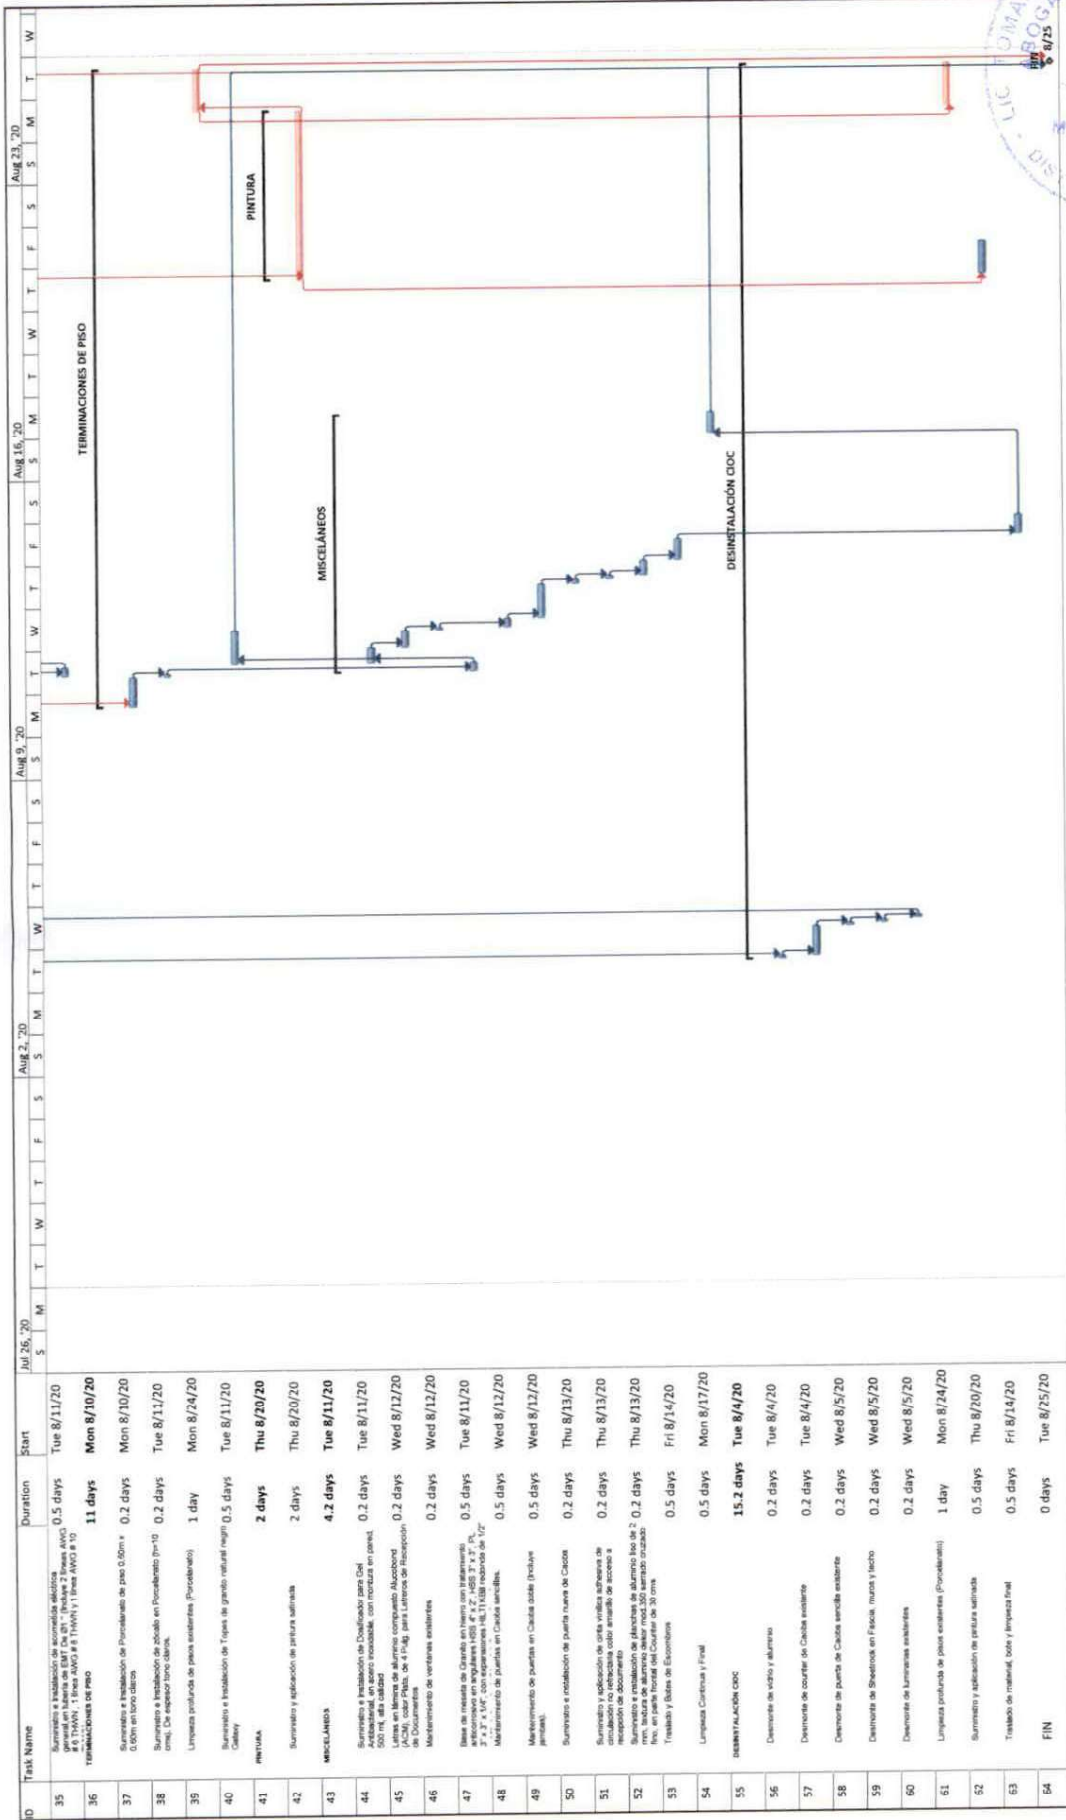

ID	Task Name	Duration	Start
35	Suministro e instalación de armadura eléctrica general en laberos de BAIT de 20" (Incluye 2 líneas AVVO 8/11/20) - Línea AVVO # 4 (THWV) - Línea AVVO # 5 (THWV) - Línea AVVO # 6 (THWV) - Línea AVVO # 7 (THWV)	0.5 days	Tue 8/11/20
36	Terminaciones de piso	11 days	Mon 8/10/20
37	Revisión e instalación de Perforados de piso 0.50m x 0.50m en todo el piso	0.2 days	Mon 8/10/20
38	Suministro e instalación de zocales en Perforados (P=10 cm), de acuerdo con planos	0.2 days	Tue 8/11/20
39	Limpieza profunda de pisos existentes (P=10cm)	1 day	Mon 8/24/20
40	Suministro e instalación de Tipos de grando natural negro 0.5 days	0.5 days	Tue 8/11/20
41	PINTURA	2 days	Thu 8/20/20
42	Suministro y aplicación de pintura satinada	2 days	Thu 8/20/20
43	MISCELÁNEOS	4.2 days	Tue 8/11/20
44	Revisión e instalación de Perforación para DDC Adicional, en acero inoxidable, con mortero en panel, 500 mm, alta calidad	0.2 days	Tue 8/11/20
45	Llaves en bronce aluminio compuesto Alucobond de Documentación de 1/4" - 1/2" para Unidades de Distribución	0.2 days	Wed 8/12/20
46	Montaje de ventanillas existentes	0.2 days	Wed 8/12/20
47	Bases de montaje de Grando en hierro con aislamiento 2" x 2" x 1/4" en ángulos en color negro, 1x1x1/4" con tornillos de 1/2"	0.5 days	Tue 8/11/20
48	Montaje de puertas en Chabas sencillas	0.5 days	Wed 8/12/20
49	Montaje de puertas en Chabas doble (Incluye jerritas)	0.5 days	Wed 8/12/20
50	Suministro e instalación de puerta nueva de Chabas	0.2 days	Thu 8/13/20
51	Suministro e instalación de cables (Incluye: suministro de materiales, mano de obra, transporte, recepción de documento)	0.2 days	Thu 8/13/20
52	Suministro e instalación de planchas de aluminio tipo de 2" x 2" x 1/4" en ángulos en color negro, 1x1x1/4" con tornillos de 1/2"	0.2 days	Thu 8/13/20
53	Trabajo y Bases de Escobillones	0.5 days	Fri 8/14/20
54	Limpieza Continua y Final	0.5 days	Mon 8/17/20
55	DESINSTALACIÓN DDC	15.2 days	Tue 8/4/20
56	Desmonte de varillas y alambres	0.2 days	Tue 8/4/20
57	Desmonte de coque de Chabas existente	0.2 days	Tue 8/4/20
58	Desmonte de puerta de Chabas sencilla existente	0.2 days	Wed 8/5/20
59	Desmonte de Sheetrock en Pisos, muros y techo	0.2 days	Wed 8/5/20
60	Desmonte de luminarias existentes	0.2 days	Wed 8/5/20
61	Limpieza profunda de pisos existentes (P=10cm)	1 day	Mon 8/24/20
62	Suministro y aplicación de pintura satinada	0.5 days	Thu 8/20/20
63	Trabajo de material, bates y limpieza final	0.5 days	Fri 8/14/20
64	FIN	0 days	Tue 8/25/20


Legend:

- Summary
- Project Summary
- External Tasks
- External Milestone
- Division critica
- Task
- Split
- Milestone
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- Deadline
- Critical
- Critical Split
- Progress
- Tareas criticas

Project: Project Villa Punta Arenas
 Date: Wed 7/8/20



b) TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



T.O.




20.9 DIAS



T.O.

**EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA PROPUESTO ES DE
20.9 DIAS SIENDO LA CANTIDAD DE DIAS INFERIOR A
LAS 7 SEMANAS ESTABLECIDAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS**



c) Garantia de los bienes y/o servicios cotizados

T.O.



N/A

h.o.





**d) CARNET DE CODIA DEL INGENIERO RESIDENTE
DE LA OBRA**

T.O.





Presidencia de la República Dominicana

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

"Año de la Innovación y la Competitividad"



13 de agosto del 2019

A: QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar que el Ing. Ángel Daniel Campusano Brito labora en el Departamento de Ingeniería de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial desde el **03 de octubre del 2017** como Ingeniero Supervisor; habiendo desempeñado estas funciones en el proyecto: **Construcción Play de Béisbol El Palmar, Distrito Municipal El Palmar, Provincia Bahoruco.**

La presente Certificación se expide a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,

Ing. Domingo López
Enc. Ingeniería y Proyectos



7.0





Presidencia de la República Dominicana

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

"Año de la Innovación y la Competitividad"



13 de agosto del 2019

A: QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar que el Ing. Ángel Daniel Campusano Brito labora en el Departamento de Ingeniería de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial desde el **03 de octubre del 2017** como Ingeniero Supervisor; habiendo desempeñado estas funciones en el proyecto: **Reconstrucción Play de Béisbol Los Ríos, Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco.**

La presente Certificación se expide a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,

Ing. Domingo López
Enc. Ingeniería y Proyectos



F.O.





FREDesign + Construction, S.R.L.
Donde el Diseño y la Construcción se Unen!



PARA LOS FINES QUE PUEDAN INTERESAR

CERTIFICO QUE: El Señor Ángel Daniel Campusano Brito , portador de la cédula de identidad electoral número: **224-0004621-9**, fue encargado de la **Construcción del proyecto Edificio Nápoles**, ubicado Calle no.13 Esq. Calle 09, Villa Aura, Santo Domingo Oeste, el cual fue desarrollado por **FREDesign + Construction, S.R.L** y cuyo monto final ascendió a **RDS\$20,400,000.00**. Este proyecto se llevó a cabo entre **Enero 2016 hasta Agosto 2017**.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en el Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana a los 13 días del mes de Agosto del 2019.


FREDesign + Construction, S.R.L.
Donde el Diseño y la Construcción se Unen!
Engel Merán
Gerente
Ing. Engel Merán Sánchez
Gerente Administrativo

F.O.



[Handwritten signature]



Ministerio de Turismo

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC-401-03681-9



26 de junio, 2019

A Quien Pueda Interesar

Por medio de la presente, hacemos constar que el proveedor **Ángel Daniel Campusano Brito**, cédula de identidad No. 224-0004621-9, realizó los trabajos de instalación de puertas y paños fijos en cristal, así como también, la remodelación y adecuación de oficinas del MITUR, en el año 2017. Los trabajos fueron certificados como buenos y satisfactorios.

Dado en Santo Domingo, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



T. O.





e) CERTIFICACIONES DE RECEPCIÓN CONFORME

H.O.


COLEGIO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCIA)

APELLIDOS: Campusano Brito **NOMBRE:** Angel Daniel

PROFESION: Ingeniero Civil

EXEQUATUR: 531 **D/F:** 31/08/2011

CEDULA: 224-0004621-9

COLEGIATURA: 25970


 Firma colegiado


 Firma Presidente



F.O.



f) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (SNCC.D.049)



f.o.

SNCC.D.049



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

CP-CPJ-002-2020

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 09-07-2020

Nombre del Oferente: **LEVITEX SRL**



Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
RECONSTRUCCIÓN DE BALNARIO LAS MARIAS NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO	RD\$4,830,524.66	6 Meses	07/12/2020	10%	CEIZTUR	PRINCIPAL	Aún No
CONSTRUCCION DE CAMARA CUARTO FRIO EN EL ALMACEN UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	RD\$1,785,793.53	2 Meses	15/1/2019	95%	CONANI	PRINCIPAL	Aún No
READECUACIÓN PARQUE SANTO	RD\$ 1,200,000.00	12 MESES	25/10/2017	100%	ASDN	PRINCIPAL	SI



T. J.

DOMINGO NORTE										
CENTRO COMUNAL	RD\$ 1,000,909.58	12 MESES	25/10/2017	100%		ASDN		PRINCIPAL		SI
REMODELACION OFICINA	RD\$2,500,000.00	12 MESES	01/03/2016	100%		IDEICE		PRINCIPAL		SI
B) Internacionales										

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma
Sello

Franco Cortez





g) EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO, CERT. DEL CODIA Y TITULOS DE GRADO Y POSTGRADO



SNCC.D.045



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

LEVITEX SRL

3. Nombre del individuo:

Ángel Daniel Campusano Brito

4. Fecha de nacimiento: 28/05/1984 **Nacionalidad:** Dominicano

5. Educación:

ESTUDIOS BÁSICOS-MEDIOS O TÉCNICOS	
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	
Profesión	Ingeniero Civil
Universidad	Universidad Dominicana O & M
Año egreso	2004
Año titulación	2010
OTROS ESTUDIOS y/o ESPECIALIZACIONES	
Profesión	Técnico en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Universidad	INFOTEP
Año egreso	2014
Año titulación	2015



M.O.



6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

7. Países donde tiene experiencia de trabajo en los últimos diez (10) años:

República Dominicana

8. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

Idioma	Grado de competencia para		
	Hablar	Leer	Escribir
Español	1	1	1
Inglés	2	2	2

Grado de competencia:

1. Bueno
2. Regular
3. Pobre



9. Historia Laboral

EXPERIENCIA PROFESIONAL							
Fechas (desde-hasta)	Empresa	Función o Área de Trabajo	Cargo desempeñado (breve descripción)	1	2	3	4
				*	*	*	*
2017-fecha actual	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP)	Supervisor de obra	- Supervisión y control de la ejecución de la obra. - Fiscalizador - Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra. - Llevar y Actualizar la Planificación de las ejecuciones. - Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos			X	

H.O.

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras




- Realizar presupuesto y cubriciones.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fechas (desde-hasta)	Empresa	Función o Área de Trabajo	Cargo desempeñado (breve descripción)	1	2	3	4
				*	*	*	*
2015-2017	FREDesing Construction S.R.L	Supervisor de obra	-Realizar levantamientos planialtimetricos -Realizar replanteos -Llevar el control de los movimientos de tierra				X
2014-2015	Hormicondo, Moll Constructora- Acentro Circunvalación Tramo II, Sto. Dgo.	Ingeniero Residente y Enc. De Seguridad y Salud Ocupacional	- Higiene y Seguridad Laboral -Velar por el uso correcto de los equipos de seguridad al personal. - Velar por la adecuación del área a fin de tener un ambiente seguro de trabajo. - Logística: Manejo y control de herramientas, materiales y equipos de trabajos y uso adecuado de equipos de protección. Otras actividades/funciones son: -Supervisión de colocación de Asfalto. -Experiencia en construcción de Pilotes, en la Inca y barrenado. -Estabilización en suelo, cal y cemento -Colocación de alcantarilla tubular y cajón. -Experiencia en Obra gris. -Elaboración de Puentes: Puentes Antonio Guzmán y Puente de Yaguaza				X



M.O.

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





			- Control y supervisión de movimiento de tierra y Cubicaciones.
--	--	--	---

EXPERIENCIA PROFESIONAL							
Fechas (desde-hasta)	Empresa	Función o Área de Trabajo	Cargo desempeñado (breve descripción)	1	2	3	4
				*	*	*	*
2011-2013	Grupo Rosado-Acento Barrick Gold.	Supervisor de obra	- Higiene y Seguridad Laboral -Velar por el uso correcto de los equipos de seguridad al personal. - Velar por la adecuación del área a fin de tener un ambiente seguro de trabajo. - Logística: Manejo y control de herramientas, materiales y equipos de trabajos y uso adecuado de equipos de protección. Otras actividades/funciones son: -Supervisión de colocación de Asfalto. -Experiencia en construcción de Pilotes, en la Inca y barrenado. -Estabilización en suelo, cal y cemento -Colocación de alcantarilla tubular y cajón. -Experiencia en Obra gris. -Elaboración de Puentes: Puentes Antonio Guzmán y Puente de Yaguaza - Control y supervisión de movimiento de tierra y Cubicaciones.		X		

T.O.





EXPERIENCIA PROFESIONAL							
Fechas (desde-hasta)	Empresa	Función o Área de Trabajo	Cargo desempeñado (breve descripción)	1 *	2 *	3 *	4 *
2012-2013	Grupo Rosado	Supervisor de obra	-Dirigir y fiscalizar el trabajo de movimiento de tierra, velar por el buen uso de los equipos y maquinarias pesadas, -Control de personal, creación de cronograma de trabajo, manejo de presupuesto Creación de calendario de trabajos a realizar, entre otros			X	

* Marcar con una X si la experiencia presentada corresponde a una o más de las características evaluables:

1. Proyecto de Software de similares características.
2. Proyecto en empresas medianas a grandes (pública o privada)
3. Proyecto en Instituciones gubernamentales.
4. Proyecto en Instituciones del Sector Justicia

10. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Firma Angel Daniel

Fecha: 09/07/2020

Nombre completo del representante autorizado: Fanny Ortiz





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 56
 CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 E-mail: presidenciacodia@centra1@gmail.com • www.codia.org.do
 RNC: 401-099412

Tel: 829 378-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ANGEL DANIEL CAMPUSANO BRITO ***** portador(a) de la
 Cédula de Identidad Electoral No. 22400046219, es miembro del Colegio
 Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
 la Colegiatura No. 25970, Exequatur No. 531, de fecha 30/07/2011
 de profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 19 días
 del mes de Junio del año 2020

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
 Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
 Presidente CODIA





UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M

Fundada el 12 de Enero, 1966

EL CONSEJO DOCENTE

En uso de sus atribuciones legales ha dispuesto:

Por Cuarto:

Angel Daniel Campusano Brito

ha cumplido con los requisitos y con las disposiciones que reglamentan los estudios de grado universitario en este centro de enseñanza superior; Por tanto en reconocimiento público de sus aptitudes le concede el Título de:

Ingeniero Civil

Y para que haya constancia y sea de permanente notoriedad lo espide el presente Diploma que ha sido firmado, sellado y registrado en la Sede Principal de esta casa de altos estudios, en Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana.

El día 30 del mes de Julio del año 2010


El Decano


Director de Registro


El Rector

Registrado con el N.º 239704 Folio 192 del Libro de Grados y Títulos N.º 4



P.O.
