

Dra. Alejandra

DOCUMENTACION TECNICA



Dra. Hejba

C-CRONOGRAMA




Dra. Alejandra

LOTE 1



Dra. Alejandra

Id	Nombre de tarea	Duraci/Comienzo
1	CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORIS	52 lun 27/07/20 días?
2	PRELIMINARES	7 días lun 27/07/20
3	MUROS	5 días lun 03/08/20
4	TERMINACIÓN DE TECHOS	7 días sáb 08/08/20
5	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	20 días sáb 15/08/20
6	EQUIPOS MECANICOS	30 días lun 03/08/20
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	50 días lun 27/07/20
8	TERMINACIONES DE PISO	21 días lun 03/08/20
9	PINTURA	15 días lun 24/08/20
10	MISCELANEOS	15 días mié 02/09/20
11	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	51 días lun 27/07/20
12	ENTREGA DEL PROYECTO	1 día: mié 16/09/20

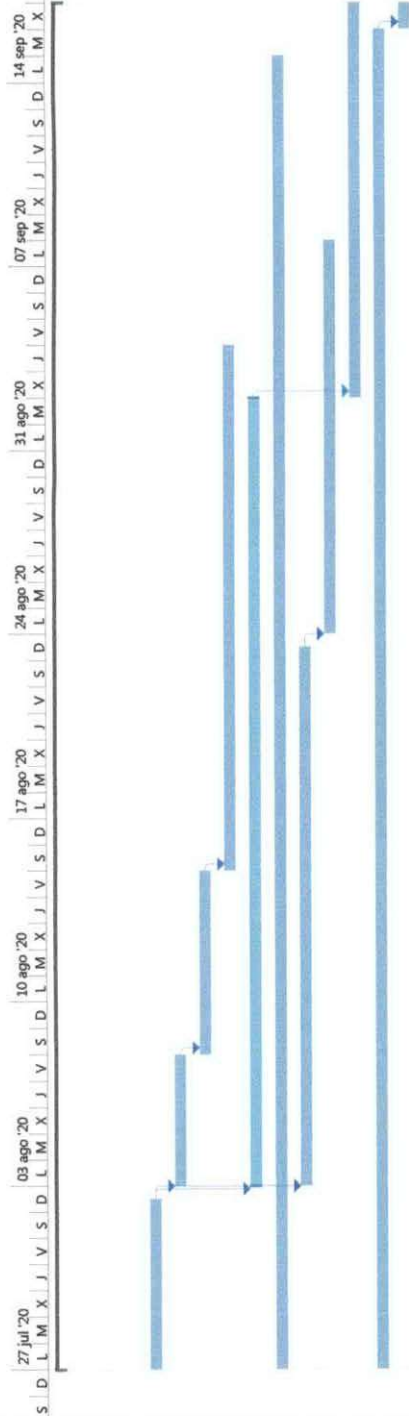

Walter



Tarea	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Resumen manual	Fecha límite
Hito	solo el comienzo	Progreso
Resumen	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	Tareas externas	

Proyecto: CRONOGRAMA, BARAH
Fecha: lun 29/06/20

Dra. Alejandra

LOTE 2



Dra. Hejba

CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, RECEPCION DE DOCUMENTOS HIGUEY

Id	Nombre de tarea	Duraci:Comienzo	Fin
1	CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY	60 lun 27/07/20 dias?	jue 24/09/20
2	PRELIMINARES	7 dias lun 27/07/20	dom 02/08/20
3	MUROS	5 dias lun 03/08/20	vie 07/08/20
4	TERMINACION DE TECHOS	7 dias sáb 08/08/20	vie 14/08/20
5	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	20 dias sáb 15/08/20	jue 03/09/20
6	EQUIPOS MECANICOS	25 dias lun 03/08/20	jue 27/08/20
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	50 dias lun 27/07/20	dom 23/08/20
8	TERMINACIONES DE PISO	21 dias lun 03/08/20	dom 23/08/20
9	PINTURA	15 dias lun 24/08/20	dom 07/09/20
10	MISCLANEO	15 dias vie 04/09/20	vie 18/09/20
11	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	59 dias lun 27/07/20	mié 23/09/20
12	ENTREGA DEL PROYECTO	1 dia: jue 24/09/20	jue 24/09/20



WAFR



Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha limite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Proyecto: CRONOGRAMA, BARAH
Fecha: lun 29/06/20


Dra. Leyba

LOTE 3



Dra. Areiba

CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, RECEPCION DE DOCUMENTOS DE SANTO DOMINGO ESTE

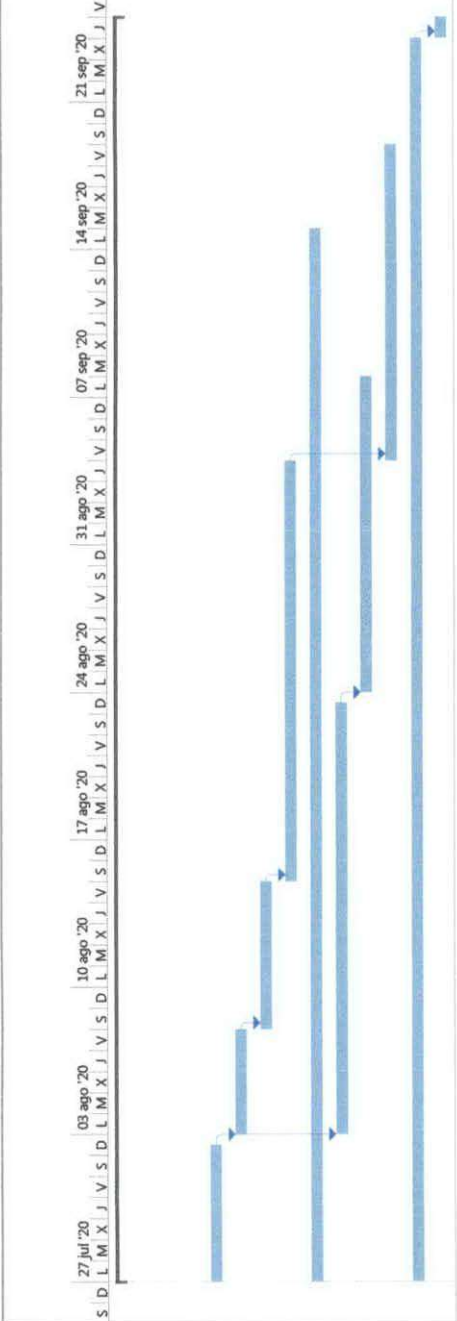

Id	Nombre de tarea	Duraci/Comienzo	Fin
1	CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE	60 lun 27/07/20 dias?	jue 24/09/20
2	PRELIMINARES	7 dias lun 27/07/20	dom 02/08/20
3	MUROS	5 dias lun 03/08/20	vie 07/08/20
4	TERMINACION DE TECHOS	7 dias sáb 08/08/20	vie 14/08/20
5	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	20 dí: sáb 15/08/20	jue 03/09/20
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	50 dí: lun 27/07/20	lun 14/09/20
7	TERMINACIONES DE PISO	21 dí: lun 03/08/20	dom 23/08/20
8	PINTURA	15 dí: lun 24/08/20	lun 07/09/20
9	MISCELANEOS	15 dí: vie 04/09/20	vie 18/09/20
10	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	59 dí: lun 27/07/20	mié 23/09/20
11	ENTREGA DEL PROYECTO	1 día: jue 24/09/20	jue 24/09/20



WHT



Tarea	Tarea inactiva	Hito externo	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Fecha límite	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	Progreso	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	Progreso manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Tareas externas	

Proyecto: CRONOGRAMA, BARAH
Fecha: lun 29/06/20

Dra. Hejba

LOTE 4



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO OESTE	52 días	lun 27/07/20
2	PRELIMINARES	7 días	lun 27/07/20
3	MUROS	5 días	lun 03/08/20
4	TERMINACIÓN DE TECHOS	7 días	sáb 08/08/20
5	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	20 días	sáb 15/08/20
6	EQUIPOS MECANICOS	30 días	lun 03/08/20
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	50 días	lun 27/07/20
8	TERMINACIONES DE PISO	21 días	lun 03/08/20
9	PINTURA	15 días	lun 24/08/20
10	MISCLANEO	15 días	mié 02/09/20
11	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	51 días	lun 27/07/20
12	ENTREGA DEL PROYECTO	1 día	mié 16/09/20



Walter M.



Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha limite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Proyecto: CRONOGRAMA, BARAH
Fecha: lun 29/06/20

Dra. Altigracia

Dra. Adijba

TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA



Dra. Alejandra

Lote 1: 7 Semanas

Lote 2: 8 Semanas

Lote 3: 8 Semanas

Lote 4: 7 Semanas



Dra. Mejía

GARANTIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS



COMMISSION DE LOS RECURSOS
HUMANOS

Dra. Arriba

**GARANTIA EN
ACONDICIONADORES DE
AIRES: 5 años en el compresor y
2 Años de Garantía en Piezas y
Servicios.**



Dra. Hejba

**TRES (03) CARTAS DE
RECOMENDACIÓN O
CERTIFICACION DE
RECEPCION CONFORME DE
OBRAS SIMILARES**



OBRAS SIMILARES
RECEPCION CONFORME DE
CERTIFICACION DE
RECOMENDACION O
TRES (03) CARTAS DE



GRUPO CONAR S.R.L.

Ave. República de Colombia 800,
Altos de Arroyo Hondo III. Res. Paola María X, Apart. D3, Santo Domingo,
Republica Dominicana. Telf.809.535.2745 Cel.829.923.9444
fidelmedina02@gmail.com
RNC 1-31-5132-5

Dra. Leyba

**15 de junio del 2019
Santo Domingo, D. N.**

A QUIEN PUEDA INTERSAR

Por esta vía le extendemos un saludo afectuoso y hacemos constar que, la Compañía **CONSTRUCTORA TUBIA, SRL., RNC 1-31-30867-8**, ha realizado diferentes trabajos en nuestra Empresa.

Entre ellos podemos citar la construcción de remodelaciones, que comprende, colocación de fachada, colocación de pisos, instalaciones eléctricas en general, instalaciones sanitarias, agua potable, colocación de plafones, colocaciones de puertas y ventanas, colocación de sheetrock, pintura en general, colocación de aires, y jardinería, entre otros.

Dichos trabajos fueron iniciados en el mes de abril del 2018 y finalizaron en el mes de junio del 2018, los cuales ascendieron a un monto de Dos Millones Cientos Veintitres Mil Pesos Dominicanos con 00/100, **(RD\$3, 523,000.00)**

Este documento se expide a solicitud de la parte interesada, a los 15 días del mes de junio del año 2019, para los fines de lugar.

Sin otro particular, se despide,


**GRUPO
CONAR**
Arq. Fidel Medina
Gerente General





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Dra. Arjiba

DI277-18

7 de noviembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

A través de la presente hacemos constar que la empresa CONSTRUCTORA TUBIA SRL, ha sido proveedor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en los últimos dos (2) años, ejecutando una totalidad de un (1) Proyecto de Obra Mayor y dos (2) Proyectos de Obra Menor, cumpliendo de manera satisfactoria en todos los servicios contratados.


Esta comunicación se expide a solicitud de la parte interesada, a los siete (7) días del mes de noviembre del año 2018.

Atentamente,





Ing. Rafael Pujals
Enc. Departamento de Ingeniería



Ing. Elizabeth González
Enc. Secc. Proy. Infraestructura Física

EA/RP/EG



Dra. Mejba

Puertas
Ventanas
Diseño
Plafones
Sheetrock
Herrería
Construcción
Remodelaciones
Toldos

29 de junio del 2019
Santo Domingo, D.N.

-A QUIEN PUEDA INTERESAR-

Por medio de la presente hacemos constar que, la empresa **CONSTRUCTORA TUBIA, SRL., RNC 1-31-30867-8**, ha realizado diferentes trabajos en nuestra compañía.

Estos trabajos corresponden a la construcción de dos niveles de oficinas, los cuales comprenden movimiento de tierra, colocación de pisos, instalaciones eléctricas en general, instalaciones sanitarias, trabajos de sheetrock, colocación de puertas y ventanas, pintura, climatización, embellecimiento interior, entre otros.

Dichos trabajos fueron iniciados en el mes de marzo del 2017 y finalizaron en el mes de junio del 2018, los cuales ascendieron a un monto de dieciséis millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD\$16,000,000.00)

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los 29 días del mes de junio del año 2019.

Sin más por el momento, se despide muy atentamente


Ing. Yandy Concepción Sánchez
Gerente



Dra. Alejandra

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA





RNC: 1-31-30867-8
Av. Los Cerros, Edif. Condeco I, Apto. B-2,
Res. Los Cerros Del Norte, Km. 18, Aut. Duarte.
Tels. 809-779-5976, 829-820-1131
Correo : constructoratubia@gmail.com

Dra. Hejta

Perfil de la Compañía:

Somos principalmente una empresa constructora que se dedica a brindar y crear soluciones contemporáneas para el desarrollo de proyectos de Ingeniería, en las áreas de construcción de obras civiles, diseño e infraestructura en edificaciones, Mantenimiento Vial, Telecomunicaciones (Planta Externa), entre otros.

Servicios:

Pintura en General	Redes GPON, Planta Externa
Supervisión	Movimiento de Tierra
Tramitación de Planos	Diseños Arquitectónicos
Pavimentación	Impermeabilizantes
Mantenimientos en general	
Remodelación de Exteriores e Interiores	
Construcción Ligera en general	





Dra. Mejía

Áreas de Experiencia:

- **Consejo del Poder Judicial**
Mantenimiento General del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, Trabajos en sheetrock, Construcción de Portón de Metal, Readecuación Escalera Metálica, Pintura, Mantenimiento Puertas de Caoba, Corrección de filtración, Instalación de Aparatos Sanitarios, Colocación de puertas en Aluminio y Cristal etc., Año 2019
- **Consejo del Poder Judicial**
Adecuación del Comedor del Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, Colocación Pisos en Vinyl, Pintura, Colocación de puerta en cristal, Mantenimiento de Ventanas en celosías, etc., Año 2020
- **Consejo del Poder Judicial**
Impermeabilización de Techo del Tribunal de Trabajo de San Cristóbal, Año 2020
- **Procuraduría General De La República Dominicana**
Instalación de Ventanas para ser utilizados en la reubicación del Plan de Proyecto de Humanización Penitenciaria, Año 2019





Dra. Meyba

- **Jurisdicción Inmobiliaria**

Readecuación de la Recepción del Tribunal de Trabajo de San Cristóbal, Pintura, Muros de Sheetrock, Pintura puertas de caoba, Confección de Jamba de caoba, etc.
Año 2020

- **Consejo del Poder Judicial**

Reubicación de Dirección de Control Financiero, Inspectoría General, Contraloría y Auditoria, Trabajos en sheetrock, Construcción de bóveda, Pintura, Mantenimiento Puertas de Caoba, Alimentadores Ramales para Data y Electricidad, Colocación de Sheetrock, Colocación de tope de mármol, Colocación de piso de mármol, Colocación de fachadas en Aluminio y Cristal etc., Año 2019



- **Consejo del Poder Judicial**

Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Data, Trabajos en Sheetrock, Plafones, (comerciales, en vinyl yeso, en sheetrock), Reparación piso de mármol, Trabajos de Drenaje pluvial, Impermeabilización, entre otros, Año 2019

- **Dirección General De Impuestos Internos, (DGII)**

Laminados, Nivelación Portón de Hierro, Impermeabilizante, Readecuaciones de oficinas, cubículos y divisiones en Cristal, aluminio y perfiles acero inoxidable, Fachada sede central en Alucobond, Remodelación Local San Cristóbal, (Cambio de Fachada,



Dra. Alejandra

- Reestructuración de oficinas en sheetrock, colocación de plafón, entre otros), Construcción de rampa en estructura metálica, Escalera metálica, Toldo, cambio escalones marmól, entre otros, Año 2019
- **Smurfit Kappa, República Dominicana**
Mantenimiento dentro de Industria en todas las áreas, (Estructuras Metálicas en general, Plomería en General, Electricidad, Fabricación de accesorios metálicos, Pintura, entre otros, Año 2019
- **Iglesia Asamblea de Dios Central**
Impermeabilización de techo, Año 2019
- **Dirección General De Impuestos Internos, (DGII),**
Construcción del Nueva Administración para servicios, Nagua, Año 2018
- **Dirección General De Impuestos Internos, (DGII),**
Impermeabilización y Construcción Estructura metálica, Sede Central. Año 2018
- **Dirección General De Impuestos Internos, (DGII),**
Mantenimiento de Lona Asfáltica, administración, La feria. Año 2018
- **JV PROYECTOS, Autopistas del Nordeste, Solución**
Drenaje Pluvial, Año 2018
- **JV PROYECTOS, Autopistas del Nordeste,**
Mantenimiento Vial Rutinario, Desde Año 2016 hasta la fecha.





Dra. Méjtra

- **Supermercados Bravo**, Contratista, 2018
- Impermeabilizante de techo, **Hotel Marriot Court Yard**, 2017 y 2018
- Contratista, **Smurfit Kappa**, Desde año 2017 hasta la fecha.
- Impermeabilización de Cisterna **Hotel Embajador**, 2016
- Construcción de Bases en hormigón armado para instalación de transformadores en parques de paneles solares, AES Andrés Boca Chica y AES Haina, **Métricas, SRL**, Noviembre 2016
- Contratista **Soluciones Para La Construcción, SPC, SRL**. 2016
- Estaciones Hidrométricas: Construcciones nuevas, Rehabilitaciones existentes, Canalización Sensor de presión, Bloques Milimétricos, (En los ríos), Torre Mástil, Instrumentos y equipos, realizadas en diferentes localidades del país, **SSS GROUP**, Año 2014 y Año 2015
- Construcción de Módulo-Bar, Cava (Sanitaria), **Hotel Embajador**, Santo Domingo, Año 2013
- Instalación de Antena y Construcción Base Loma, El Mogote, **MAGICORP**, Año 2012
- Construcción Caseta Repetidor y verja Perimetral, Loma El Mogote, **MAGICORP**, Año 2011





Dra. Alejandra

- Construcción Caseta Repetidor, Santo Cerro y verja Perimetral, La Vega, **MAGICORP**, Año 2011
- Colocación de Alcantarillas para drenaje pluvial y sanitario, **Sumar Electric**, desde año 2005 hasta 2006
- Movimiento de Tierra
Inmobiliaria Susana Ovalle, año 2006 hasta año 2007
- Construcción de alcantarillado, Vía principal Carretera La Isabela, varios tramos, año 2007; Acondicionamiento de calles (Relleno, Nivelación, Compactación, Pavimentación, Construcción de Aceras, Contenes, Badenes y Muros de Piedras, entre otros, **Junta Municipal de Pantoja**.
- Proyecto Habitacional **Inmobiliaria Susana Ovalle: Residencial Don Teo II**, 44 apartamentos, año 2007
- Construcción Destacamento Pantoja,
Junta municipal de Pantoja, año 2009
- Construcción de Nave Industrial y Edificio Corporativo, **Prisma Lux, SRL**. (3,500.00 M2) y Pavimentación en Hormigón Hidráulico de 6,500.00 m2, Año 2010
- Remodelación Baños, **RICOH DOMINICANA**, (Año 2013)
- **Iglesia Asamblea De Dios Central**, Remodelación Baños y Oficina, (Año 2014).
- Remodelación Oficinas, **Soluciones Díaz**, (Año 2015)





- Impermeabilización de techo y Plafond Oficinas, **Metalúrgica Gusmar**, (Año 2015).
- **Comunicaciones JP, SRL.**
Proyecto Gpon, (Planta Externa), (2013-2015) Los Ríos, Las Praderas, Los Prados, Renacimiento, Manganagua, Atala, Piantini, Alma Rosa I, entre otros.

Dra. Almeyra

Recursos Humanos:

Directivos (02): Encargados de Gestionar Negocios y Contrataciones.

Ingenieros (02): Encargados de Ejecución de Proyectos.

Arquitectos (01): Encargados de Diseño.

Contador (01): Encargado de Finanzas.

Abogado (01): Encargado Departamento Legal.

Psicóloga (01): Encargada Recursos Humanos

Agrimensor (01): Encargado Departamento de Agrimensura.

Técnicos (20): Trabajo de piso y construcción.



¡¡GARANTIA Y CALIDAD, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD!!

Dra. Alejandra

PERSONAL PROPUESTO POR CADA LOTE



Dra. Arriba

INGENIERO RESIDENTE

LOTE 1



Dra. Alejandra

- *CARNET DEL CODIA
- * TITULO UNIVERSITARIO
- *CERTIFICACION CODIA



*CIRCOLAZIONE CODICE
*ALTO DI PAROLA
*CIVILE DEL CODICE



**COLEGIO DE ABOGADOS
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



APELLIDOS:
Alejo Mercedes

NOMBRE:
María Victoria

PROFESION:
Ing. Civil

EXEQUATUR: 575

D/F: 04/09/2009

CEDULA: 001-1409449-3

COLEGIATURA: 23944

Firma del Colegiado

Firma Presidente

Dra. Alejandra



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Fundada el 28 de octubre de 1538



El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por tanto:

Maria Victoria Alegria Moredas
 CION SUPERIOR
 DGO

ha cursado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado en las exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Ingeniería Civil

El para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2007

Lic. Roberto Reyna Siqueira
 Rector



Ing. Domingo Abinno Domancy
 Decano de la Facultad

Lic. Guzman Jara
 Secretario General de la Universidad
 Registrado bajo el N.º 56537
 del libro de firmas y firmas

Doña Araya

Dra. Alejandra

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel y conforme al título original de **INGENIERO CIVIL**, expedido a nombre de **MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES**, bajo el Número **156530**, Folio No. **4439** y que las firmas que aparecen al pie del mismo corresponden a funcionarios competentes.

Oscar Rosario

ING. OSCAR ROSARIO
Director de Registro.-

Ciudad Universitaria, R.D.
08 de Febrero de 2008.-

Recibo No. 0174286
Valor \$150.00
Fecha 23/01/08
AH-5976
0898-08
OR/jh



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGIA
(SEESCYT)
TÍTULO VERIFICADO
POR *[Signature]* FECHA *03/06/2008*
DIVISION DE LEGALIZACION Y CERTIFICACION

1046878
REVISADO 03 JUN 2008 *[Signature]*



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

Dra. Alejandra

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00114094493 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 23944, Exequatur No. 675 , de fecha 28/10/2007
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días
del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



Dra. Mejía

INGENIERO RESIDENTE

LOTE 2



Dra. Arijba

- *CARNET DEL CODIA
- * TITULO UNIVERSITARIO
- *CERTIFICACION CODIA





Dr. H. H. H.

**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



[Signature]
Firma colegiado

APELLIDOS:

García Hilito

NOMBRE:

Yanira

PROFESION:

INGENIERO CIVIL

EXEQUATUR 173

CEDULA: 001-1285777-5

COLEGIATURA 30310

D/F: 16/05/2014

[Signature]
Firma Presidente

Universidad Autónoma de Santo Domingo
 República de América



El Consejo Universitario, en virtud de los disposiciones legales vigentes: Ha resuelto:

Manuela García Millán

ha enseñado en la Facultad de

Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingenieros Civiles

de esta Universidad, los cursos requeridos y ha sido aprobada


en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha resuelto en obsequio y de acuerdo al título de

Ingeniero Civil

Y para que sea notorio y constante le expone el presente Diploma
 firmado y sellado en Santo Domingo, Puerto Rico, a los 25 de febrero de 1955

Manuela García Millán
 Recibida



Manuela García Millán
 Decano de la Facultad

Manuela García Millán
 Recibida



Dña. Arce



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
YANIRA GARCIA HILTON ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 00113857775 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 30310, Exequatur No. 173 , de fecha 25/05/2013
de profesión INGENIERO CIVIL .



Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los **27 días**
del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



Dra. Aljiba

INGENIERO RESIDENTE

LOTE 3



Dra. Arceyba

CARNET DEL CODIA




Dra. Mejía

- *CARNET DEL CODIA
- * TITULO UNIVERSITARIO
- *CERTIFICACION CODIA



COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS,
Y AGRICULTORES (CEDIA)



APELLIDOS: Minaya Polanco **NOMBRE:** Jairo Josué
PROFESION: Ing. Civil
EXEQUATUR: 128 **D/F:** 14/02/2009
CEDULA: 001-1397264-0
COLEGIATURA: 23285

Firma del Colegiado Firma Presidente

Dra. Aréyba



Dra. Hejba

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel y conforme al título original de INGENIERO CIVIL, expedido a nombre de JAIRO JOSUE MINAYA POLANCO, bajo el Número 148913 Folio No. 4208 y que las firmas que aparecen al pie del mismo corresponden a funcionarios competentes.



ING. OSCAR ROSARIO
Director de Registro.-

Ciudad Universitaria, R.D.
11 de Enero de 2007.-

Recibo No. 316086
Valor \$150.00
Fecha 07/11/06
AE-1993
0019-07
OR/jh.



REVISADO 09 NOV 2007



559430



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

Dra. Arriba

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.don
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, **que el señor(a)**
JAIRO JOSUE MINAYA POLANCO ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00113972640 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 23285, Exequatur No. 128 , de fecha 28/10/2006
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

Reference is made to the report of Special Agent in Charge [Name] dated [Date] at [Location] regarding [Subject]. The report indicates that [Subject] is a [Description] who has been active in [Activity]. It is noted that [Subject] has been identified as a [Role] in the [Organization]. The information provided in the report is consistent with the intelligence gathered from other sources.

It is recommended that [Action] be taken regarding [Subject] to [Reason].

The information in this report is classified as [Classification] and is to be controlled accordingly.

Very truly yours,
Special Agent in Charge

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



Dra. Alejandra

INGENIERO RESIDENTE

LOTE 4



Dra. Arrieta

- *CARNET DEL CODIA
- * TITULO UNIVERSITARIO
- *CERTIFICACION CODIA



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



Dr. Ruyba

de los mensajes de inversión, en virtud de las disposiciones legales vigentes: En cuanto

Procurador Reyes Suro

ha cursado en la Facultad de

Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil

de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado

en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Ingeniero Civil

El para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, hoy día 25 de febrero de 2013

Marta Arguero Escobier
Rectora

Ing. José Joaquín Reyes Suro
Decano de la Facultad



Registrado bajo el no. 190729
del libro de papeles y libros
Sistema General de la Universidad

Dra. Arriba

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ROSANNA REYES SUAZO ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 00112930920 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 32953, Exequatur No. 239 , de fecha 25/02/2013
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 29 días
del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

